



УДК 621.012.35(083.96)

**МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ПОД УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ
ДЛИНОЙ 33—42 м ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ
МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ**

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на основе методов научной организации труда и предназначена для использования при составлении проектов производства работ и организации труда на объекте.

Карта составлена на сооружение промежуточных опор из сборного железобетона и бегона высотой 13 м от обреза фундамента до подферменной площадки.

В карте предусмотрено сооружение опор под унифицированные пролетные строения длиной 33—42 м с габаритными размерами Г-9+1×2 по типовому проекту № 3503-2 Союздорпроекта (инв. № 443/1).

Опоры имеют нижнюю массивную часть, состоящую из железобетонных коробчатых (контурных) блоков Т-3, внутреннюю полость которых заполняют массивными беговыми блоками З-2 или бутобетонной смесью (рис. 1).

На контурные блоки массивной части опоры устанавливают прокладник, состоящий из двух блоков ПС 2 сплошного сечения.

В верхней части (выше уровня ледохода) опоры имеют два столба С-3 из железобетонных оболочек диаметром 1 м.

На столбы устанавливают блоки капителей К-2. Капители со столбами соединяют путем сварки накладок и закладных частей. Для омоноличивания в гнезда капителей и в верхнюю

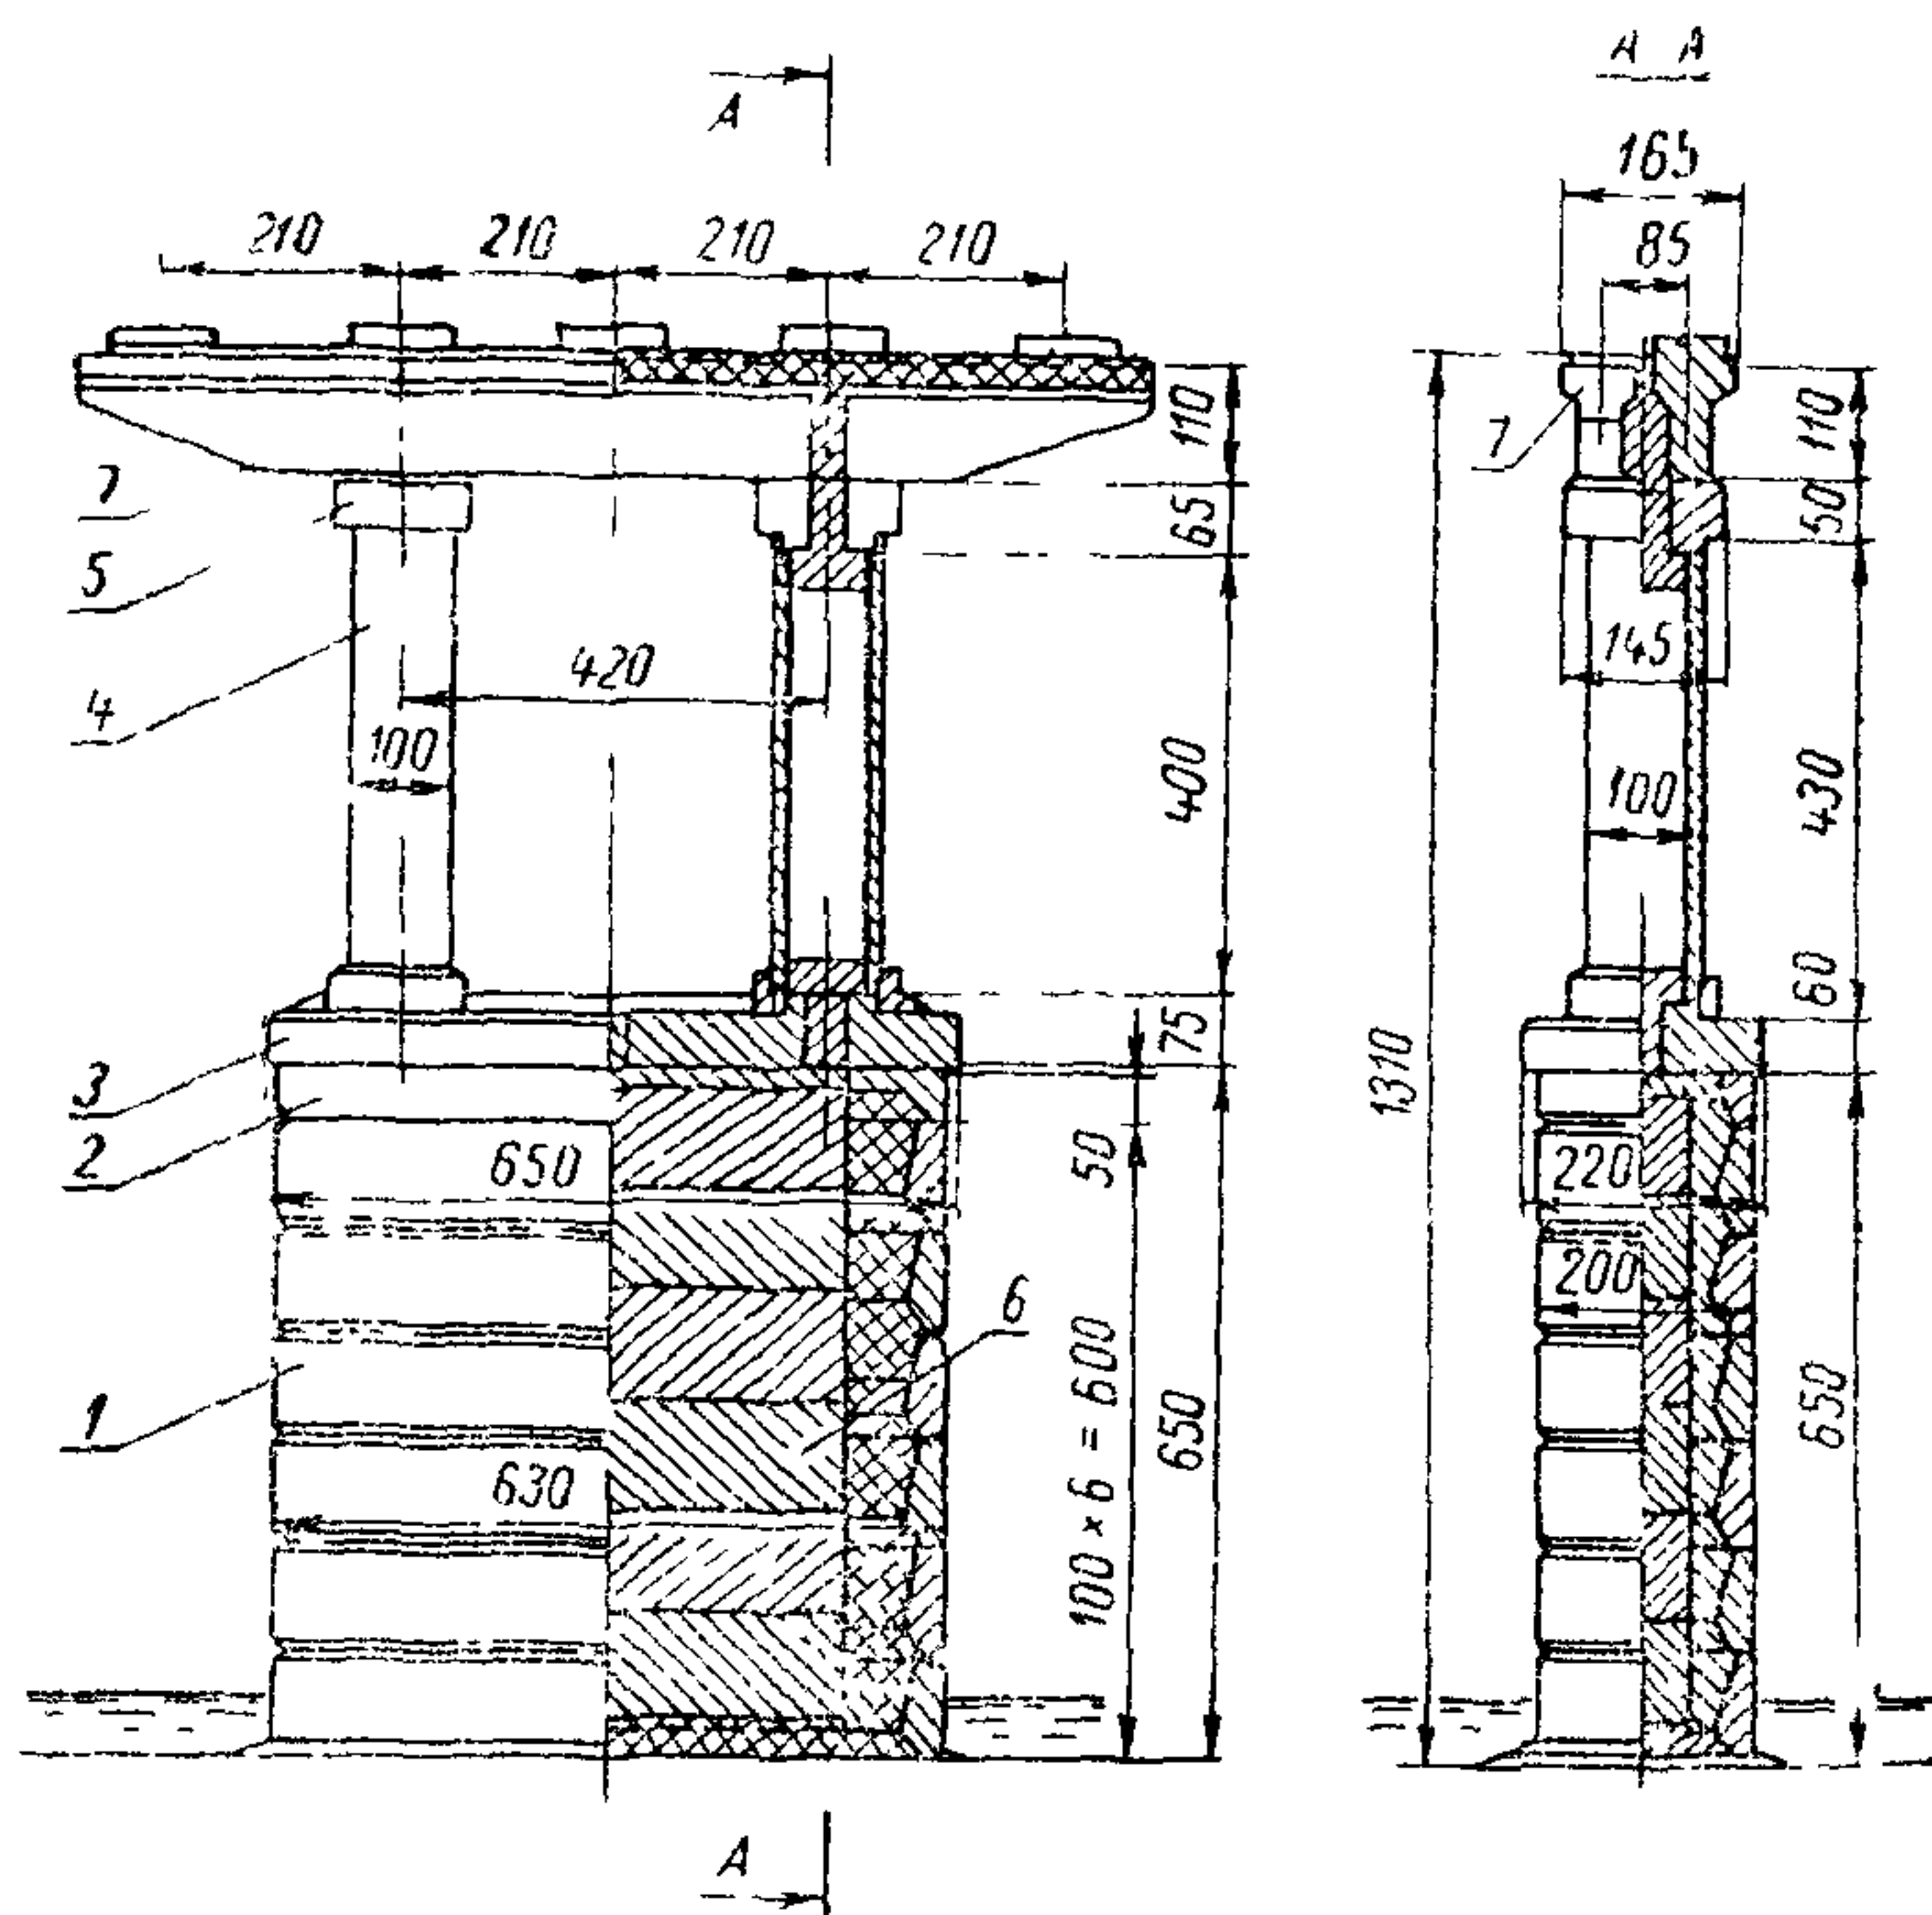


Рис. 1. Общий вид опоры:

1 — контурные блоки Т-3; 2 — то же Т-4; 3 — блоки прокладного ряда ПС-2; 4 — блоки столбов С-3; 5 — блоки капителей; 6 — блоки заполнения 3-2, 7 — блоки насадки

часть столбов устанавливают арматурный каркас и укладывают бетонную смесь.

Блоки насадки, изготовленные из предварительно напряженного железобетона марки 400, устанавливают на капители поочередно с последующим их омоноличиванием бетонной смесью.

Подферменники бетонируют при изготовлении насадок на заводе или полигоне.

Монтажные элементы, из которых сооружается опора, их размеры и вес приведены в таблице.

Т а б л и ц а

Характеристика блоков опоры

Марка блока	Наименование блока	Габаритные размеры, м	Объем блока, м ³	Вес блока, т	Количество на опору
Н-42-С9	Блок насадки для подвижного опирания пролетного строения	1,263×0,886×10	5,45	13,6	1

Технологическая карта разработана Новосибирской нормативно-исследовательской станцией (исполнители А. Н. Бурлака и И. В. Якушев) и отделом внедрения передового опыта и технического нормирования в строительстве инженерных сооружений (исполнитель М. И. Нестеров) института «Оргтрансстрой» Министерства транспортного строительства

Редактор Д. Я. Нагевич

Москва 1973

Техн. редактор А. Б. Орлов

Л 71983. Подписано к печати 19 июня 1973 г. Объем 2,25 печ. л.,
2,08 авт. л., 2,3 уч.-изд. л. Зак. 1497. Тир. 1500. Бесплатно.

Типография института «Оргтрансстрой» Министерства транспортного
строительства, г. Вельск Арханг. обл

Продолжение

Наименование	Марка	Единица измерения	Количество при строительстве опоры	
			на суше	на воде
Топоры плотничные	РС-20 ЛК ЛП ЛО	шт	2	2
Молотки		»	2	2
Пожовки		»	2	2
Уровень деревянный длиной 1 м		»	1	1
Отвес закрытый		»	1	1
Рулетка металлическая		»	1	1
Лопаты штыковые		»	2	2
Лопаты подборочные		»	3	3
Ломы остроконечные		»	2	2
Конопатки металлические		»	2	2

Продолжение					
Марка блока	Наименование блока	Габаритные размеры, м	Объем блока, м ³	Вес блока, т	Количество на опору
Н-42-С9	Блок насадки для неподвижного опирания пролетного строения .	1,443×0,886×10	6,08	15,2	1
К-2	Блоки капителей . .	1,15×1,45×0,65	0,79	2,0	2
С-3	Блоки столбов . . .	Диаметром 1 м, длиной 4 м	1,32	3,3	2
ПС-2	Блоки прокладника .	3,33×2,20×0,75	3,63	9,1	2
Т-3	Блоки массивной части (контурные) . . .	6,3×2,0×0,98	3,72	9,3	6
Т-4	То же	6,3×2,0×0,49	1,8	4,5	1
З-2	Блоки заполнения ядра опоры	4,5×0,9×0,98	3,98	9,5	6

Привязка карты к местным условиям строительства состоит в уточнении объема работ, затрат труда и материально-технических ресурсов.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

В карте предусматривается сооружение железобетонных промежуточных опор с двухстолбчатой надстройкой в следующих вариантах:

- при блочном заполнении ядра опоры, сооружаемой на суше и на воде;
- при монолитном заполнении ядра опоры, сооружаемой на суше и на воде.

До начала основных работ по возведению опоры должны быть выполнены следующие работы:

- спланирована и освещена стройплощадка;
- возведен фундамент опоры;
- разбиты и закреплены оси опоры;
- построены необходимые инвентарные временные сооружения;
- доставлены на площадку оборудование, инструмент и приспособления.

Сооружение опор на суше

а) При блочном заполнении ядра

Все сборные элементы опоры устанавливают краном К-252 с двух стоянок (рис. 2). Предварительно завезенные элементы должны быть уложены на заранее размеченных местах с таким расчетом, чтобы уменьшить количество стоянок крана.

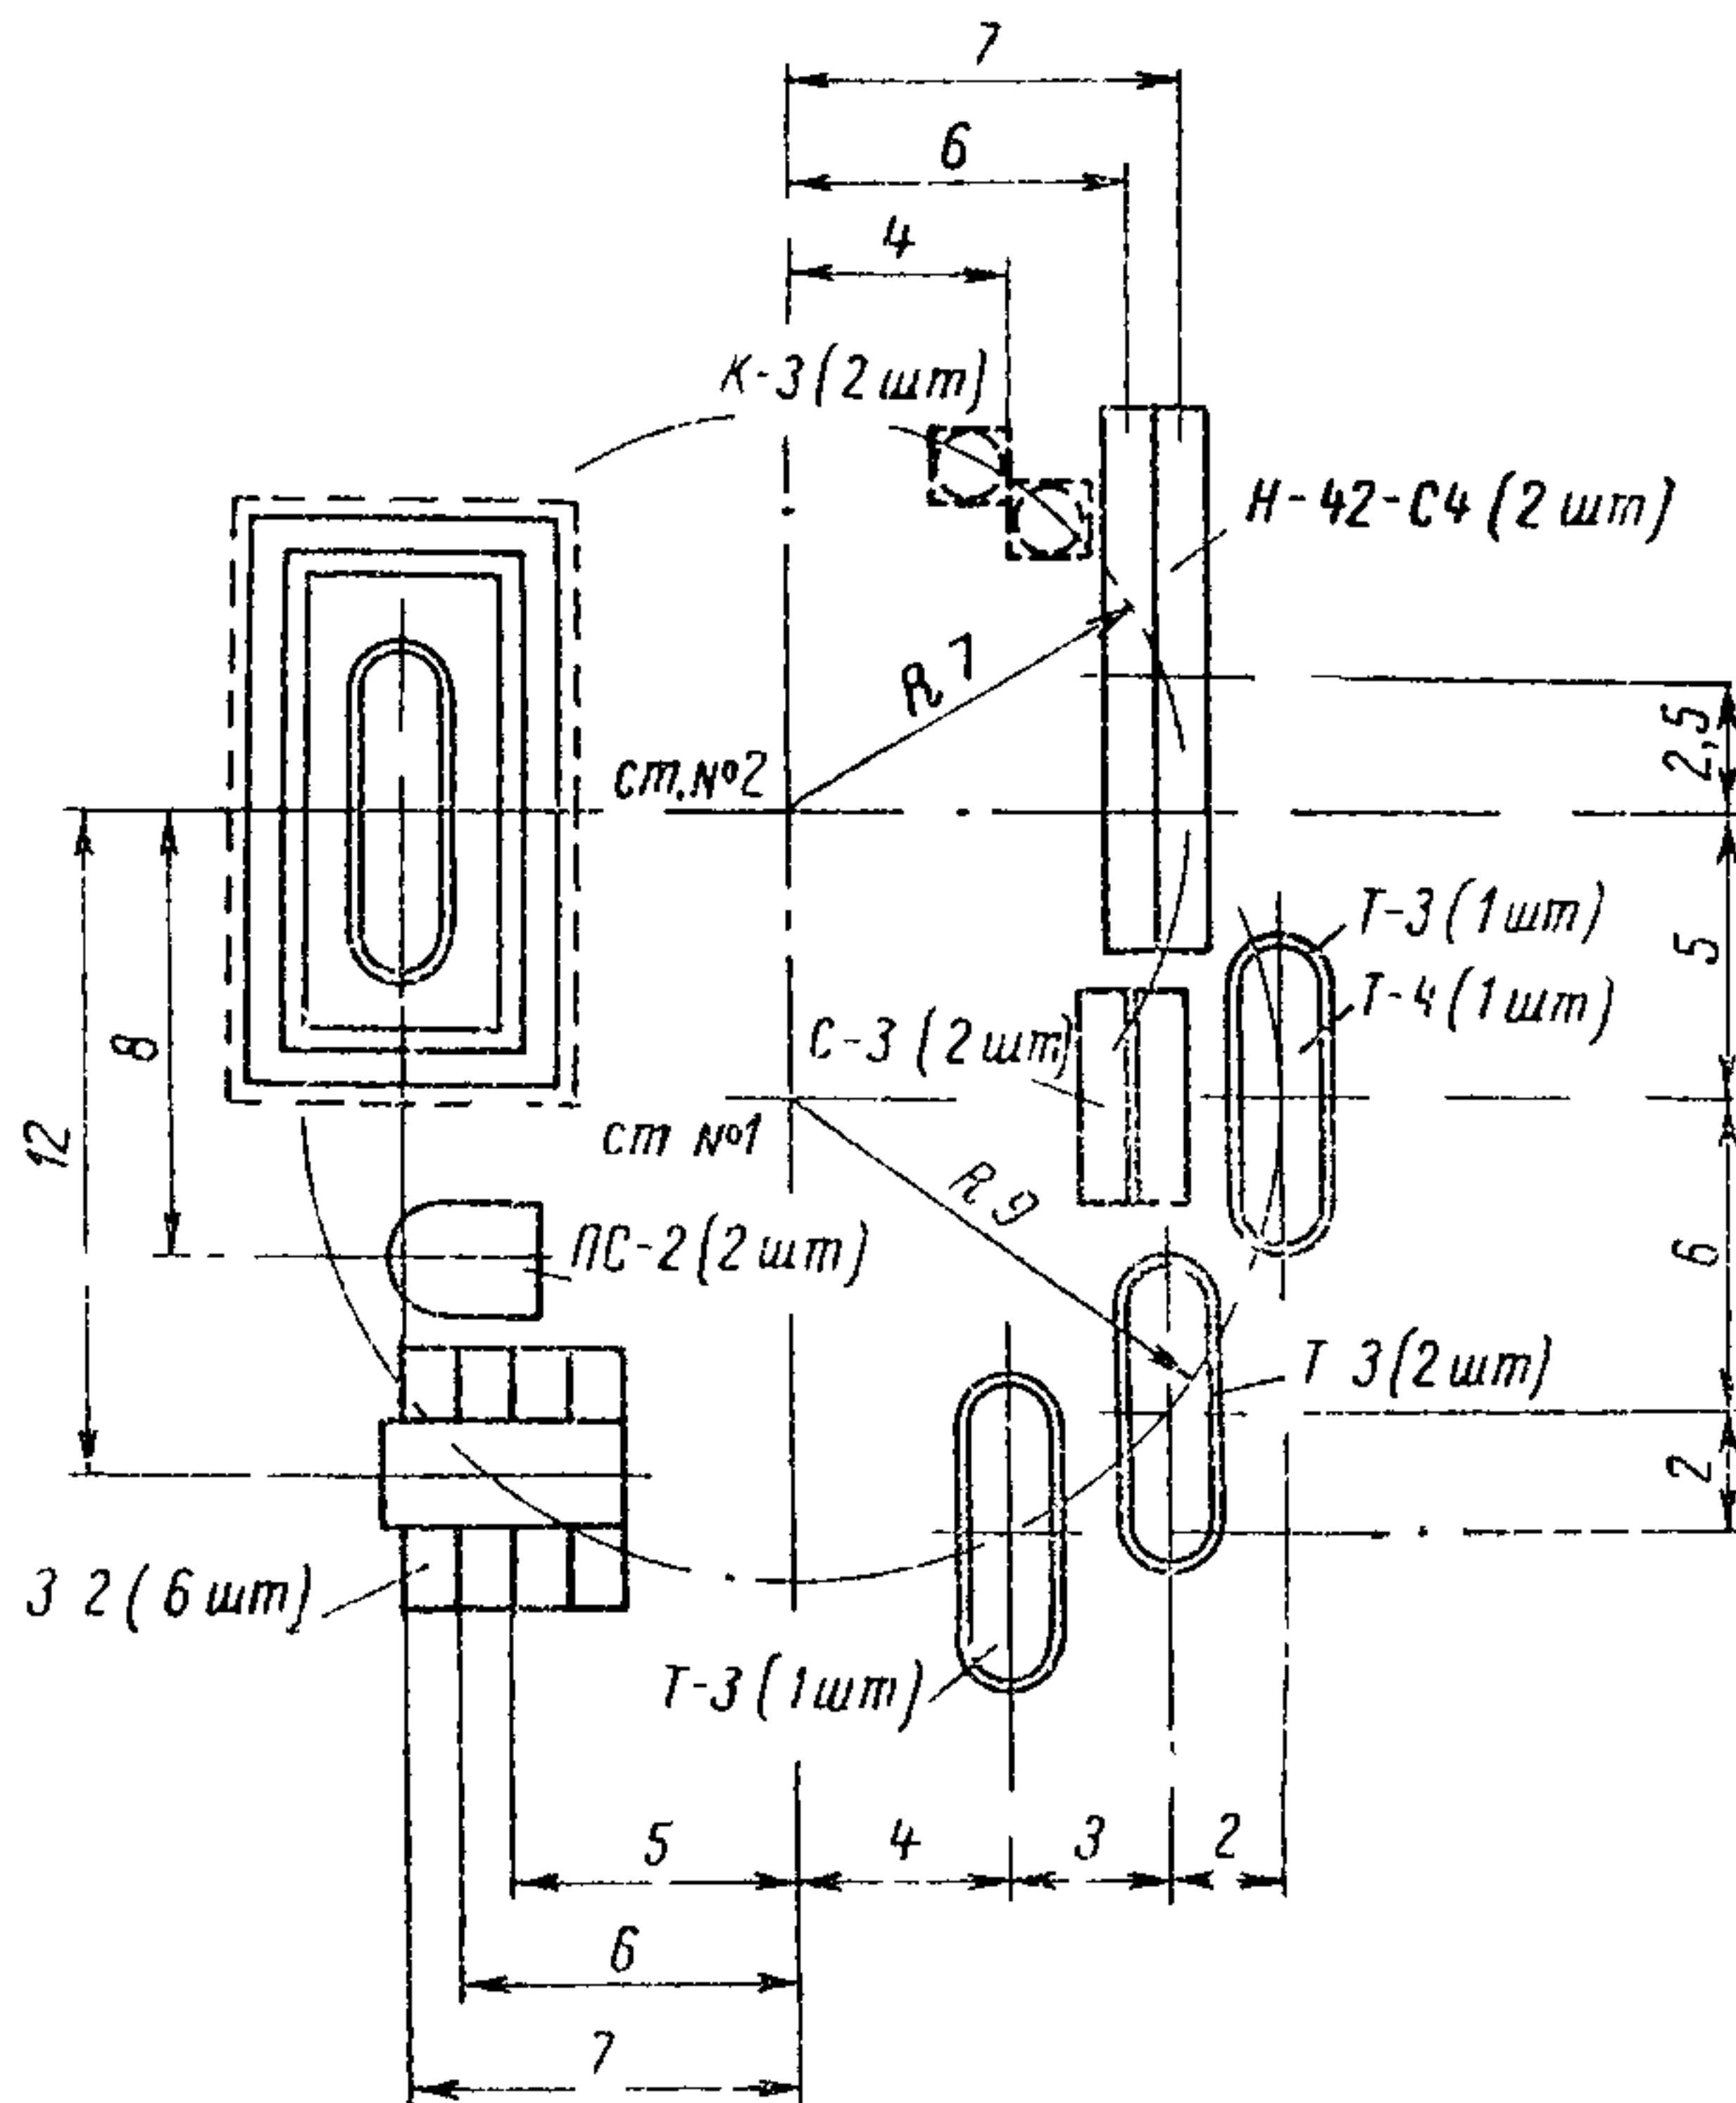


Рис. 2. Схема размещения сборных конструкций:
Ст. № 1 и Ст. № 2—места стоянки крана К-252

До монтажа опоры создают полный или сменный запас элементов, а остальные подвозят во время работ и монтируют «с колес». Бетонную смесь для омоноличивания опор доставляют в автосамосвалах с бетонного завода, а раствор приготавливают из готовой сухой смеси на стройплощадке. Для этого растворомешалку С-80 емкостью 40 л устанавливают непосредственно около сооружаемой опоры.

Перед укладкой первого контурного блока проверяют высотные отметки фундамента по нивелиру. Первый контурный блок должен быть плотно установлен по всей постели на раствор в соответствии с разбивочными осями опоры. Последующие ряды укладывают насухо по уровню и отвесу с выравниванием по наружным видимым граням опоры. Толщину шва, равную 10—20 мм, фиксируют клиньями.

После установки первого контурного блока Т-3 на плиту фундамента устанавливают четыре бетонных кубика высотой 25 см, до уровня верхней грани которых затем укладывают бетонную смесь для заполнения ядра с последующей установкой первого блока заполнения 3-2.

Продолжение

Наименование	Марка блока, раствора или бетона	Единица измерения	Количество	
			при блочном заполнении	при монолитном заполнении
Блоки массивной части (контурные)	T-4	$\frac{\text{шт}}{\text{м}^3}$	$\frac{1}{1,8}$	$\frac{1}{1,8}$
Блоки заполнения	3-2	»	$\frac{6}{23,88}$	—
Цементно-песчаный раствор	марка 200	м^3	2,14	1,72
Бетон	марка 150	»	24,20	38,08
То же	марка 400	»	2,67	2,67
Камень бутовый		»	—	10,00
Пакля строительная		кг	10	10
Доски обрезные		м^3	0,42	0,42
Гвозди строительные		кг	4,2	4,2
Цементный раствор для расшивки швов	марка 200	м^3	0,08	0,08

Б. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и приспособлениях

Наименование	Марка	Единица измерения	Количество при строительстве опоры	
			на суше	на воде
Кран на пневмоколесном ходу	К-252	шт.	1	1
Кран плавучий на плашкоуте из 10 понтонов КС-3	ГМК-12/20	»	—	1
Плашкоуты из двух понтонов	КС-3	»	—	12
Растворомешалка	СО-80	»	1	1
Инвентарные подмости (со щитами)		т	6	6
Инвентарные круглые подмости		компл.	2	2
Вибратор		шт.	2	2
Электросварочный аппарат		»	1	1
Бадьи для бетона емкостью до 2 м^3		»	2	2
Контейнеры для камня		»	4	4
Универсальная траверса с полуавтоматическими стропами		»	1	1
Стропы инвентарные		»	2	2

Продолжение

Наименование показателей	Единица измерения	По калькуляции А	По графику Б	На сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (—), чем по калькуляции $\left(\frac{Б-А}{А} \times 100 \% \right)$
Затраты машино-смен:				
крана К-252	на 1 м ³ кладки	0,092	0,094	+2,1
крана ГМК 12/20	То же	0,092	0,094	+2,1
б) При монолитном заполнении				
Затраты труда	чел-дн	52,27	50,2	—4
Трудоемкость работ на 1 м ³ кладки	»	0,534	0,513	—4
Средний разряд рабочих	разр.	3,58	3,59	+0,3
Среднедневная заработная плата	руб.	4,70	4,89	+4
Затраты машино-смен:				
крана К-252	на 1 м ³ кладки	0,012	0,01	—1,6
крана ГМК 12/20	То же	0,012	0,01	—1,6

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Потребность в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных материалах

Наименование	Марка блока, раствора или бетона	Единица измерения	Количество	
			при блочном заполнении	при монолитном заполнении
Блоки насадки для подвижного опирания пролетного строения	Н-42-С9	$\frac{\text{шт.}}{\text{м}^3}$	$\frac{1}{5,45}$	$\frac{1}{5,45}$
Блоки насадки для неподвижного опирания пролетного строения	Н-42-С9	»	$\frac{1}{6,08}$	$\frac{1}{6,08}$
Блоки капителей	К-2	»	$\frac{2}{1,58}$	$\frac{2}{1,58}$
Блоки столбов	С-3	»	$\frac{2}{2,64}$	$\frac{2}{2,64}$
Блоки прокладника	ПС-2	»	$\frac{2}{7,26}$	$\frac{2}{7,26}$
Блоки массивной части (контурные)	Т-3	»	$\frac{6}{22,32}$	$\frac{6}{22,32}$

Это позволяет избежать технологического перерыва при монтаже опоры во время набора прочности бетоном.

Порядок установки блоков и последовательность их омоноличивания указаны на рис. 3.

В дальнейшем для сооружения массивной части опоры устанавливают леса-подмости с наращиванием их по мере возведения тела опоры.

31	Бетон М-400	0,72
30	Н-42-С9	15,2
29	Н-42-С9	15,2
28	Бетон М-400	0,97
27	К - 2	2,0
26	К - 2	2,0
25	Бетон М-400	0,98
24	С - 3	3,3
23	С - 3	3,3
22	ПС - 2	9,1
21	ПС - 2	9,1
20	Бетон М-150	4,85
19	Т - 4	4,5
18	З - 2	9,5
17	Бетон М-150	3,3
16	Т - 3	9,3
15	З - 2	9,5
14	Бетон М-150	3,3
13	Т - 3	9,3
12	З - 2	9,5
11	Бетон М-150	3,3
10	Т - 3	9,3
9	З - 2	9,5
8	Бетон М-150	3,3
7	П - 3	9,3
6	З - 2	9,5
5	Бетон М-150	3,3
4	Т - 3	9,3
3	З - 2	9,5
2	Бетон М-150	2,85
1	Т - 3	9,3

II

То же
вылет стрелы
7 м

I

Пневмоколес-
ный кран К-252
со стрелой 15м
на выносных
опорах
Вылет стрелы
9м

Монтаж-
ный элемент
№

Марка
элемента

Вес
блока
в т
бетона
в м

Стояч-
ка
крана

Марка крана
и
вылет стрелы

Рис. 3. Технологическая схема последовательности монтажа опоры при блочном заполнении ядра

Швы по контуру видимой поверхности опоры заполняют конопаткой. Омоноличивание контурного блока и блока заполнения выполняют бетоном марки 150 до уровня верхней грани блока заполнения.

Перед укладкой блоки тщательно очищают от грязи и обильно смачивают водой.

Бетонная смесь для заполнения внутренних полостей должна быть приготовлена на пластифицированном цементе с умеренной экзотермией и водо-цементным отношением не выше 0,5. В бетонную смесь следует вводить воздухововлекающие добавки в количестве 0,02—0,05 % веса цемента.

Цементный раствор в зависимости от зоны расположения конструкции опоры и агрессивности среды надлежит готовить на цементах, отвечающих требованиям п. 26 ВСН 114-65.

Осадка конуса раствора для горизонтальных швов применяется в пределах от 6 до 8 см.

При омоноличивании последнего контурного блока бетон укладывают на 1 см выше верхней грани его, одновременно устанавливают арматурные сетки по оси опоры и два арматурных каркаса для последующего соединения опоры с прокладником и столбом.

Прокладник устанавливают на раствор, уложенный по верхней плоскости коробчатого блока. Блоки прокладника между собой соединяют арматурными выпусками с установкой дополнительной арматуры и омоноличиванием бетоном марки 400.

Выше горизонта высоких вод на массивную часть опоры устанавливают двухстолбчатую надстройку из труб-оболочек диаметром 1 м. Концы оболочки заканчиваются металлическими обечайками, заделываемыми в теле прокладника и капителей.

Столбы до подъема обстраивают необходимыми для размещения монтажников инвентарными круглыми люльками. Для обеспечения необходимой точности установки столбы строят за верхний торец с помощью траверсы. Столбы закрепляют на прокладнике приваркой арматурных стержней к обечайкам. Закладные части для предохранения от коррозии покрывают цементобетонной смесью. Нижнюю часть столбов в пределах высоты 30 см заполняют бетоном. Внутреннюю поверхность центрифугированных труб-оболочек перед укладкой бетона тщательно очищают от шлама.

На столбы устанавливают капители К-2. Для омоноличивания столбов и капителей в гнезда капителей и в верхнюю часть столбов устанавливают арматурный каркас и укладывают бетонную смесь. Перед установкой капителей в полость столба опускают щит из досок, который служит опалубкой. С наружной стороны к верху столба и закладным деталям

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общий объем бетонной и железобетонной кладки опоры, м³:

Всего 97,88

В том числе:

сборной кладки при блочном заполнении 71,01

то же при монолитном заполнении 47,13

монолитной кладки при блочном заполнении 26,87

то же при монолитном заполнении «с изюмом» 40,75

Наименование показателей	Единица измерения	По калькуляции А	По графику Б	На сколько процентов показатель по графику больше (+) или меньше (—), чем по калькуляции $\left(\frac{Б-А}{А} \times 100\% \right)$
I. Монтаж опор на суше				
а) При блочном заполнении				
Затраты труда	чел-дн	39,21	37,1	—10,5
Трудоемкость работ на 1 м ³ кладки	»	0,401	0,379	—10,5
Средний разряд рабочих	разр.	3,64	3,73	+2,5
Среднедневная заработная плата	руб.	4,72	4,81	+1,9
Затраты машино-смен крана К-252	на 1 м ³ кладки	0,041	0,044	+7,4
б) При монолитном заполнении ядра				
Затраты труда	чел-дн	41,4	39,4	—4,8
Трудоемкость работ на 1 м ³ кладки	»	0,423	0,403	—4,8
Средний разряд рабочих	разр.	3,62	3,72	+2,8
Среднедневная заработная плата	руб.	4,72	5,15	+9,1
Затраты машино-смен крана К-252	на 1 м ³ кладки	0,054	0,047	—13
II. Монтаж опор на воде				
б) При блочном заполнении ядра				
Затраты труда	чел-дн	49,33	47,46	—4
Трудоемкость работ на 1 м ³ кладки	»	0,504	0,485	—4
Средний разряд рабочих	разр.	3,49	3,60	+3,15
Среднедневная заработная плата	руб.	4,73	4,92	+4

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб.—коп.	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп.
5	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1	Погрузка бутового камня в бадьях на плашкоуты с при- емом из самосвала	т	16,0	0,50	0—29,5	8,00	4—72
		Машинист крана 6 разр.—1		»	16,0	0,25	0—19,7	4,00	3—15
6		Бетонщики: 3 разр.—1 2 » —1	Приготовление цементного раствора	м³	2,14	1,35	0—68,5	2,89	1—47
7		Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1	Прочие работы	чел-ч	32,8	1,00	0—59	32,80	19—35
		Машинист крана 6 разр.—1		»	32,8	0,50	0—39,5	16,40	12—96
			Итого на опору:						
			для монтажников кон- струкций	чел-ч				418,21	246—81
			то же	чел-дн				52,27	
			для машиниста крана	чел-ч				86,83	66—30
			то же	чел-дн				10,85	

капителей приваривают арматурные стержни и омоноличивают стык бетоном.

Блоки насадки на капители устанавливают поочередно и соединяют между собой арматурными выпусками в верхней части блоков, дополнительной арматурой и двумя диафрагмами, устраиваемыми в местах ранее установленных арматурных сеток, с омоноличиванием бетоном.

Сливы устраивают из цементного раствора марки 200 одновременно с омоноличиванием насадок. Все работы выполняются с инвентарных металлических подмостей.

После твердения бетона омоноличивания производится расшивка швов раствором марки 200.

Расшитые швы должны быть ровными, плотными, без трещин, с хорошим сцеплением с блоками.

Затирка и штукатурка наружных поверхностей блоков и швов запрещается.

б) При монолитном заполнении ядра

Сооружение массивно-столбчатой опоры производят ярусами на высоту 3—4 блоков, которые укладывают насухо на деревянные клинья (рис. 4). Перед укладкой блоки тщательно очищают от грязи и обильно смачивают водой. Первый контурный блок укладывают по нивелиру, а последующие блоки—по уровню и отвесу. После укладки трех-четырех рядов блоки выверяют по высоте нивелированием; обнаруженные отклонения от проекта исправляют увеличением или уменьшением толщины последующих швов. Нижний контурный блок устанавливают на цементно-песчаный раствор марки 200, а последующие—на клинья. Швы по контуру видимой поверхности опоры конопатят. Ядро опоры заполняют бутобетоном марки 150.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 30 см на всю высоту с добавлением бутового камня (изюма). Бутовый камень применяется крупностью более 150 мм в количестве, не превышающем 20% объема бетона.

Бутовый камень предварительно очищают и промывают водой под напором.

Прочность укладываемого камня должна быть не ниже прочности крупного заполнителя бетонной смеси.

Для «изюма» должны отбираться камни, не имеющие трещин и прослоек (сильноокатанные камни не допускаются). Должно быть обеспечено обволакивание каждого камня слоем бетона, для чего камни должны отстоять от внутренних стенок оболочек на расстоянии 300 мм и не должны соприкасаться с арматурой и закладными частями.

Расстояние между укладываемыми камнями должно допускать применение внутренних вибраторов и быть не менее 200 мм в горизонтальных рабочих швах законченных ярусов.

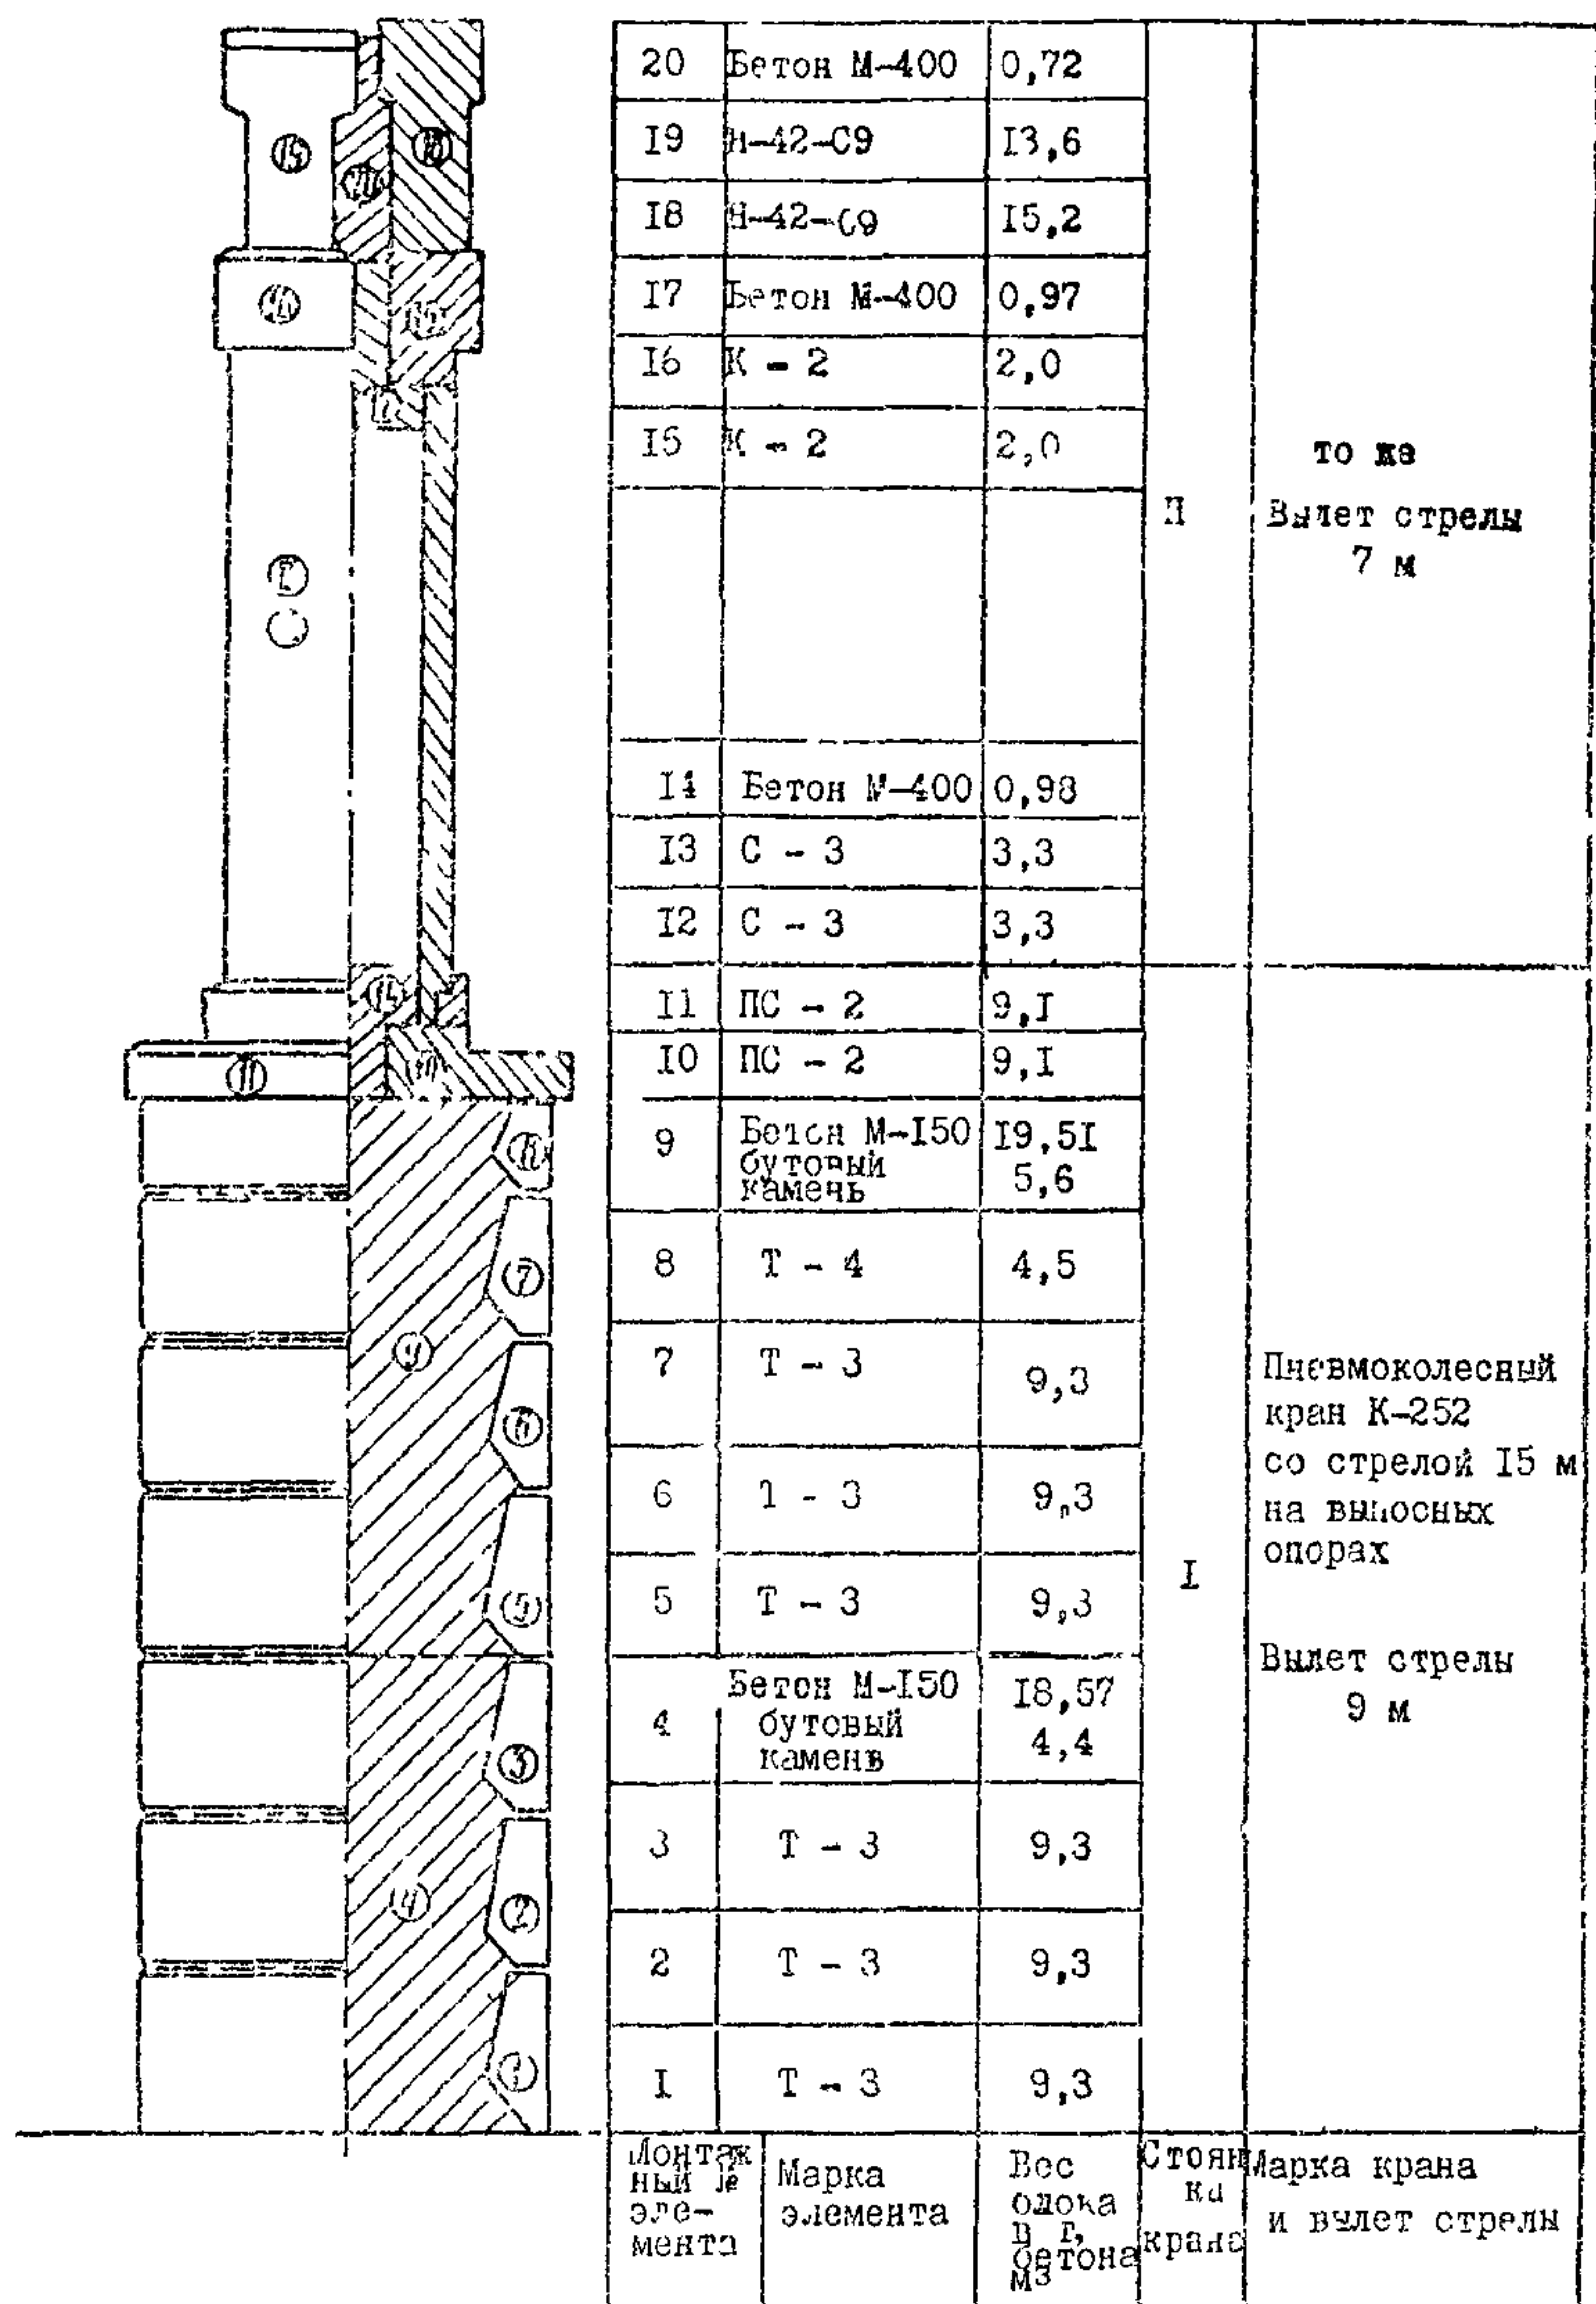


Рис 4 Технологическая схема последовательности монтажа опоры при монолитном заполнении ядра

Камни должны выступать над поверхностью бетона примерно на $\frac{1}{3}$ своего объема для лучшей связи ярусов между собой.

После заполнения полости первого яруса приступают к монтажу контурных блоков второго яруса и его заполнению бутобетоном.

Калькуляция № 4. Монтаж опоры (при монолитном заполнении), сооружаемой на воде

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб.—коп.	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп.
1	Калькуляция № 2		Работы, предусмотренные калькуляцией № 2 (за исклю- чением затрат на пригото- вление раствора), п. 25	опора	1			328,33	194—05
				»	1			43,34	31—95
2	Местная норма МСП-450	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1	Погрузка элементов инвен- тарных подмостей на плашко- ут с подачей к месту монтажа	т	5,5	0,50	0—29,5	2,75	1—62
		Машинист крана 6 разр.—1		»	5,5	0,25	0—19,7	1,37	1—08
3	Местная норма МСП-450	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1	Погрузка блоков на плаш- коут стреловым краном	блок	15	1,18	0—69,6	17,70	10—44
		Машинист крана 6 разр.—1		»	15	0,59	0—46,7	8,85	7—00
4	Местная норма МСП-450	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1	Погрузка бетона в бадьях на плашкоут стреловым кра- ном с приемом бетона из са- мосвала в бадьи	м³	40,22	0,64	0—37,7	25,74	15—16
		Машинист крана 6 разр.—1		»	40,22	0,32	0—25,3	12,87	10—17

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб.—коп	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп.
5	ЕНиР, § 3—18, № 1+4	Бетонщики. 3 разр.—1 2 » —1	Приготовление цементного раствора	м³	2,14	1.35	0—68,5	2,89	1—47
6		Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1 Машинист крана 6 разр.—1	Прочие работы	чел-ч	38,4	1	0—59	38,40	22—65
				»	38,4	0,5	0—39,5	19,20	15—17
			Итого на одну опору: для монтажников кон- струкций то же для машиниста крана то же	чел-ч чел-дн чел-ч чел-дн				395,08 49,33 73,66 9,21	233—35 57—02

Для обеспечения монолитности опоры продолжительность перерывов между укладкой бетонной смеси в ярусах должна устанавливаться строительной лабораторией в зависимости от температуры наружного воздуха, марки цемента и других факторов.

Монтаж блоков прокладника, столбов, капителей, насадок и их омоноличивание, а также расшивка швов производится аналогично работам, выполняемым при сооружении опоры с блочным заполнением ядра.

Сооружение опор на воде

Технология монтажа опоры, сооружаемой на воде как при блочном заполнении ядра, так и при монолитном заполнении ядра бутобетоном аналогична технологии монтажа опоры на суше.

Монтаж опоры на воде выполняют деррик-краном ГМК-12/20, установленным на плашкоут из 10 понтонов КС. Сборные элементы под монтаж подают на плавсредствах. Погрузку сборных элементов и необходимых материалов на плашкоуты из двух понтонов КС выполняют пневмоколесным краном К-252 (рис. 5). Для погрузки на плавсредства блоков и материалов, а также для доставки их на плаву к месту монтажа выделяется дополнительное звено № 3 из двух человек.

Требования к качеству работ

Допускаемые отклонения и смещения при монтаже бетонных и железобетонных конструкций не должны превышать в мм:

Смещение осей в плане относительно разбивочных осей:

опоры в уровне обреза фундамента	10
опоры в уровне подферменников	0,0004 высоты опоры, но не более 50
стоек и колонн в нижнем сечении	5

Отклонение отметок поверхностей:

верха стоек и ригелей	+25, —10
верха подферменной площадки	±15
разность отметок подферменных площадок на ригеле в пределах одной опоры	±5

Относительное смещение элементов сборных конструкций:

наружных граней смежных блоков опор	5
сборных элементов в месте устройства стыков омоноличивания	По указанию проекта

Отклонение от вертикали боковых поверхностей опоры:

массивной части опоры выше обреза фундамента	0,002 высоты опоры, но не более 25
--	------------------------------------

Дополнительное звено № 3 состоит из двух монтажников конструкций 4 и 3 разр.

Кроме комплексной бригады при сооружении опоры работают:

- машинист крана ГМК-12/20 6 разр.—1;
- машинист крана К-252 6 разр.—1;
- моторист катера 5 разр.—1;
- дежурный слесарь 4 разр.—1;
- дежурный электромонтер 4 разр.—1.

Звенья № 1 и 2 ведут монтаж опоры плавучим краном ГМК-12/20 по технологии, предусмотренной для опор, сооружаемых на суше.

Звено № 3 выполняет погрузку на плашкоуты элементов металлических подмостей, сборных элементов опор, бетона в кублах, бутового камня и раствора при помощи крана К-252. Кроме погрузочных работ звено № 3 разгружает бетон из самосвалов в кубла и prepares раствор.

При сооружении опор рекомендуется применять следующие рациональные приспособления и прогрессивные приемы труда.

1. Четырехветвевой полуавтоматический строп или траверсу с полуавтоматическими зацепами для строповки сборных элементов, подаваемых к месту установки.

2. Кубла-бункера с сегментными затворами емкостью 1,5 м³ и вибратор, закрепленный с наружной стороны бункера для быстрой выгрузки бетона. Система рычагов для открывания и закрывания сегментного затвора бункера оборудуется винтовым приспособлением для выдачи из бункера небольшого количества бетона и равномерного распределения его по поверхности опоры.

3. Транспортировку бутового камня и его подачу следует производить в металлических контейнерах с открывающимся днищем, что сокращает время погрузочно-разгрузочных работ.

4. Монтаж сборных конструкций рекомендуется производить «с колес». Во избежание простоев в работе, из-за несвоевременной доставки блоков, необходимо на строительной площадке до начала монтажных работ иметь сменный запас конструкций.

9	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка железобетонных столбов С-3 диаметром 1 м в проектное положение и за- крепление электросваркой при весе блока 3,3 т	блок	2	6,7	4—08	13,40	8—16
				»	2	1,7	1—10,6	3,40	2—21
10	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в сты- ках блоков прокладника и прокладника со столбами С-3	кг	107,6	0,06	0—04	6,46	4—30
11	ЕНиР, § 4—4—27, № 2	Электро- сварщик 5 разр.—1 Монтажник конструкций 3 разр.—1	Сварка стержней в стыках столбов с прокладником дли- ной шва 200 мм (швы верти- кальные)	100 стыков	0,64	9,7	6—10	6,21	3—90
12	Местная норма МСП-414	Плотники: 5 разр.—1 4 » —2	Установка опалубки при сопряжении прокладника со столбами и блоков прокладни- ка между собой	1 стык	3	2,4	1—56	7—20	4—68
13	ЕНиР, § 4—4—13, № 1	Бетонщики: 4 разр.—1 3 » —1	Омоноличивание столбов с прокладником и блоков про- кладника между собой	»	3	1,85	1—09	5,55	3—27
14	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в сты- ках столбов и капителей	кг	34,9	0,06	0—04	2,09	1—40
15	ЕНиР, § 4—4—9, № 9	Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка блоков капителей К-2 весом 2 т с закреплением электросваркой	блок	2	2,44	1—44	4,88	2—88
				»	2	0,61	0—48,2	1,22	0—96

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб.—коп	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп.
5	ЕНиР, § 3—18, № 1+4	Бетонщики: 3 разр.—1 2 » —1	Приготовление цементного раствора	м³	2,14	1,35	0—68,5	2,89	1—47
6		Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1 Машинист крана 6 разр.—1	Прочие работы	чел-ч	38,4	1	0—59	38,40	22—65
				»	38,4	0,5	0—39,5	19,20	15—17
			Итого на одну опору:						
			для монтажников кон- струкций	чел-ч				395,08	233—35
			то же	чел-дн				49,33	
			для машиниста крана	чел-ч				73,66	57—02
			то же	чел-дн				9,21	

Для обеспечения монолитности опоры продолжительность перерывов между укладкой бетонной смеси в ярусах должна устанавливаться строительной лабораторией в зависимости от температуры наружного воздуха, марки цемента и других факторов.

Монтаж блоков прокладника, столбов, капителей, насадок и их омоноличивание, а также расшивка швов производятся аналогично работам, выполняемым при сооружении опоры с блочным заполнением ядра.

Сооружение опор на воде

Технология монтажа опоры, сооружаемой на воде как при блочном заполнении ядра, так и при монолитном заполнении ядра бутобетоном аналогична технологии монтажа опоры на суше.

Монтаж опоры на воде выполняют деррик-краном ГМК-12/20, установленным на плашкоут из 10 понтонов КС. Сборные элементы под монтаж подают на плавсредствах. Погрузку сборных элементов и необходимых материалов на плашкоуты из двух понтонов КС выполняют пневмоколесным краном К-252 (рис. 5). Для погрузки на плавсредства блоков и материалов, а также для доставки их на плавучую к месту монтажа выделяется дополнительное звено № 3 из двух человек.

Требования к качеству работ

Допускаемые отклонения и смещения при монтаже бетонных и железобетонных конструкций не должны превышать в мм:

Смещение осей в плане относительно разбивочных осей:	
опоры в уровне обреза фундамента	10
опоры в уровне подферменников	0,0004 высоты опоры, но не более 50
стоек и колонн в нижнем сечении	5
Отклонение отметок поверхностей:	
верха стоек и ригелей	+25, — 10
верха подферменной площадки	± 15
разность отметок подферменных площадок на ригеле в пределах одной опоры	± 5
Относительное смещение элементов сборных конструкций:	
наружных граней смежных блоков опор	5
сборных элементов в месте устройства стыков омоноличивания	По указанию проекта
Отклонение от вертикали боковых поверхностей опоры:	
массивной части опоры выше обреза фундамента	0,002 высоты опоры, но не более 25

Дополнительное звено № 3 состоит из двух монтажников конструкций 4 и 3 разр.

Кроме комплексной бригады при сооружении опоры работают:

машинист крана ГМК-12/20 6 разр.—1;

машинист крана К-252 6 разр.—1;

моторист катера 5 разр.—1;

дежурный слесарь 4 разр.—1;

дежурный электромонтер 4 разр.—1.

Звенья № 1 и 2 ведут монтаж опоры плавучим краном ГМК-12/20 по технологии, предусмотренной для опор, сооружаемых на суше.

Звено № 3 выполняет погрузку на плашкоуты элементов металлических подмостей, сборных элементов опор, бетона в кублах, бутового камня и раствора при помощи крана К-252. Кроме погрузочных работ звено № 3 разгружает бетон из самосвалов в кубла и prepares раствор.

При сооружении опор рекомендуется применять следующие рациональные приспособления и прогрессивные приемы труда.

1. Четырехветевой полуавтоматический строп или траверсу с полуавтоматическими зацепами для строповки сборных элементов, подаваемых к месту установки.

2. Кубла-бункера с сегментными затворами емкостью 1,5 м³ и вибратор, закрепленный с наружной стороны бункера для быстрой выгрузки бетона. Система рычагов для открывания и закрывания сегментного затвора бункера оборудуется винтовым приспособлением для выдачи из бункера небольшого количества бетона и равномерного распределения его по поверхности опоры.

3. Транспортировку бутового камня и его подачу следует производить в металлических контейнерах с открывающимся днищем, что сокращает время погрузочно-разгрузочных работ.

4. Монтаж сборных конструкций рекомендуется производить «с колес». Во избежание простоев в работе, из-за несвоевременной доставки блоков, необходимо на строительной площадке до начала монтажных работ иметь сменный запас конструкций.

9	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка железобетонных столбов С-3 диаметром 1 м в проектное положение и закрепление электросваркой при весе блока 3,3 т	блок	2	6,7	4—08	13,40	8—16
				»	2	1,7	1—10,6	3,40	2—21
10	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в стыках блоков прокладника и прокладника со столбами С-3	кг	107,6	0,06	0—04	6,46	4—30
11	ЕНиР, § 4—4—27, № 2	Электросварщик 5 разр.—1 Монтажник конструкций 3 разр.—1	Сварка стержней в стыках столбов с прокладником длиной шва 200 мм (швы вертикальные)	100 стыков	0,64	9,7	6—10	6,21	3—90
12	Местная норма МСП-414	Плотники: 5 разр.—1 4 » —2	Установка опалубки при сопряжении прокладника со столбами и блоков прокладника между собой	1 стык	3	2,4	1—56	7—20	4—68
13	ЕНиР, § 4—4—13, № 1	Бетонщики: 4 разр.—1 3 » —1	Омоноличивание столбов с прокладником и блоков прокладника между собой	»	3	1,85	1—09	5,55	3—27
14	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в стыках столбов и капителей	кг	34,9	0,06	0—04	2,09	1—40
15	ЕНиР, § 4—4—9, № 9	Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка блоков капителей К-2 весом 2 т с закреплением электросваркой	блок	2	2,44	1—44	4,88	2—88
				»	2	0,61	0—48,2	1,22	0—96

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб —коп	Норматив- ное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб —коп
16	ЕНиР, § 4—4—27, № 2	Электро- сварщик 5 разр.—1 Монтажник конструкций 3 разр —1	Сварка стержней в стыках столбов и капителей	100 стыков	0,64	9,7	6—10	6,21	3—90
17	ЕНиР, § 4—4—13, № 3	Бетонщики: 4 разр.—2 3 » —2	Омоноличивание стыков столбов с капителями	стык	2	1,2	0—70,8	2,40	1—42
18	ЕНиР, § 4—4—12, Т-2, № 3	Монтажники конструкций: 6 разр —1 5 » —1 4 » —3 Машинист крана 6 разр.—1	Установка блоков насадки Н 42-С9 весом 13,6 и 15,2 т	блок	2	12,5	8—42	25,00	16—84
				»	2	2,5	1—98	5,00	3—96
19	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в сты- ках насадки	кг	95	0,06	0—04	5,70	3—80
20	Местная норма МСП-414	Плотники: 4 разр —1 3 » —1	Установка опалубки про- дольного шва насадки То же тумб	пог м	13	0,185	0—09,7	2,40	1—26
				шт.	2	0,15	0—08	0,30	0—16

Распределение операций между рабочими звена № 1

Для монтажа сборных железобетонных и бетонных блоков монтажники конструкций 4 и 3 разр. выполняют зачистку стыков, строповку и подачу элементов и раствора к месту монтажа.

Монтажники 5 и 4 разр. устанавливают блоки в проектное положение и расстилают раствор при укладке блоков заполнения. Перед монтажом столбов звено № 1 в полном составе внизу у опоры устанавливает на них инвентарные круглые подмости, необходимые для дальнейшего омоноличивания стыков столбов с капителями и монтажа насадок.

После установки столбов монтажники 5 и 3 разр. сваривают стыки, а монтажники 4 разр. устанавливают арматуру в стыках омоноличивания. Омоноличивание стыков производит все звено № 1.

При укладке бетонной смеси (при блочном и монолитном заполнении ядра опоры) монтажник 3 разр. выгружает бетон из самосвала с подачей его в кублах краном к месту укладки, а монтажники 5, 4 и 3 разр. принимают бетон и укладывают в тело опоры с уплотнением вибраторами.

Распределение операций между рабочими звена № 2

Все рабочие звена № 2 ведут укрупнительную сборку элементов инвентарных металлических подмостей и установку их на место. Элементы собирают вручную, а устанавливают краном во время технологических перерывов при бетонировании ядра опоры.

При конопатке горизонтальных швов монтажник 3 разр. заготавливает и подает материал для конопатки, а монтажники 4 и 3 разр. конопатят швы.

При расшивке швов монтажник 3 разр. удаляет конопатку, выбивает клинья, производит расчистку швов на глубину 4—6 см и промывает швы водой.

Все звено готовит цементный раствор.

Монтажники 4 и 3 разр. заполняют швы раствором с последующей их расшивкой при помощи металлических расшивок вогнутого типа.

При разборке металлических подмостей монтажники 4 и 3 разр. разбирают подмости по элементам и опускают их вниз, а монтажник 3 разр. производит их раскладку по маркам на прокладки.

Сооружение опоры на воде выполняют в две смены двумя комплексными бригадами в составе 9 человек, которые распределяются на три звена.

Звенья № 1 и 2 работают в прежнем составе, как и при сооружении опоры на суше.

стоек и колонн	0,002 высоты опоры, но не более 20
Отклонение от средней толщины швов 15 мм	+5
Отклонение осей стоек и колонн	0,002 высоты опоры, но не более 25
Разность в отметках верха смежных стоек и колонн	±10

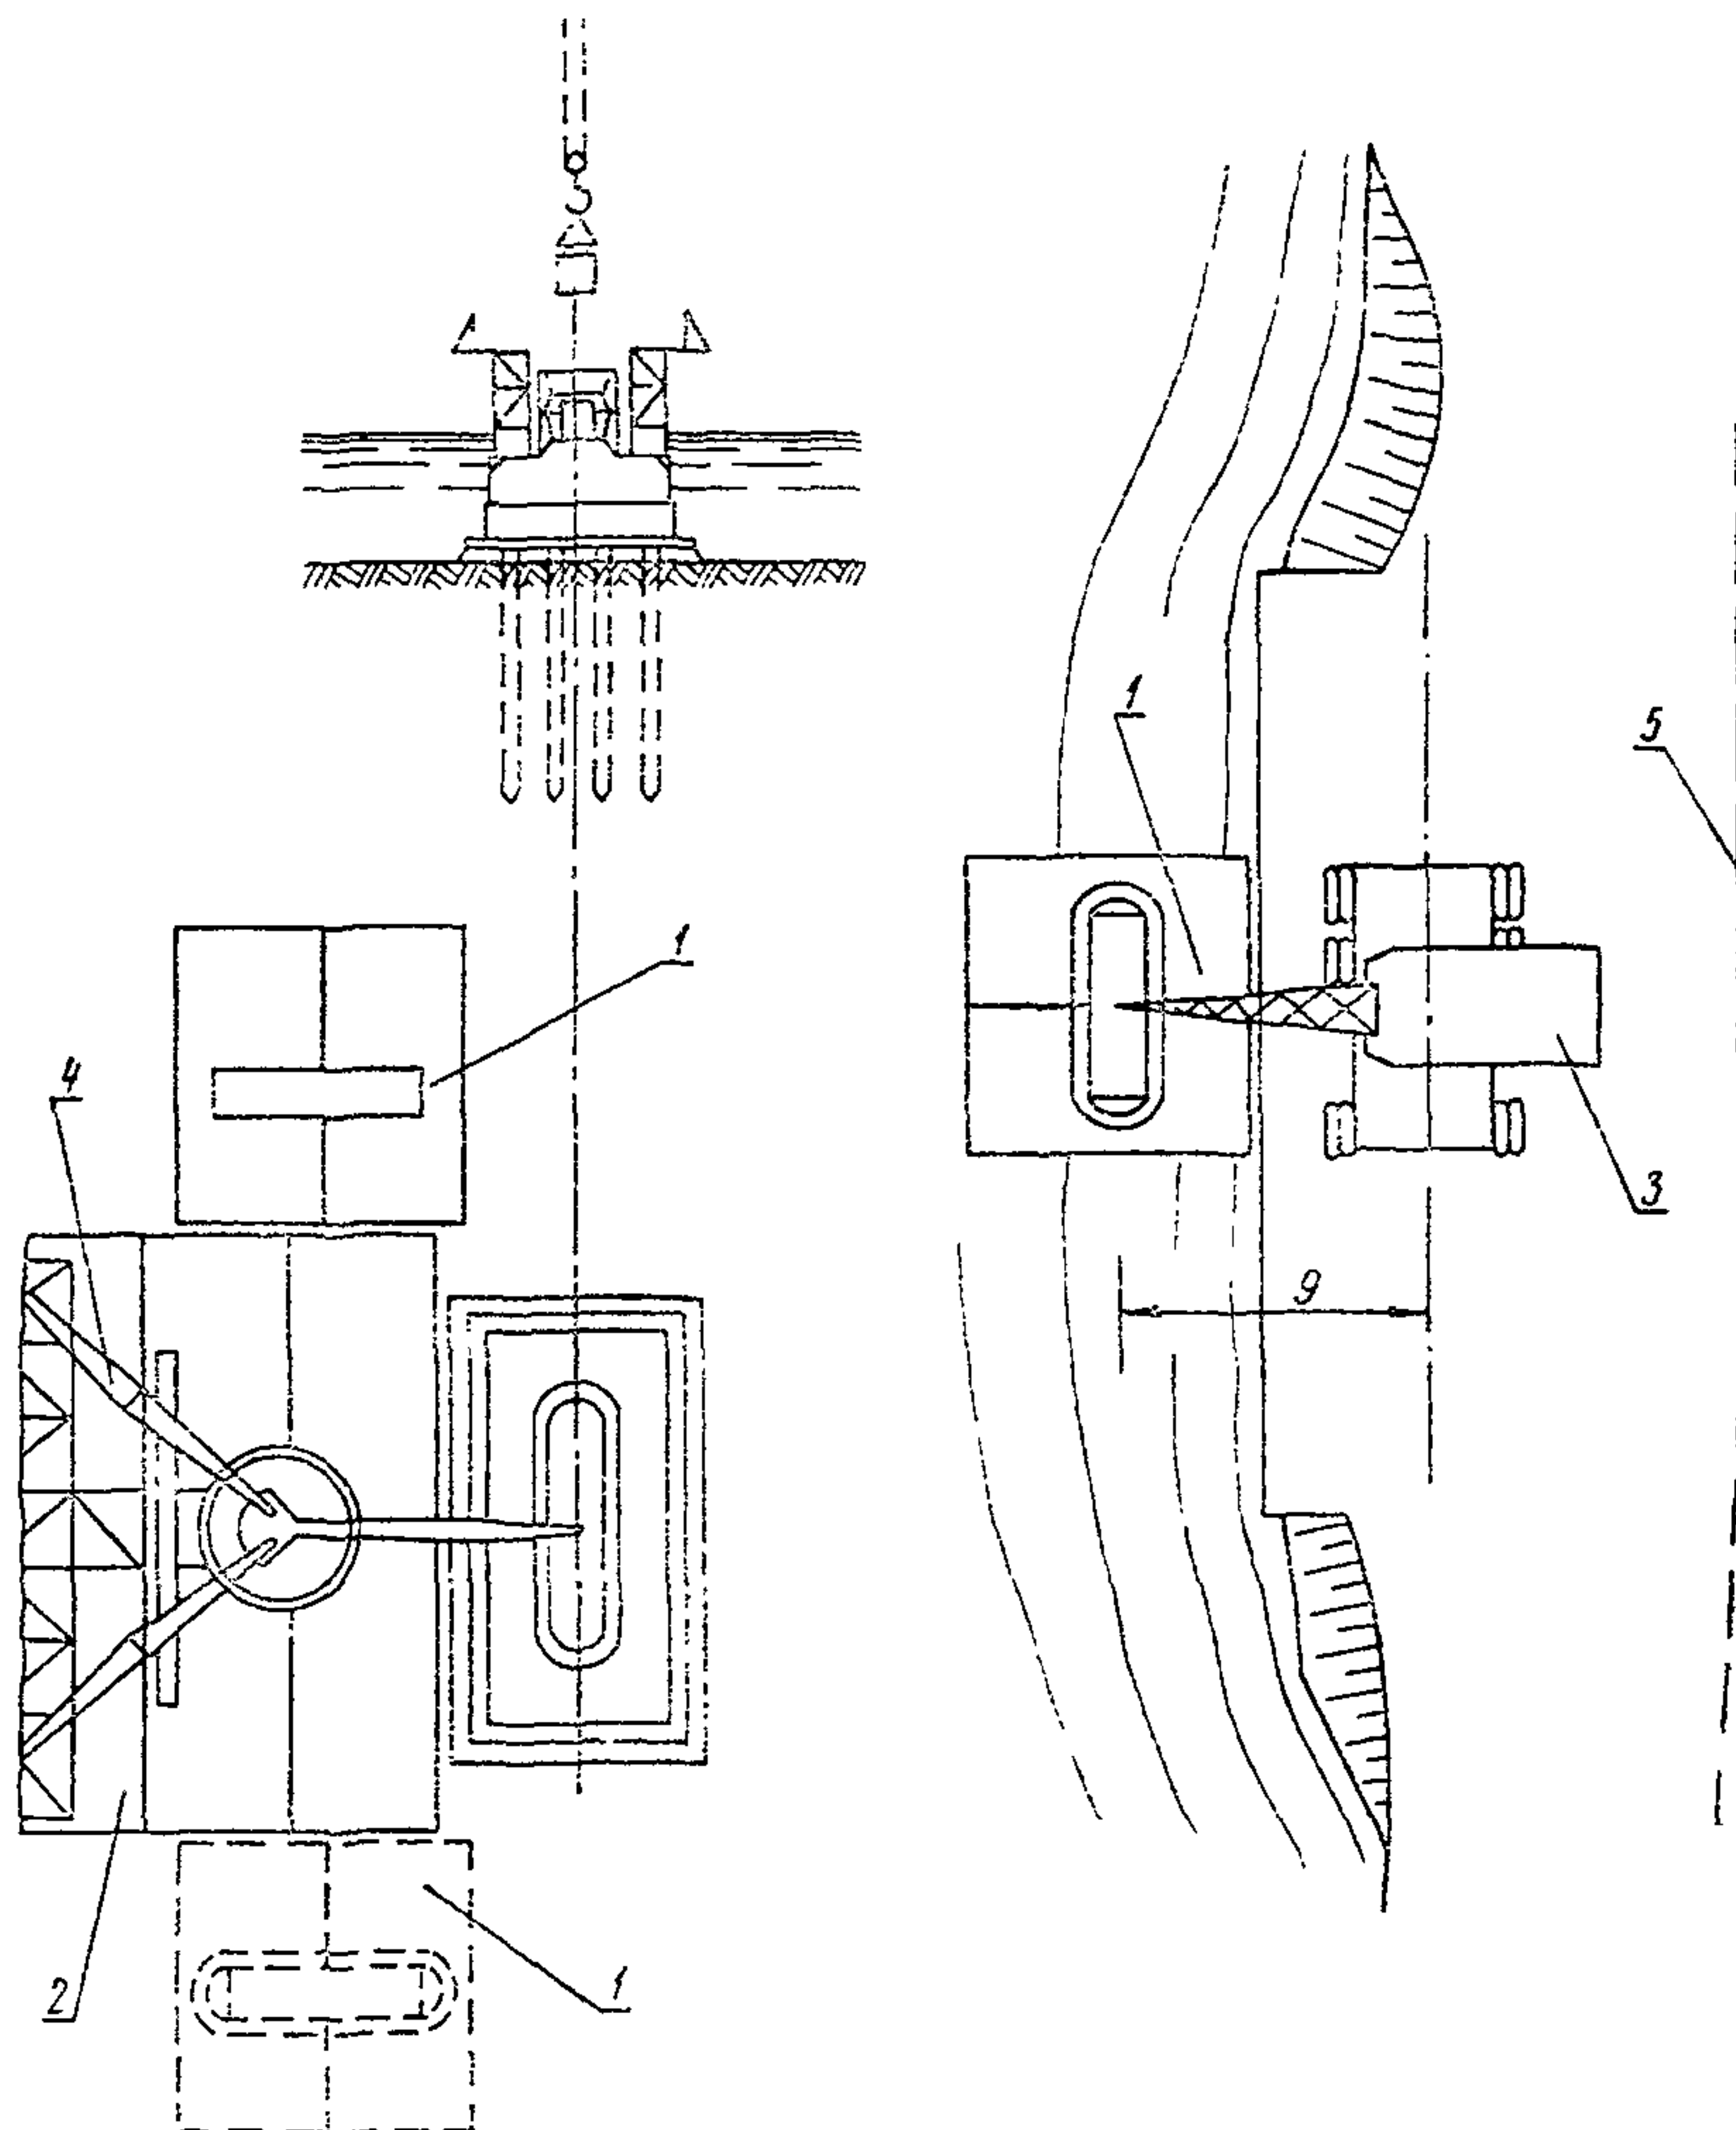


Рис. 5. Схема организации работ по сооружению опоры на воде:
1—плашкоут из двух понтонов; 2—плашкоут из 10 понтонов; 3—кран К-252; 4—
кран ГМК-12/20; 5—путь для перегрузки элементов «с колес»

Калькуляция № 3. Монтаж опоры (при блочном заполнении), сооружаемой на воде

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб —коп	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб —коп.
1	Калькуляция № 1		Работы, предусмотренные калькуляцией (с исключением затрат на приготовление рас- твора), п. 25	опора	1			310,77	183—88
				»	1			32,96	24—84
2	Местная норма МСП-450	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1 Машинист крана 6 разр.—1	Погрузка элементов инвен- тарных подмостей на плаш- коут с отправкой к месту мон- тажа	т	5,5	0,5	0—29,5	2,75	1—62
				»	5,5	0,25	0—19,7	1,37	1—08
3	Местная норма МСП-450	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1 Машинист крана 6 разр.—1	Погрузка блоков на плаш- коуты стреловым краном	блок	21	1,18	0—69,6	24,78	14—62
				»	21	0,59	0—46,7	12,39	9—81
4	Местная норма МСП-450	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1 Машинист крана 6 разр.—1	Погрузка бетона в бадьях на плашкоут стреловым кра- ном с приемом бетона из са- мосвала в бадью	м³	24,20	0,64	0—37,7	15,49	9—12
				»	24,20	0,32	0—25,3	7,74	6—12

Продолжение

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб — коп	Норма- тивное время на полный объем работ, чел ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб — коп
27	Местная норма МСП-414	Плотники 4 разр — 1 3 » — 1	Разборка опалубки со сты- ков омоноличивания	стык	5	1,78	1—05	8,90	5—25
28	ЕНиР, § 5—1—3, № 116	Монтажники конструкций 4 разр — 2 3 » — 1	Устройство временных перил на насадке	пог м	23	0,175	0—10,5	4,03	2—41
Итого на одну опору									
для монтажников кон- струкций				чел-ч				331,22	195—52
то же				чел-дн				41,4	
для машиниста крана				чел-ч				43,34	31—95
то же				чел-дн				5,41	

Основные правила техники безопасности при сооружении сборных опор

Железобетонные столбы опоры должны быть оборудованы инвентарными подвесными люльками для монтажных работ и освобождения стропов, а также для закрепления или сварки узлов при установке капителей и насадок.

Запрещается снятие стропов при установке столбов до их закрепления (приварки закладных частей или стержней длиной шва по 150 мм, в четырех местах равномерно распределенным швом по периметру основания оболочки).

При монтаже блоков-насадок необходимо их временно закреплять проволочными скрутками и деревянными подкосами.

Электросварочные работы должны ограждаться легкими переносными ширмами.

Разрешается производить точную центровку элемента при зазоре между нижней поверхностью элемента и местом установки не более 10 см.

Рабочие, прибывшие для монтажа опоры, перед началом работы должны пройти инструктаж по технике безопасности.

Для подвода электрической энергии к передвижным электрифицированным машинам, механизмам и установкам должны применяться специальные гибкие кабели (марки ГРШС, КРПТ и др.) со специальной жилой для заземления.

Корпус электроинструмента должен быть заземлен. Работа с ручными электроинструментами без заземления корпусов специальным проводом не допускается. Нельзя работать указанным инструментом во время дождя, грозы и при ее приближении.

При работах на воде и над водой непосредственно у места работ должны находиться спасательные шлюпки. Указания о количестве и назначении спасательных шлюпок даются руководством строительства.

Спасательные шлюпки должны использоваться только по прямому назначению. Стоянку шлюпок назначают в непосредственной близости от места работ, в удобном для отчаливания месте; закрепляют шлюпку так, чтобы можно было быстро ее освободить.

Все ответственные работы—монтаж контурных блоков, монтаж насадок—должны производиться при непосредственном участии производителя работ или мастера.

При сооружении опор мостов следует руководствоваться следующими документами:

СНиП III-Д.2-62 «Мосты и трубы. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию».

СНиП III-В.1-62. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные, общие правила производства и приемки работ».

СНиП III-А.11-70. «Техника безопасности в строительстве».

Правила техники безопасности и производственной санитарии при сооружении мостов и труб».

Типовой проект № 3-503-2 «Опоры из сборного железобетона и бетона под унифицированные пролетные строения длиной до 42 м для мостов и путепроводов на автомобильных дорогах». Союздорпроект, инв. № 443/1, 1964 г.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по сооружению опоры на суше выполняются в две смены двумя комплексными бригадами по семь человек, работающими по одному аккордно-премиальному наряду.

Состав каждой бригады:

монтажник конструкций 5 разр.—1 (M_1);

монтажники конструкций 4 разр.—3 (M_2, M_3, M_5);

монтажники конструкций 3 разр.—3 (M_4, M_6, M_7).

Сварочные работы при монтаже опоры должен выполнять электросварщик 5 разр. или монтажник конструкций 5 разр. с дипломом электросварщика.

Для обслуживания механизмов при монтаже опор привлекаются: машинист крана 6 разр.—1; дежурный слесарь 4 разр.—1 и дежурный электромонтер 4 разр.—1.

Рабочие комплексной бригады распределяются на два звена:

Звено № 1	Звено № 2
5 разр.—1 (M_1)	4 разр.—1 (M_5)
4 » —2 (M_2, M_3)	3 » —2 (M_6, M_7)
3 » —1 (M_4)	

Звено № 1 выполняет монтаж контурных блоков и блоков заполнения, монтаж столбчатой надстройки, укладку бетона в тело опоры и разборку опалубки стыков моноличивания.

Монтажники конструкций звена № 1 должны владеть вторыми профессиями:

бетонщика 4 разр.—двое;

бетонщика 3 разр.—двое;

электросварщика 6 разр.—один.

Звено № 2 выполняет монтаж металлических подмостей конопатку и расшивку швов, приготовление раствора, установку арматуры и разборку металлических подмостей.

Монтажники конструкций звена № 2 должны владеть вторыми профессиями:

бетонщика 4 разр.—один;

бетонщика 3 разр.—один;

бетонщика 2 разр.—один;

арматурщика 4 разр.—один;

арматурщика 3 разр.—один.

21	ЕНиР, § 4—4—16, № 3	Бетонщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1	Укладка бетонной смеси при омоноличивании насадки с устройством слива (бетон 0,65 м³, раствор 0,6 м³)	м³	1,25	3,0	1—83	3,75	2—28
				»	1,25	0,75	0—52,7	0,94	0—66
22	Местная норма МСП-414	Бетонщики: 4 разр.—1 3 » —1	Расшивка горизонтальных швов с очисткой их от рас- твора	пог. м	88,2	0,35	0—20,6	30,87	18—17
23	ЕНиР, § 6—1—28, № 16	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —2 2 » —1	Сборка инвентарных метал- лических подмостей	м² проекции на стену	168	0,24	0—13,4	40,32	22—51
24	ЕНиР, § 6—1—28, № 26	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —2 2 » —1	Разборка инвентарных ме- таллических подмостей	То же	168	0,135	0—07,5	22,68	12,60
25	ЕНиР, § 13—18, № 1, № 4	Бетонщики: 3 разр.—1 2 » —1	Приготовление цементного раствора	л³	2,14	1,35	0—68,5	2,89	1—47
26	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Разборка круглых инвентар- ных металлических подмостей	шт	2	4,3	2—59	8,60	5—18
				»	2	0,86	0—67,9	1,72	1—36

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб.—коп.	Норматив- ное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб —коп.
5	ЕНиР, § 4—2—21, № 32	Бетонщик 3 разр.—1 Машинист крана 5 разр.—1	Укладка бутового камня (изюма) непосредственно из бадьи в свежееуложенный бе- тон	м³	10	0,80	0—44,4	8,00	4—44
				»	10	0,80	0—56	8,00	5—60
6	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в сты- ках блоков прокладника ПС-2 и столбов с прокладником	кг	21,5	0,06	0—04	1,29	0—86
7	ЕНиР, § 4—4—9, № 5	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка блоков проклад- ника ПС-2 весом 9,1 т	блок	2	5,8	3—53	11,60	7—06
				»	2	1,45	1—15	2,90	2—30
8	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка круглых инвен- тарных металлических подмос- тей с установкой лестниц для соединения капителей со стол- бом	шт.	2	8,9	5—42,2	17,80	10—84
				»	2	1,4	1—10,6	2,80	2—21

V. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА

Калькуляция № 1. Монтаж опоры (при блочном заполнении), сооружаемой на суше

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб — коп.	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп.
1	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Монтаж контурных блоков Т-3 весом 9,3 т насухо	блок	6	3,4	1—61	20,40	9—66
				»	6	0,85	0—67,2	5,10	4—03
2	ЕНиР, § 4—4—7, № 2а	Монтажники конструкций: 4 разр —2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Монтаж контурных блоков Т-4 весом 4,5 т насухо	»	1	1,84	1—09	1,84	1—09
				»	1	0,46	0—36,3	0,46	0—36
3	ЕНиР, § 4—4—8	Монтажники конструкций: 4 разр —2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка блоков заполне- ния 3-2 весом 9,5 т	»	6	1,28	0—75,5	7,68	4—53
				»	6	0,32	0—25,3	1,92	1—52

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб — коп	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп.
4	ЕНиР, § 4—4—1	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1	Конопатка горизонтальных швов	пог. м	88,2	0,15	0—08,9	13,23	7—85
5	ЕНиР, § 4—4—16	Бетонщики: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1	Укладка бетонной смеси в сборные конструкции опор	м³	24,20	1,24	0—73,2	30,01	17—71
				»	24,20	0,31	0—21,8	7,50	5—27
6	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в сты- ках блоков ПС-2 и столбов с прокладником	кг	21,5	0,06	0—04	1,29	0—86
7	ЕНиР, § 4—4—9, № 5	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка блоков проклад- ника ПС-2 весом 9,1 т	блок	2	5,8	3—53	11,60	7—06
				»	2	1,45	1—15	2,90	2—30
8	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2	Установка круглых инвен- тарных металлических подмос- тей с установкой лестниц для омоноличивания капителей со столбами	»	2	8,9	5—42,2	17,80	10—84

Калькуляция № 2. Монтаж опоры (при монолитном заполнении), сооружаемой на суше

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб.—коп.	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп
1	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Монтаж контурных блоков Т-3 весом 9,3 т насухо	блок	6	3,4	1—61	20,40	9—66
				»	6	0,85	0—67,2	5,10	4—03
2	ЕНиР, § 4—4—7, № 2а	Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Монтаж блоков Т-4 весом 4,5 т насухо	»	1	1,84	1—09	1,84	1—09
				»	1	0,46	0—36,3	0,46	0—36
3	ЕНиР, § 4—4—15	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —1	Конопатка горизонтальных швов	пог. м	88,2	0,15	0—08,9	13,23	7—85
4	ЕНиР, § 4—4—16 № 1	Бетонщики: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1	Укладка бетонной смеси в сборные конструкции опор	м³	38,08	1,24	0—73,2	42,22	27—87
				»	38,08	0,31	0—21,8	11,80	8—30

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб — коп.	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп.
26	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Разборка круглых инвентар- ных металлических подмостей	шт	2	4,3	2—59	8,60	5—18
				»	2	0,86	0—67,9	1,72	1—36
27	Местная норма МСП-414	Плотники: 4 разр.—1 3 » —1	Разборка опалубки со сты- ков омоноличивания	стык	5	1,78	1—05	8,90	5—25
28	ЕНиР, § 5—1—3, № 116	Монтажники конструкций: 4 разр —2 3 » —1	Устройство временных перил на насадке	пог. м	23	0,175	0—10,5	4,00	2—31
Итого на 1 опору:				чел-ч				313,66	185—35
для монтажников кон- струкций				чел-дн				39,21	
то же				чел-ч				32,96	24—84
для машиниста крана				чел-дн				4,12	
то же									

		Машинист крана 6 разр.—1		»	2	1,4	1—10,6	2,80	2—21
9	Местная норма МСП-414	Монтажники конструкций: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка железобетонных столбов С-3 диаметром 1 м весом 3,3 т в проектное поло- жение и закрепление с по- мощью электросварки	»	2	6,7	4—08	13,40	8—16
				»	2	1,7	1—10,6	3,40	2—21
10	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в сты- ках блоков прокладника со столбами С-3	кг	107,6	0,06	0—04	6—46	4—30
11	ЕНиР, § 4—4—27, № 2	Электро- сварщик 5 разр.—1 Монтажник конструкций 3 разр.—1	Сварка стержней в стыках столбов с прокладником дли- ной шва 200 мм (швы верти- кальные)	100 стыков	0,64	9,7	6—10	6,21	3—90
12	Местная норма МСП-414	Плотники: 5 разр.—1 4 » —2	Установка опалубки при со- пряжении прокладника со столбами и блоков прокладни- ка между собой	стык	3	2,4	1—56	7,20	4—68
13	ЕНиР, § 4—4—13, № 1	Бетонщики: 4 разр.—1 3 » —1	Омоноличивание столбов с прокладником и блоков про- кладника между собой	»	3	1,85	1—09	5,55	3—27
14	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в сты- ках столбов и капителей	кг	34,9	0,06	0—04	2,09	1—40

№ пп	Шифр норм	Состав звена	Описание работ	Единица измере- ния	Объем работ	Норма времени	Расценка, руб.—коп	Норма- тивное время на полный объем работ, чел-ч	Стоимость затрат труда на полный объем работ, руб.—коп.
15	ЕНиР, § 4—4—9, № 9	Монтажники конструкций: 4 разр.—2 3 » —2 Машинист крана 6 разр.—1	Установка блоков-капителей К-2 весом 2 т с закреплением электросваркой	блок	2	2,44	1—44	4,88	2—88
				»	2	0,61	0—48,2	1,22	0—96
16	ЕНиР, § 4—4—27, № 2	Электро- сварщик 5 разр.—1 Монтажник конструкций 3 разр.—1	Сварка стержней в стыках столбов и капителей	100 стыков	0,64	9,7	6—10	6,21	3—90
17	ЕНиР, § 4—4—13, № 3	Бетонщики: 4 разр.—2 3 » —2	Омоноличивание стыков столбов с капителями	стык	2	1,2	0—70,8	2,40	1—42
18	ЕНиР, § 4—4—12, Т-2, № 3	Монтажники конструкций: 6 разр.—1 5 » —1 4 » —3 Машинист крана 6 разр.—1	Установка блоков насадки Н-42-С-9 весом 13,6 и 15,2 т	блок	2	12,5	8—42	25,0	16—84
				»	2	2,5	1—98	5	3—96

19	ЕНиР, § 4—4—28, № 4	Арматурщики: 5 разр.—1 3 » —1	Установка арматуры в сты- ках насадки	кг	95	0,06	0—04	5,70	3—80
20	Местная норма МСП-414	Плотники: 4 разр.—1 3 » —1	Установка опалубки про- дольного шва насадки То же тумб	пог. м	13	0,185	0—09,7	2,40	1—26
				шт.	2	0,15	0—08	0,30	0—16
21	ЕНиР, § 4—4—16, № 3	Бетонщики: 5 разр.—1 4 » —1 3 » —2 Машинист крана 5 разр.—1	Укладка бетонной смеси при омоноличивании насадки с устройством слива (бетон 0,65 м ³ , раствор 0,6 м ³)	м ³	1,25	3,0	1—83	3,75	2—28
				»	1,25	0,75	0—52,7	0,94	0—66
22	Местная норма МСП-414	Бетонщики: 4 разр.—1 3 » —1	Расшивка горизонтальных швов с расчисткой их от рас- твора	пог. м	88,2	0,35	0—20,6	30,87	18—17
23	ЕНиР, § 6—1—28, № 16	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —2 2 » —1	Сборка инвентарных метал- лических подмостей	м ² про- екций на стену	168	0,24	0—13,4	40,32	22—51
24	ЕНиР, § 6—1—28, № 26	Монтажники конструкций: 4 разр.—1 3 » —2 2 » —1	Разборка инвентарных ме- таллических подмостей	То же	168	0,135	0—07,5	22,68	12—60
25	ЕНиР, § 13—18, § 1+4	Бетонщики: 3 разр.—1 2 » —1	Приготовление цементного раствора	м ³	2,14	1,35	0—68,5	2,89	1—47

График № 2. Сооружение опоры при монолитном заполнении ядра

№ п/п	Наименование операций	Единица измерения	Объем работ	Трудоемкость чел-ч	Состав звеньев бригады	РАБОЧИЕ СМЕНИ									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сооружение опоры на суше														
2.	Монтаж контурных блоков Т-3 весом 9,3 т	шт	6	20,0 5,6											
3.	Монтаж контурных блоков Т-4 весом 4,5 т		1	1,6 0,4											
4.	Монопатка горизонтальных швов опоры	пог.м	88,2	12,7											
5.	Укладка бетонной смеси в тело опоры	м³	48,08	53,2 13,4											
6.	Установка арматуры в стыки монолитизация	кг	257	15,0											
7.	Установка блоков прокладника ПС-2 весом 9,1 т	шт	2	11,2 2,8											
8.	Установка металлических подмостей на столбы	"	2	17,2 4,3											
9.	Установка столбов диаметром 1 м	"	2	12,8 3,2											
10.	Сварка стержней в стыках соединений	"	128	11,7	Звено № 1 Монтажники конструкции 5 разр.-I (М ₁) 4 разр.-II (М ₂) 3 " -I (М ₃)										
11.	Установка опалубки в стыках соединений	стык	3	7,0	Звено № 2 Монтажники конструкции 4 разр.-I (М ₄) 3 " -II (М ₅)										
12.	Омоноличивание столбов с прокладником и капителями	"	5	7,5											
13.	Установка блоков насадки К-2 весом 2 т	шт	2	4,8 1,2											
14.	Установка блоков насадки весом 13,6 и 15,2 т	"	2	24,0 6,0	Машинист крана Бразр.-I (К ₁)										
15.	Установка опалубки продольного для насадки и тумбы	м/шт	13/2	2,5											
16.	Омоноличивание блоков насадки с устройством слива	м³	1,25	3,5 0,9											
17.	Расшивка швов с приготовлением раствора	пог.м	83,2	30,0											
18.	Укрупнительная сборка элементов инвентарных подмостей	м²	168	21,5											
19.	Установка инвентарных подмостей	"	168	7,0											
20.	Разборка инвентарных подмостей	"	168	21,5											
21.	Снятие опалубки со стыков омоноличивания и подмостей со столбов	стык/шт	5/2	16,7 0,8											
22.	Устройство временных перил на насадке	пог.м	23	3,6											
23.	Дополнительные работы, выполняемые при сооружении опоры на воде														
24.	Погрузка элементов инвентарных подмостей на плашкоуты и подача их к месту монтажа	т	5,5	2,6 1,3											
25.	Погрузка блоков на плашкоуты краном К-252	шт	15	17,0 8,5											
26.	Погрузка бетона в бадах на плашкоуты с приемом его из самосвала	м³	40,22	24,4 12,2											
27.	Погрузка бутового камня в бадах на плашкоуты с приемом его из самосвала	т	16,0	1,0 3,6	Звено № 3 Монтажники конструкции 3 разр.-I (М ₆) 2 " -II (М ₇)										
28.	Приготовление раствора с подачей к месту укладки	м³	2,14	2,6											
29.	Прочие работы (подготовка блоков к монтажу)	чел-ч		32,8 16,4	Машинист крана Бразр.-I (К ₂)										
Итого: при сооружении опоры на суше (п.п.1-21)		чел-ч		315,1 38,0											
при сооружении опоры на воде (п.п.22-29)		чел-дн.		39,4 4,75											
		чел-ч		401,7 79,9											
		чел-дн.		50,2 10,0											

Примечание: 1. В графе "трудоемкость" в числителе приведенны затраты труда звена без учета работы механизмов, в знаменателе - затраты труда машинистов кранов.

2. При сооружении опоры на суше для монтажа блоков применяется кран К-252, при сооружении опоры на воде - кран ГМК-12/20, установленный на плашкоуте.

Условные обозначения: Монтажники конструкций

Звено № 1

Звено № 2

Звено № 3

Машинист крана

Примечание: 1. В графе "трудоемкость" в числителе приведены затраты труда звена без учета работы механизмов, в знаменателе - затраты труда машинистов кранов.
2. При сооружении опоры на суше для монтажа блоков применяется кран К-252, при сооружении опоры на воде - кран ГМК-12/20, установленный на плашкоуте.

Условные обозначения: Монтажные конструкции
Звено № 1
Звено № 2
Звено № 3
Машинист крана

График № 1. Монтаж опоры при блочном заполнении ядра

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Трудоемкость чел-ч	Средняя стоимость 1 чел-ч
1.	Монтаж контурных блоков Т-3 весом 2,3 т	шт	6	40,0	6,7
2.	Монтаж контурных блоков Т-4 весом 4,5 т	шт	1	1,6	1,6
3.	Монтаж блоков закладных для заливки бетона	шт	6	7,2	1,2
4.	Установка горизонтальных швов	пог м	88,2	12,7	1,4
5.	Укладка бетонной смеси в тело опоры	м³	24,2	28,4	1,2
6.	Установка арматуры в стыках соединений	шт	257	15,0	0,06
7.	Установка блоков подкладочных К-2 весом 2 т	шт	2	11,2	5,6
8.	Установка металлических подмостей при монтаже столбов	шт	2	17,2	8,6
9.	Установка столбов диаметром 1 м	шт	2	12,8	6,4
10.	Сварка стержней в стыках соединений	шт	128	11,7	0,09
11.	Установка оголовки для оголовок	шт	3	7,0	2,3
12.	Оголовок оголовки с то-кладками и капитальными	шт	5	7,5	1,5
13.	Установка оголовки капитальной К-2 весом 2 т	шт	2	4,8	2,4
14.	Установка оголовки насадки Т-1-39 весом оголка 13,6 и 10,2	шт	2	24,0	12,0
15.	Установка оголовки продольного шва насадки и т.п.	шт	13/2	2,0	0,15
16.	Оголовок оголовки насадки с устройством с лива	шт	1,25	3,6	2,9
17.	Расшивка швов с приготовлением раствора	пог м	88,2	30,0	0,34
18.	Ударная обработка элементов инвентарных подмостей	шт	168	31,5	0,19
19.	Установка инвентарных подмостей	шт	168	7,0	0,04
20.	Разборка инвентарных подмостей	шт	168	21,5	0,13
21.	Снятие оголовки с стыков оголовок и подмостей со столбов	шт	2	16,2	8,1
22.	Устройство верхних террас насадки	пог м	23	3,6	0,16
23.	Дополнительные работы, выполняемые при сооружении опоры на воде	шт	5	2,0	0,4
24.	Погрузка элементов на площадку и подача их к месту монтажа	шт	21	24,0	1,14
25.	Погрузка бетона в бочки на площадке, приготовление раствора с подачей к месту укладки	шт	24,2	17,7	0,73
26.	Прочие работы (подготовка блоков к монтажу)	шт	38,4	38,4	1,0
Итого по сооружению опоры на суше (п.п. 1-22)				297,0	4,5
при сооружении опоры на воде п.п. 23-25				379,7	1,5
Итого				676,7	1,0

Звено № 1.
Монтажные конструкции
5 разб.-1 (M₁)
4 " -2 (M₂, M₃)
3 " -1 (M₄)

Звено № 2
Монтажные конструкции
4 разб.-1 (M₅)
3 " -2 (M₆, M₇)

Машинист крана
6 разб.-1 (M₈)

Звено № 3
Монтажные конструкции
4 разб.-1 (M₉)
3 " -1 (M₁₀)
Машинист крана
6 разб.-1 (M₁₁)

В этих трудоемкости в числителе приведены затраты труда звена без учета работы механизмов, в знаменателе - затраты труда машинистов кранов.

При сооружении опоры на суше для монтажа блоков применяется кран К-252, при сооружении опоры на воде - кран ГМХ-12/20, установленный на площадке.

Условные обозначения Монтажных

Звено № 1

Звено № 2

Звено № 3

Машинист крана
