

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

**КОЛОННЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ**

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения

СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011

Издание официальное

Открытое акционерное общество
«Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный
институт промышленных зданий и сооружений»

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «БСТ»

Москва 2011

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН	ОАО «ЦНИИПромзданий»
2. ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ	Комитетом по промышленному строительству протокол от 23.12.2011 № 15
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 30.12.2011 № 24
4. ВВЕДЕН	ВПЕРВЫЕ

© Национальное объединение строителей, 2011

*Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии
с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных
Национальным объединением строителей*

Содержание

Введение.....	IV
1. Область применения.....	1
2. Нормативные ссылки.....	1
3. Термины и определения.....	3
4. Общие положения.....	4
5. Входной контроль.....	5
6. Транспортирование и хранение.....	8
7. Монтаж колонн.....	11
8. Сдача-приемка монтажных работ и контроль качества их выполнения.....	15
9. Демонтаж колонн.....	16
10. Консервация объекта при временном прекращении монтажных работ.....	17
11. Правила безопасного выполнения работ при монтаже колонн.....	18
Приложение А (справочное) Примеры распространенных дефектов колонн массового применения.....	20
Приложение Б (рекомендуемое) Выбор кранов для монтажа колонн.....	35
Приложение В (рекомендуемое) Строповочные приспособления для монтажа колонн.....	39
Приложение Г(рекомендуемое) Устройства для временного закрепления и выверки колонн.....	44
Приложение Д (справочное) Номенклатура колонн массового применения.....	50
Библиография.....	63

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2012 годы и направлен на реализацию «Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Целью разработки стандарта является конкретизация общих положений СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» и СП 70.13330.2011 «СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции» применительно к монтажу сборных железобетонных колонн многоэтажных зданий.

При разработке стандарта использованы действующие нормативные документы, наработки и опыт применения современных зарубежных и отечественных технологий (Кодыш Э.Н. «Учет влияния работы железобетонных конструкций в стадии монтажа на эксплуатационный период», Киреев А.Д. «Технология возведения зданий и специальных сооружений»), а также опыт и наработки авторов стандарта.

Авторский коллектив: канд. техн. наук Келасьев Н.Г., докт. техн. наук, проф. Трекин Н.Н., докт. техн. наук, проф. Кодыш Э.Н., Гузь И.В (ОАО «ЦНИИПромзданий»); канд. техн. наук, проф. Гончаров А.А (МГСУ).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

**КОЛОННЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ**

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения

Columns national teams ferro-concrete many-storeyed buildings

Technical requirements to installation and control of their performance

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные колонны многоэтажных зданий.

1.2 Стандарт устанавливает основные нормы и правила входного контроля, транспортирования, складирования, монтажа, сдачи-приемки монтажных и демонтажных работ при возведении зданий и сооружений различного назначения, а так же контроля качества их выполнения и консервации конструкций при временном прекращении монтажных работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности бетона

ГОСТ 18105-2010* Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия

ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

* Вводится в действие на территории Российской Федерации с 01.09.2012 вместо ГОСТ Р 53231-2008

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»

СП 70.13330.2011 «СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции»

СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения

Примечания – При пользовании настоящим стандартом следует проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.7.55, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 колонна: Архитектурно обработанная вертикальная опора поддерживающая балку, балочное перекрытие или пята арки.

Примечание - Колонны обычно круглого или прямоугольного сечения.

4 Общие положения

4.1 Колонны, применяемые при возведении многоэтажных зданий, должны соответствовать проекту конкретного здания и отвечать требованиям ГОСТ 18979.

4.2 Колонны подразделяют на типы в зависимости:

– от числа этажей в пределах высоты колонны:

1 – одноэтажные;

2 – двухэтажные;

3 – трехэтажные;

– от расположения колонны в каркасе здания по высоте:

КВ – верхние;

КС – средние;

КН – нижние;

КБ – на всю высоту здания (бесстыковые);

– от числа консолей в пределах этажа:

О – одноконсольные (крайние);

Д – двухконсольные (средние).

4.3 Работы по монтажу колонн, консервации и демонтажу, начиная с входного контроля материалов и заканчивая сдачей-приемкой здания в целом или его отдельных частей, следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.4 Оформление исполнительной документации при производстве работ необходимо осуществлять в соответствии с РД-11-02-2006 [1] и РД-11-05-2007 [2].

5 Входной контроль

5.1 При поступлении колонн на строительную площадку необходимо выполнить следующие операции входного контроля:

- проверку наличия сопроводительного документа о качестве изделий и их соответствии заданному типу (марке) – ГОСТ 18979 (серия 1.420-12 [3], серия 1.020-1/87 [4], серия 1.420-6 [5]).

- проверку наличия маркировки и штампа ОТК на изделиях в соответствии с ГОСТ 13015 и их соответствие с данными, указанными в сопроводительном документе;

- предварительное визуальное обследование изделий для установления отсутствия недопустимых дефектов и повреждений (трещин, сколов, наплывов бетона и др. приведенных в приложении А) и наличия выпусков арматурных стержней для стыковки с ригелями и колоннами.

5.2 После разгрузки колонн должны быть выполнены сплошной визуальный контроль и выборочные инструментальные измерения по определению геометрических параметров колонн, правильности нанесения установочных рисок, качеству поверхностей, наличию трещин раскрытием более 0,1 мм, прочности бетона колонн.

5.2.1 Измерения по определению геометрических параметров, качества поверхностей, наличия трещин и прочности бетона колонн должны проводиться не менее чем на 10 % конструкций, но не менее трех.

5.2.2 Значения фактических отклонений геометрических параметров колонн, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать допустимых отклонений, приведенных, приведенных в таблице 1

5.2.3 Требования к качеству поверхностей и внешнему виду колонн (в том числе требования к допустимой ширине раскрытия поверхностных технологических трещин) проверяют в соответствии с указаниями ГОСТ 13015 и представлены в таблице .2. При этом качество боковых поверхностей

В миллиметрах

[illegible]

5.2.4 Правила выбора средств измерений и выполнения измерений для контроля параметров, указанных в 5.3 и 5.4, установлены в ГОСТ 26433.0; ГОСТ 26433.1; ГОСТ 26433.2.

Таблица 2

В миллиметрах

Характеристика бетонной поверхности	Категория	Диаметр раковин, мм	Высота (глубина) наплыва (впадин), мм	Глубина сколов, мм	Длина сколов в мм на 1 м ребра
Предназначенная под окраску, выходящая внутрь жилых и общественных зданий	A2	1	1	5	50
То же, выходящая внутрь производственных и вспомогательных зданий	A3	4	2	5	50
Лицевые неотделяемые	A6	15	5	10	100
Нелицевые, видимые в условиях эксплуатации	A7	20	-	20	-

5.2.5 Выборочный контроль прочности бетона колонны следует выполнять по ГОСТ 18105 определением класса бетона по прочности на сжатие.

5.2.5.1 Прочность бетона колонны должна соответствовать отпускной, установленной в зависимости от наличия предварительно напряженной арматуры и времени года, но не менее 70 % от проектного значения в тёплое время года и не менее 85 % в зимний период.

5.2.5.2 Контроль прочности бетона выполняют с использованием метода упругого отскока (склерометры), метода ударного импульса и метода скалывания ребра по ГОСТ 22690 или ультразвукового метода по ГОСТ 17624.

5.2.5.3 В колонне с наименьшими значениями прочности бетона, близкими к проектному или ниже проектного значения, используют дополнительно метод отрыва со скалыванием по ГОСТ 28570.

Примечание – Могут применяться другие методики определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием, например, по СТО 02495307-005-2008 [6].

Класс бетона по прочности на сжатие вычисляют с учетом действительного среднего квадратического отклонения σ , полученного по результатам не менее 6 измерений, выполненных в одном изделии.

5.3 Поставленные на монтаж колонны не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях;
- трещин на внешней поверхности колонн, за исключением местных поверхностных усадочных раскрытием не более 0,1 мм;
- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных деталей, выпусках арматуры и монтажных петлях.

5.4 При обнаружении недопустимых дефектов или отклонений, превышающих установленные допуски составляется акт с участием представителя завода изготовителя, строительной организации, автора проекта и представителя проектной организации (наиболее распространенные дефекты приведены в приложении А).

Решение о возможности использования колонны (партии колонн), при условии выполнения необходимого ремонта (усиления) принимается после проведения обследования для проверки соответствия требованиям ГОСТ 18979.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование и хранение колонн должно осуществляться в горизонтальном положении в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 13015.

Выбор транспортных средств производят на стадии разработки ППР с учетом массы и размеров колонн, дальности перевозки, дорожных условий и уточняют расчетом места расположения прокладок.

6.2 Доставка колонн на строительную площадку осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом. При доставке железнодорожным транспортом разгрузку изделий производят на прирельсовый склад, где осуществляется первичный входной контроль и сортировка колонн по маркам с последующей подачей (по потребности) на приобъектный склад.

6.3 При перевозке железнодорожными платформами колонны размещают в 3 – 4 ряда по высоте. Горизонтальные прокладки между рядами располагают от торцов на расстоянии $1/4 - 1/5$ длины колонны. Крепление производится при помощи стоек, скрепленных с нижним и верхним поперечными брусками. Нижний брусок, кроме того, прибивают к полу платформы. Стойки закрепляют двумя парами растяжек из проволоки диаметром 6 мм в шесть нитей.

6.4 Автомобильный транспорт используют при перевозках на расстояния до 500 км. Для перевозки колонн используют специализированные автотранспортные средства.

Примечания

1 Наибольшее распространение получили автопоезда, состоящие из седельного тягача и специализированного полуприцепа.

2 По погрузочной высоте (расстояние от плоскости, по которой осуществляется опирание перевозимого груза, до уровня земли) полуприцепы подразделяются на три типа: высокорамные, погрузочная высота которых больше высоты расположения седельно-сцепного устройства и больше диаметра колес полуприцепа; низкорамные, погрузочная высота которых меньше высоты расположения седельно-сцепного устройства и меньше диаметра колес полуприцепа; полунизкорамные, погрузочная высота которых меньше высоты расположения седельно-сцепного устройства и больше диаметра колес полуприцепа.

Перевозку колонн на большие расстояния рекомендуется производить в специально смонтированных контейнерах. При их отсутствии крепление колонн производится при помощи специальных приспособлений (см. 6.3).

6.5 Колонны располагают на приобъектном складе.

6.6 При хранении колонн на приобъектном складе высота штабеля должна быть не более 2 м и при этом не должна превышать ширину штабеля более, чем в 2 раза, ширина прохода между рядами штабелей не менее 1 м.

Ширина прокладки назначается с учетом прочности древесины на смятие. Толщина прокладки должна обеспечивать наличие зазора от верха монтажной петли не менее 20 мм.

6.7 При транспортировании и хранении колонны должны укладываться на инвентарные подкладки из дерева как показано на рисунке 1, располагаемые в зонах строповки.

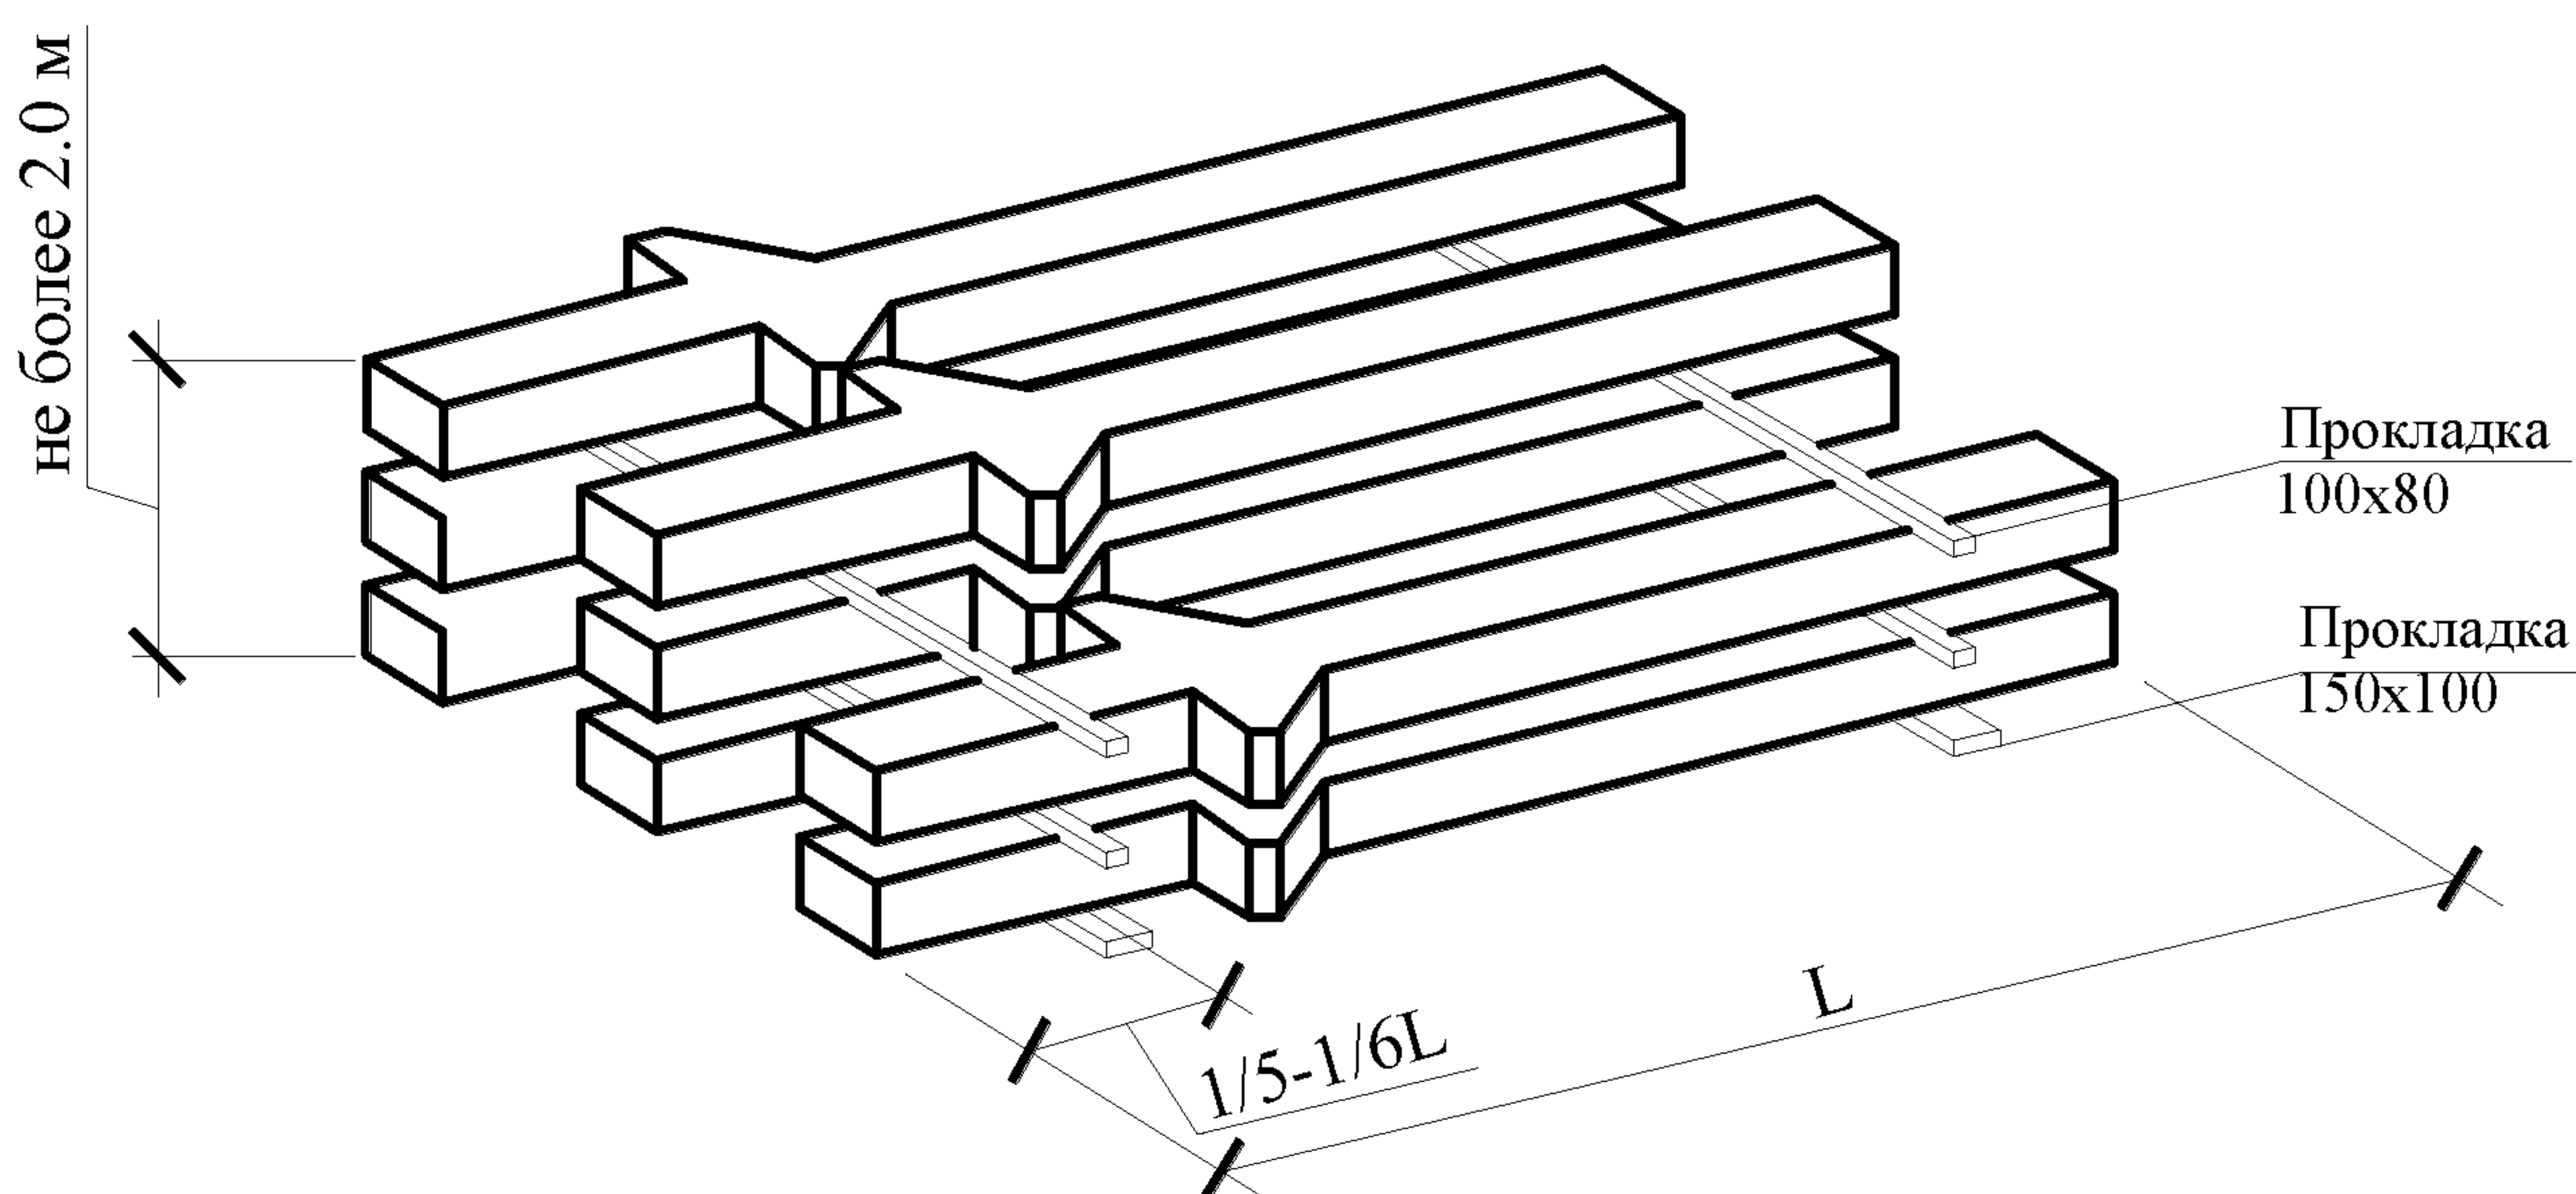


Рисунок 1 – Схема хранения колонн

6.8 Необходимый запас конструкций определяют в зависимости от производственной потребности, дальности перевозки и условий поступления конструкций. В промышленном строительстве запас времени между

поставкой и монтажом конструкций принимают до двух недель. При определении запаса конструкций учитывают также необходимость резерва на случай непредвиденных задержек в поставках и время, необходимое на комплектование конструкций.

7 Монтаж колонн

7.1 Монтаж железобетонных колонн многоэтажных зданий должен осуществляться с использованием башенных или самоходных стреловых монтажных кранов, грузоподъемность которых выбирается по наиболее тяжелому изделию и индивидуальной монтажной оснастки.

Выбор крана производится по методике, приведенной в приложении Б.

7.2 При отсутствии или ограниченных размерах стройплощадки (стесненные городские условия) монтаж конструкций может осуществляться непосредственно с транспортных средств – «с колес».

При этом необходимо:

- наличие проекта организации монтажных работ в условиях затрудняющих складирование монтируемых конструкций;
- разработка почасового графика поставки монтируемых конструкций на строящийся объект, увязанный с технологической последовательностью их монтажа;
- выполнение требований раздела 5.

7.3 Монтажные работы должны предусматривать:

- подготовительные работы;
- строповку колонны;
- подъем и перемещение колонны к месту установки;
- установку колонны в положение, близкое к проектному;
- выверку и закрепление колонны в проектном положении.

7.4 Подготовительные работы должны включать следующие операции и процессы:

- очистку закладных деталей и опорных зон,
- проверку наличия антикоррозионного покрытия закладных деталей;
- нанесение на изделие монтажной разметки;
- проверку наличия акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ включая устройство фундаментов;
- очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций (фундаментов, колонн);
- нанесение разметки, определяющей проектное положение колонны;
- установку на ранее смонтированные конструкции (колонну, перекрытие) одиночных (групповых) кондукторов или других устройств для последующей выверки колонн в проектное положение.

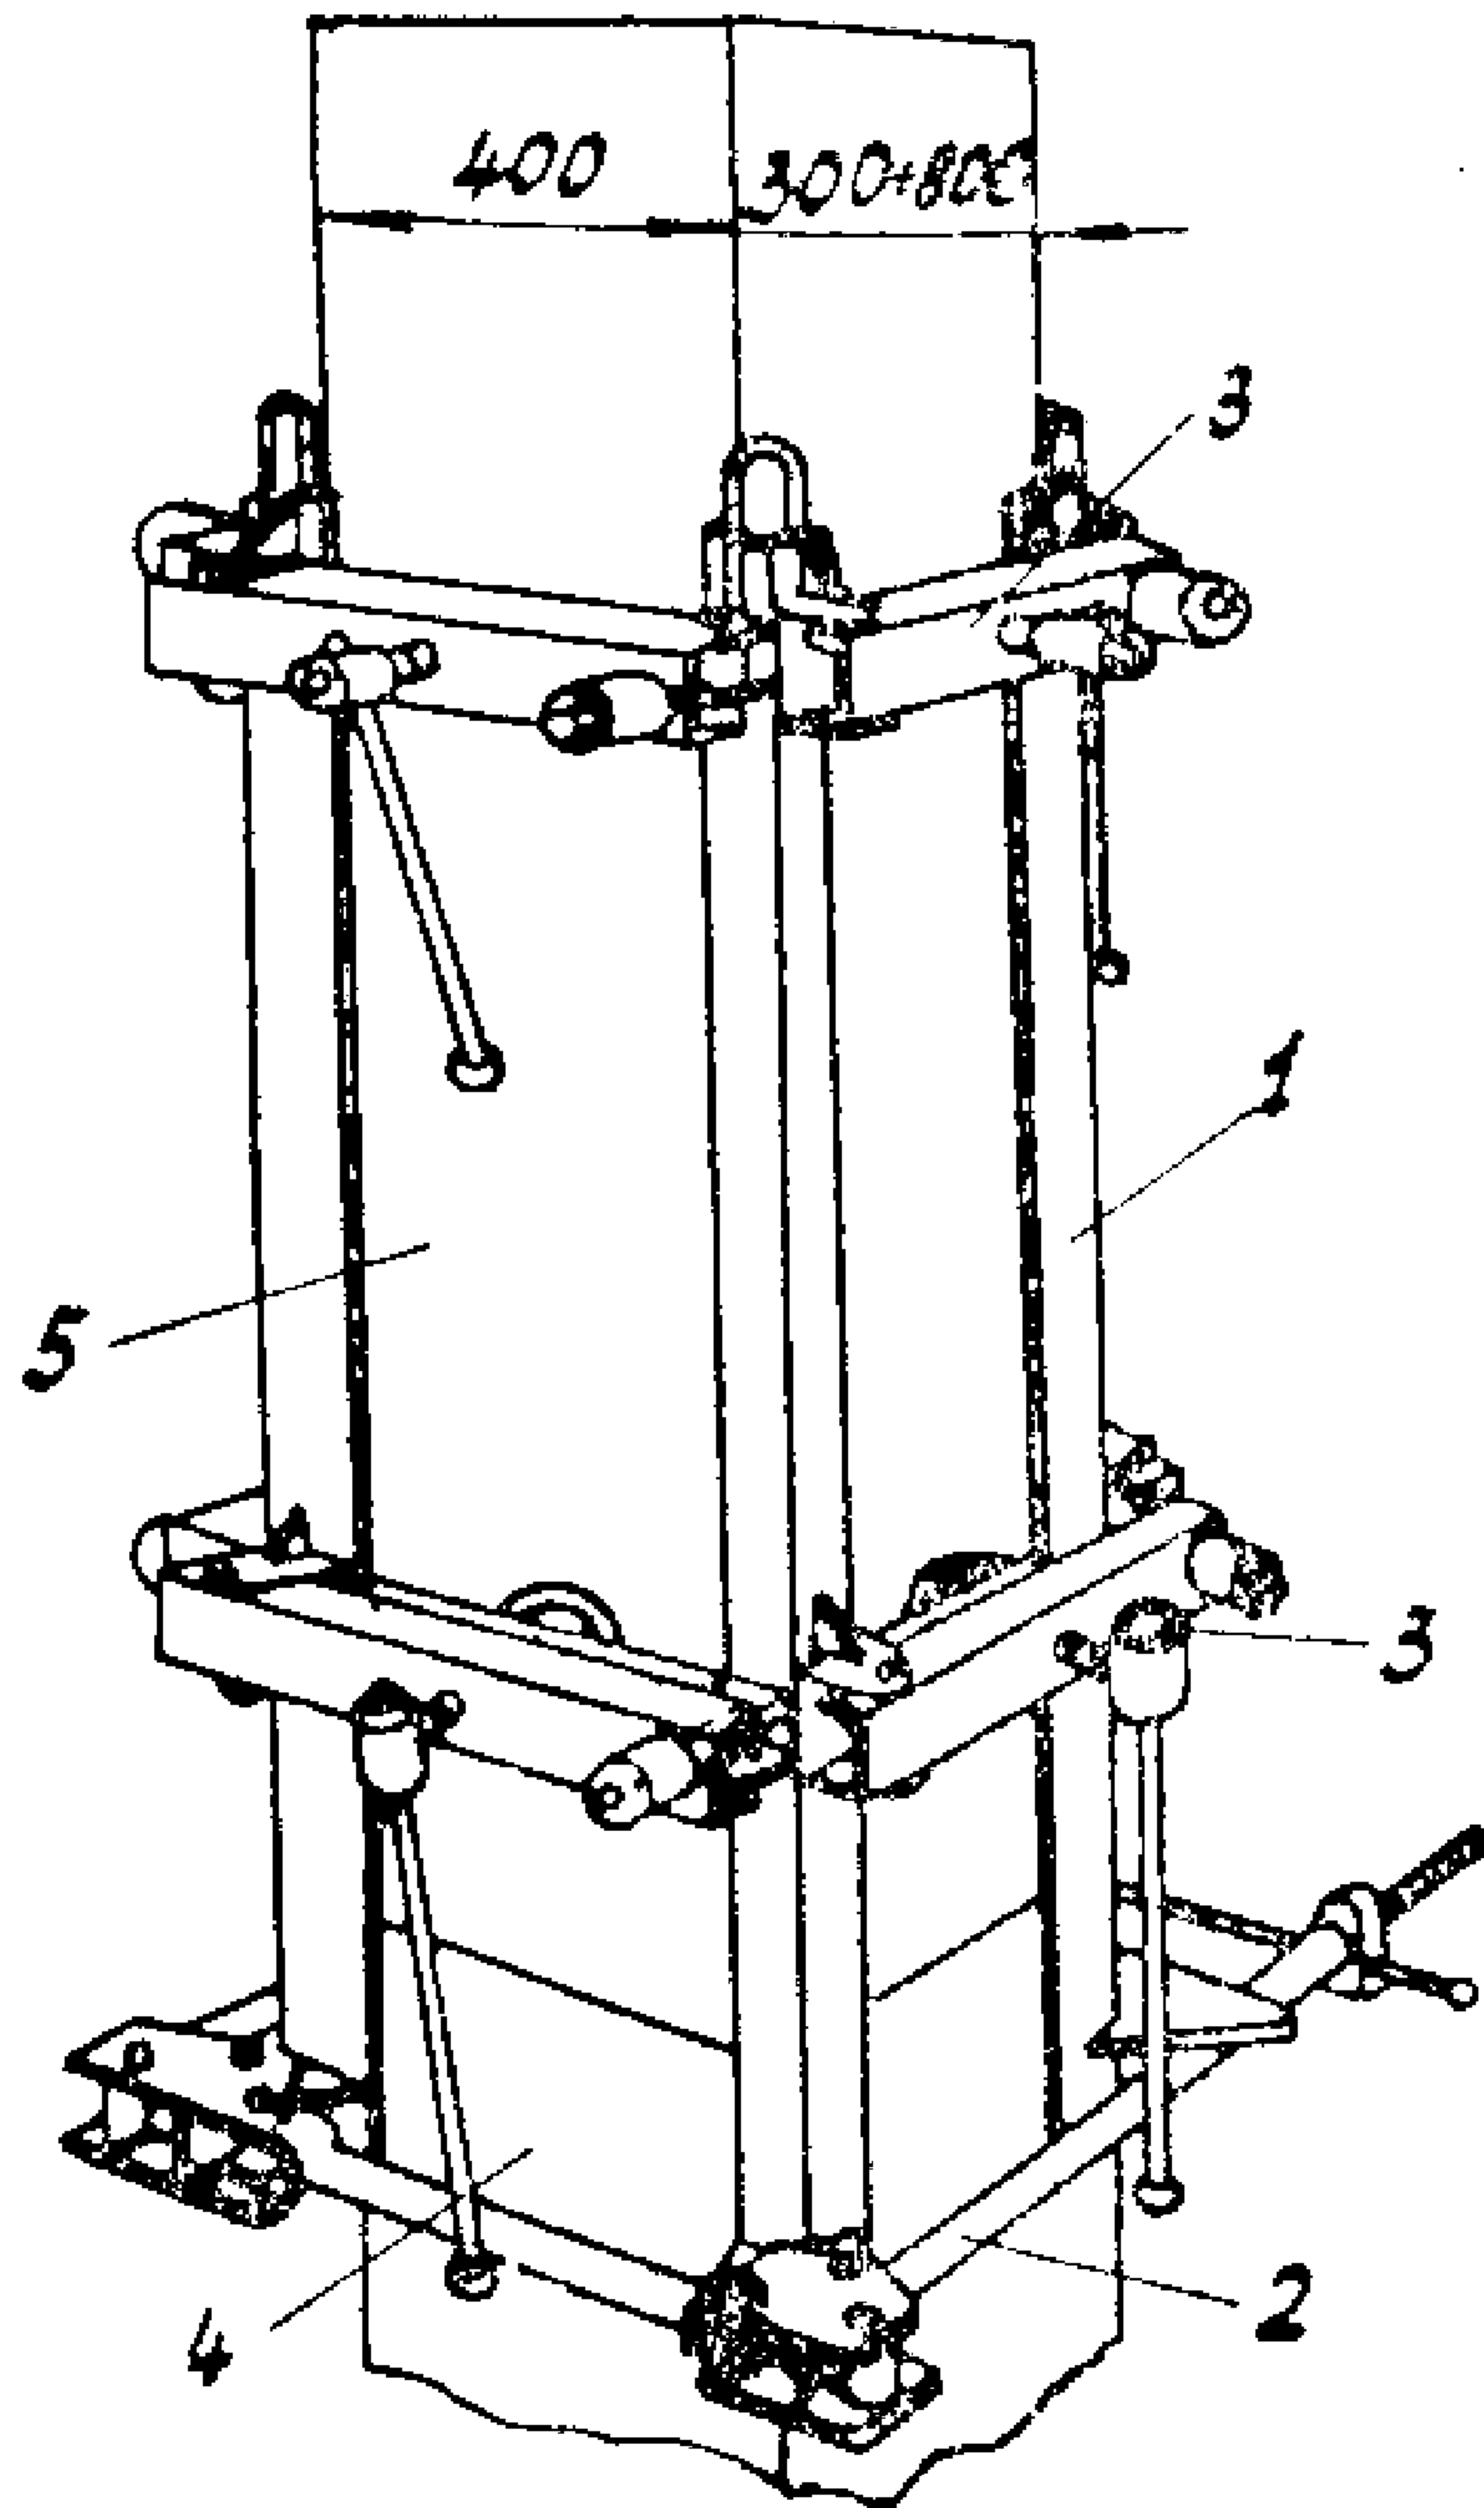
7.5 Для строповки колонн используются устройства, обеспечивающие автоматическую или дистанционную расстроповку с монтажного горизонта.

Конструкции строповочных устройств для монтажа колонн приведены в приложении В.

7.6 При установке колонны в проектное положение должно контролироваться совмещение рисок геометрических осей в нижнем и верхнем сечениях колонны с рисками разбивочных осей. Нижнюю риску колонны совмещают с верхней риской нижней колонны, а риску верхнего сечения колонны устанавливают по разбивочной оси исходного горизонта, чтобы исключить систематическую погрешность теодолита (тахеометра), с помощью которого осуществляют контроль положения колонны.

Для временного закрепления колонны, устанавливаемой на нижестоящую, применяется кондуктор* (см. рисунок 2).

* Конструкции ЦНИИОМТП



1 – стойка; 2 – зажимное устройство; 3 – регулировочное устройство; 4 – нижняя колонна; 5 – верхняя колонна

Рисунок 2 – Кондуктор для установки колонн

Выверочные перемещения осуществляют с помощью регулировочных винтов используемого кондуктора.

Типы устройств, применяемых для выверки колонн, приведены в приложении Г.

7.7 Постоянное закрепление колонны в проектном положении должно выполняться сваркой арматурных выпусков и закладных деталей в зоне стыка (ГОСТ 14098, ГОСТ 3242) в соответствии с проектом после проверки правильности ее установки. Снятие кондуктора разрешается производить после окончания сварочных работ.

7.8 Омоноличивание стыков колонн должно быть выполнено до начала монтажных работ на следующем ярусе. Бетонные смеси, применяемые для заделки стыков, должны отвечать требованиям проекта. Наибольший размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не должен превышать $1/3$ наименьшего размера сечения стыка.

7.9 Сварка и замоноличивание стыков должно производиться с передвижных инвентарных подмостей, имеющих огражденные площадки (передвижная площадка монтажника приведена на рисунке 3). Прогонь монтируется с помощью двухветьевого стропа грузоподъемностью 3 т.

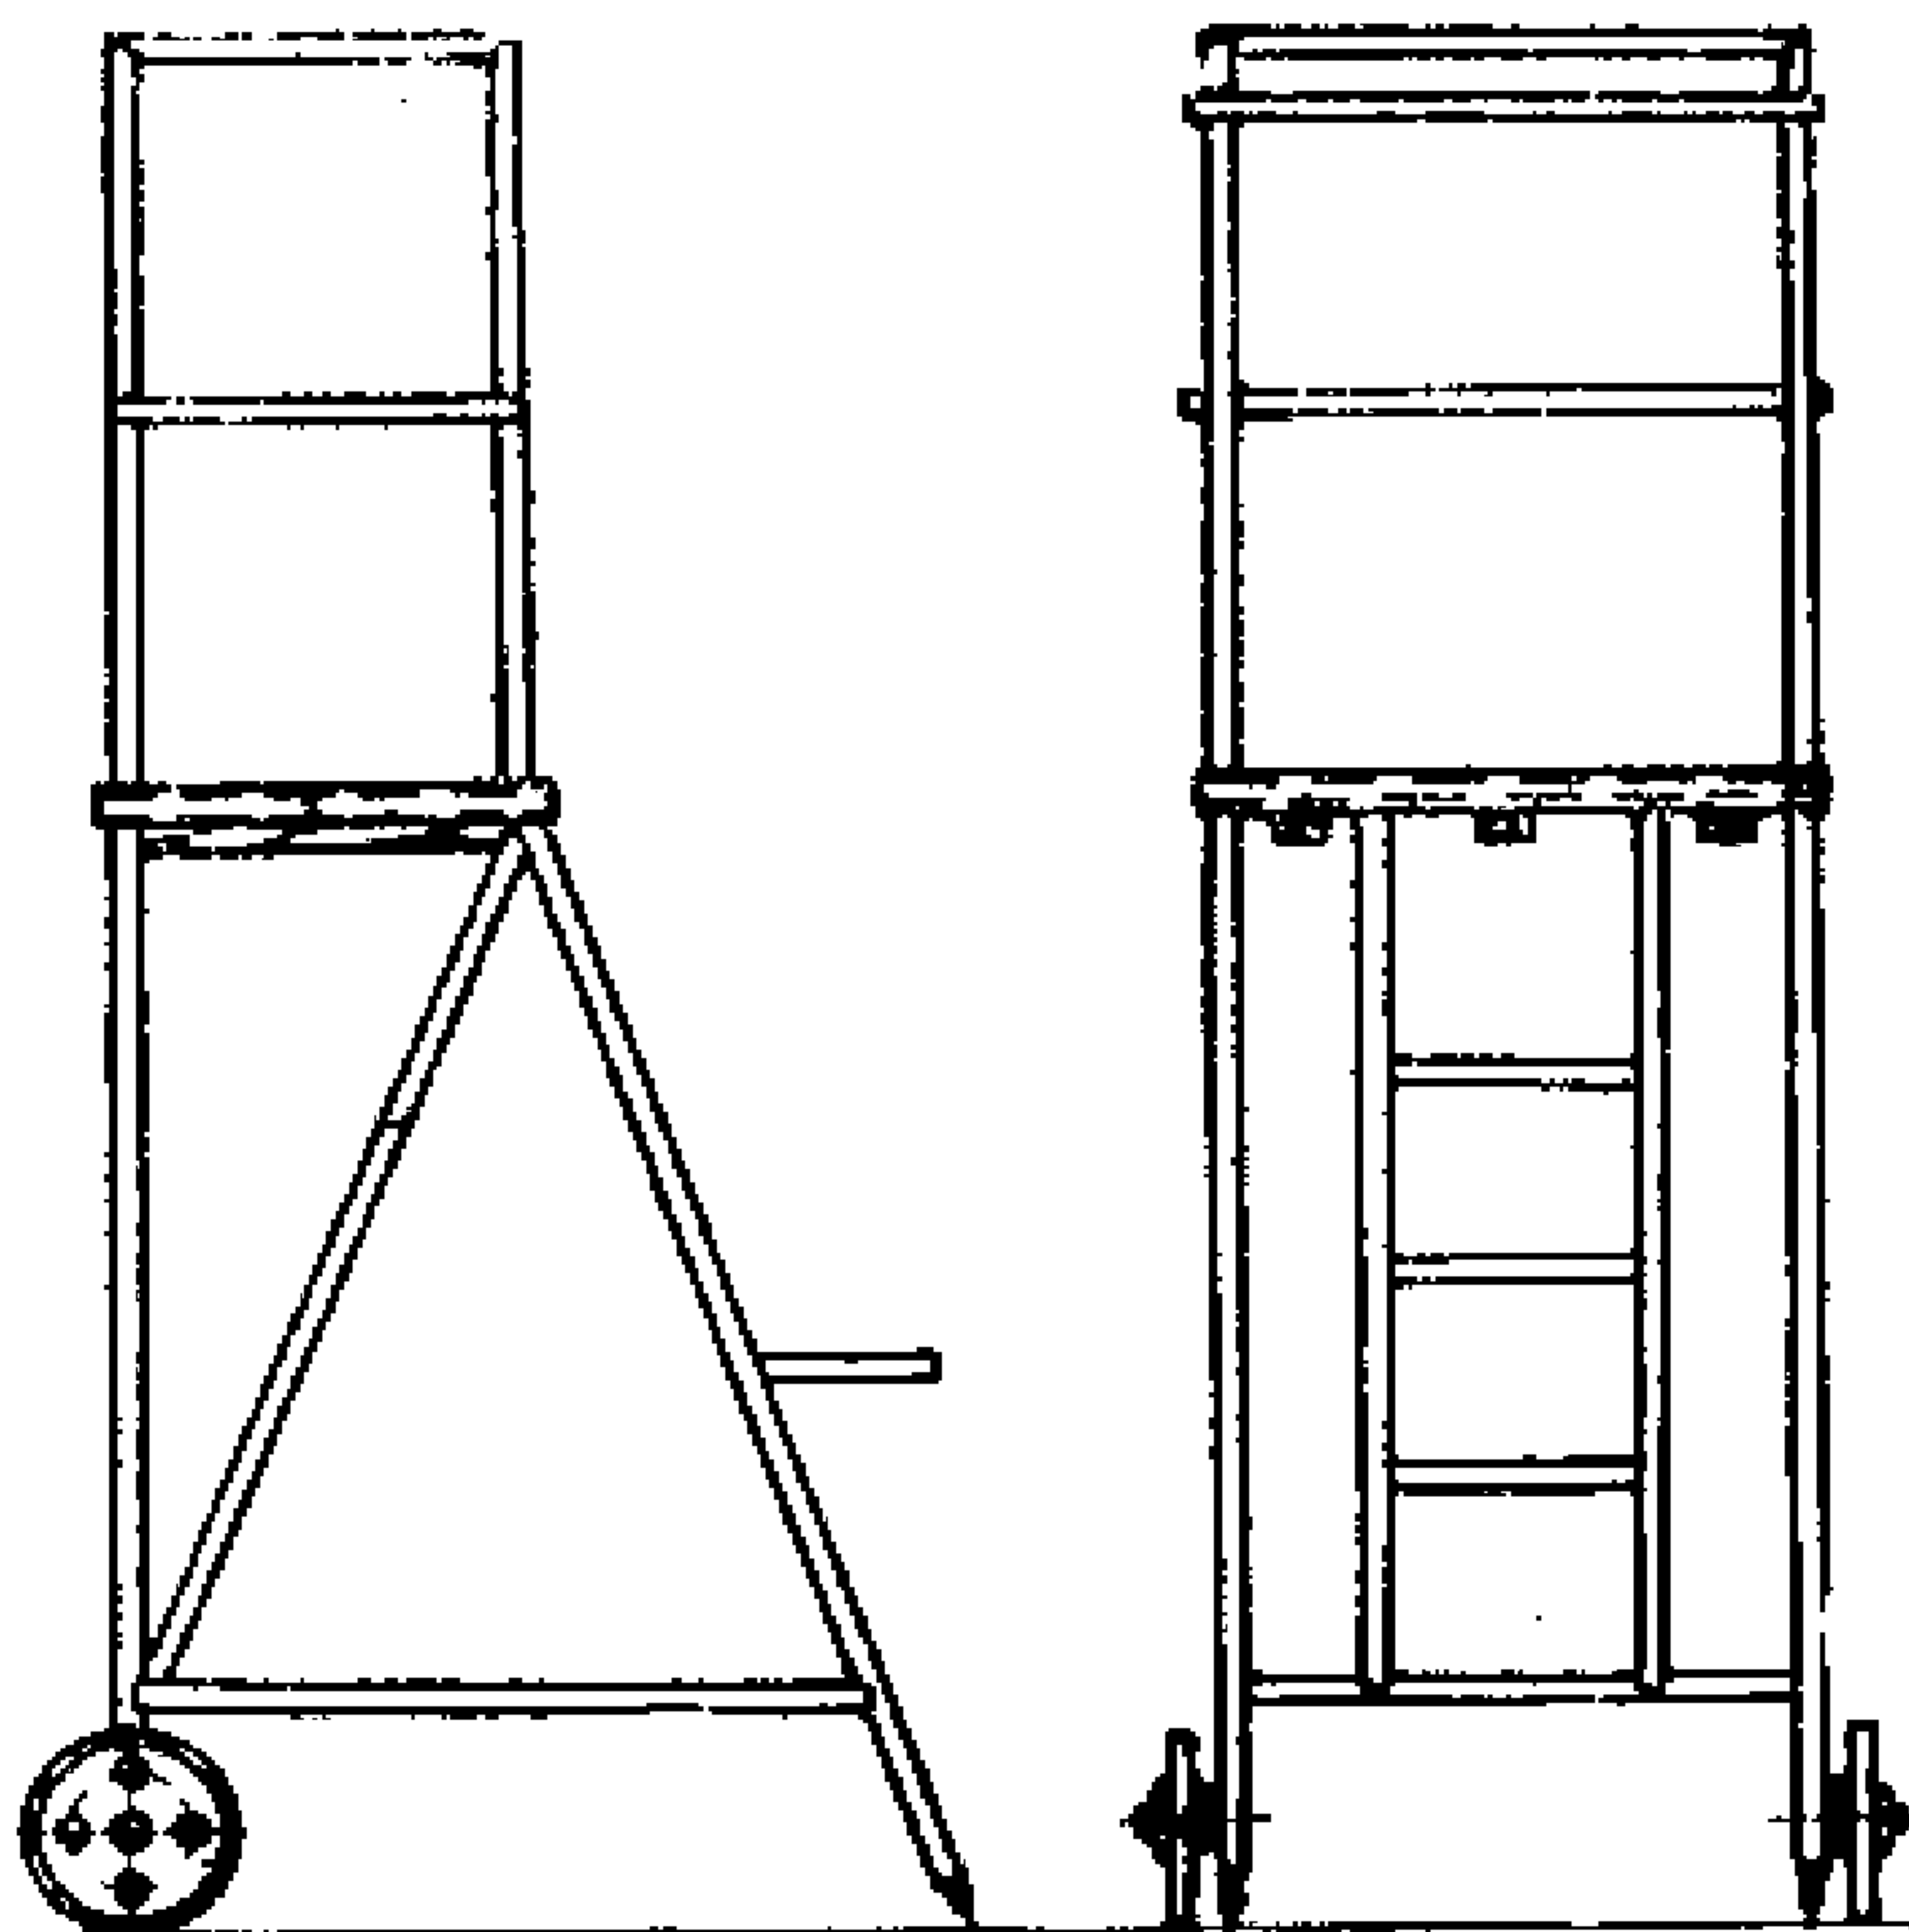


Рисунок 3 – Передвижная площадка монтажника

8 Сдача-приемка монтажных работ и контроль качества их выполнения

8.1 Сдача выполненных работ по монтажу колонн производится в комплексе со сдачей-приемкой всех видов общестроительных работ по возведению здания в целом или его отдельных частей.

8.2 В ходе приемки проверяется полнота и правильность оформления исполнительной документации, включая акты на скрытые работы (в соответствии с РД-11-02-2006 [1] и РД-11-05-2007 [2]). Оценка качества выполненных работ на объекте производится с учетом имевших место нарушений, отраженных в исполнительной документации.

8.3 При оценке качества монтажа отдельных элементов следует использовать геодезические приборы и измерительные устройства, позволяющие определять отклонения положения колонны от проектных геометрических параметров с погрешностью, не превышающей 0,2 от значения предельного (допустимого) отклонения.

Выбор средств измерений осуществляют в соответствии с ГОСТ 23616 и ГОСТ 26433.1.

8.4 Отклонения от проектного положения смонтированных колонн не должны превышать предельных значений:

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в нижнем сечении колонн с установочными ориентирами (рисками разбивочных осей) – 8 мм;

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в верхнем сечении колонн с рисками разбивочных осей при длине колонн:

- до 4 м – ± 12 мм;
- от 4 до 8 м – ± 15 мм;
- от 8 до 16 м – ± 20 мм;

– разности отметок верха колонн многоэтажного здания в пределах выверяемого участка при:

– контактной установке – $\pm (12+2n)$ мм (n – порядковый номер яруса (этажа));

– установке по маякам – ± 10 мм.

8.5 Не допускается применение не предусмотренных проектом прокладок в стыках колонн для выравнивания высотных отметок и приведение их в вертикальное положение без согласования с проектной организацией.

8.6 Результаты контроля геометрических параметров при монтаже колонн должны оформляться геодезической исполнительной схемой.

9 Демонтаж колонн

9.1 Необходимость демонтажа колонны может возникнуть при:

– повреждении колонны в процессе возведения или эксплуатации здания;

– реконструкции здания – надстройка, пристройка или, перепланировка помещений.

9.2 Демонтаж выполняется только при отсутствии конструкций, опирающихся на колонну (ригели, плиты), подлежащую демонтажу.

9.3 Демонтаж выполняется в обязательном порядке на основе проекта производства работ, обеспечивающего безопасное ведение работ.

9.4 Демонтаж (замена) колонн при реконструкции зданий выполняется по специальному проекту, содержащему технические решения по переопианию сохраняемых конструкций.

Номенклатура и конструктивные показатели колонн массового применения приведены в приложении Д.

9.5 В проекте демонтажа железобетонных изделий должна быть предусмотрена утилизация железобетонных элементов.

Примечание – Рекомендации по утилизации демонтируемых железобетонных изделий, включая колонны, приведены в пункте 9.5 СТО НОСТРОЙ 2.7.55.

10 Консервация объекта при временном прекращении монтажных работ

10.1 Состав работ по консервации недостроенного объекта зависит от предполагаемого срока консервации, стадии и периода производства работ (зимний, летний) и определяется в специально разработанном проекте производства работ (ППР).

10.2 Консервация колонн должна производиться комплексно в составе каркасного здания или сооружения.

10.3 Для консервации смонтированных железобетонных колонн необходимо соблюдение следующих требований:

- устойчивость положения колонн должна быть обеспечена защемлением в фундаментных конструкциях, жесткими конструктивными связями в уровнях перекрытий – сварка с элементами перекрытий (ригелями и плитами), вертикальными связями и диафрагмами жесткости;

- закладные детали и сварные соединения должны быть защищены антикоррозионными составами;

- участки с выпусками арматуры должны быть защищены от попадания атмосферной влаги;

- допускается свободный вылет колонны не выше одного этажа. При свободном вылете колонны более одного этажа должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению устойчивости положения колонны например, с помощью устройства гибких или жестких растяжек.

10.4 До консервации объекта в обязательном порядке должна быть выполнена обратная засыпка пазух фундаментов и защита от замокания

материалов и конструкций, изменяющих свои свойства при насыщении водой, особенно в период ее замерзания.

При консервации малоэтажных зданий с фундаментами мелкого заложения для предотвращения деформаций при промерзании основания целесообразно устраивать утепленную отмостку по периметру здания и утепление пола подвала.

10.5 В зимний период должна быть организована еженедельная проверка сохранности защитных конструкций.

10.6 При расконсервации объекта до возобновления строительных работ необходимо выполнить обследование всех строительных конструкций в соответствии с ГОСТ Р 53778 с составлением ведомости дефектов, выполнением необходимых поверочных расчетов, определением категории технического состояния конструкций, и разработкой рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и повреждений.

11 Правила безопасного выполнения работ при монтаже колонн

11.1 Монтажники и такелажники при производстве работ обязаны выполнять требования безопасности согласно СП 12-135-2003 [7].

11.2 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом, используя подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации.

11.3 Строительная площадка расположенная в населенном пункте должна быть ограждена в соответствие с требованиями ГОСТ 23407.

11.4 Средства подмащивания, приставные лестницы и другие приспособления должны обеспечивать безопасность производства работ и соответствовать требованиям ГОСТ 26887; ГОСТ 24259; ГОСТ 24258.

11.5 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны иметь защитные или страховочные ограждения, а при расстоянии более 2 м – сигнальные ограждения, соответствующие требованиям государственных стандартов.

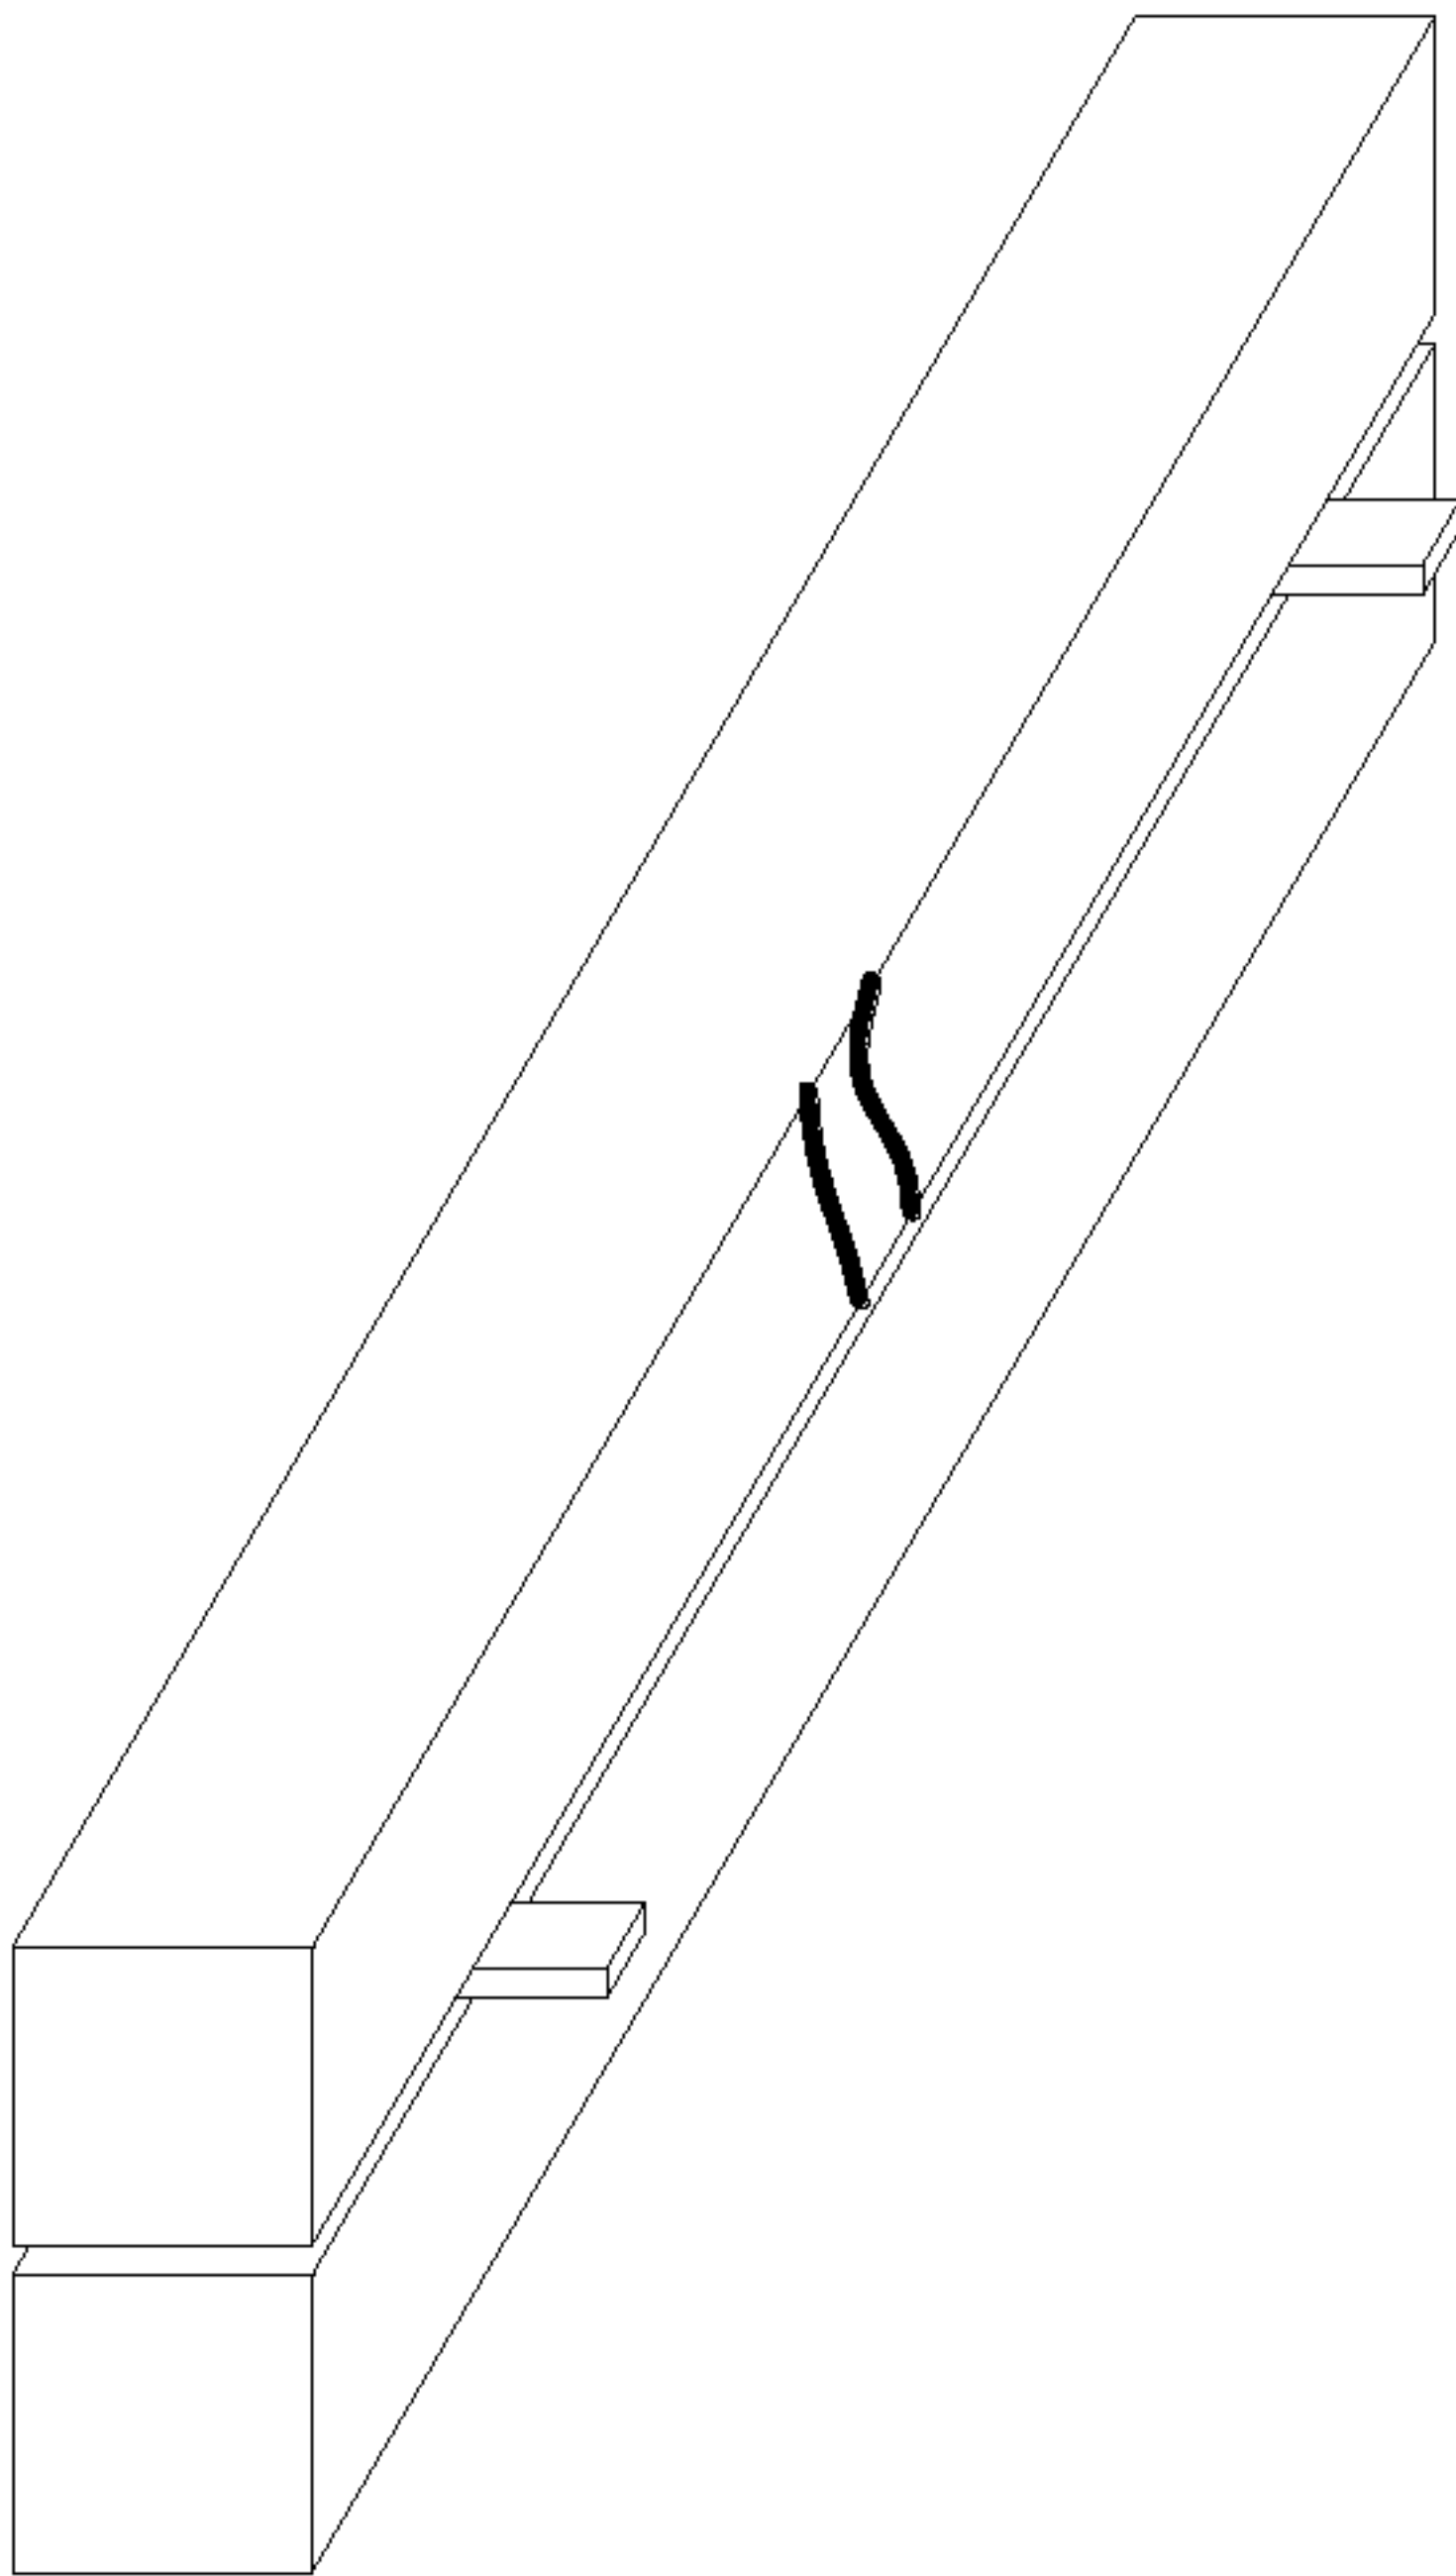
11.6 После установки конструкции в проектное положение необходимо произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок. Крепление следует производить за ранее закрепленные анкера или конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость строящегося здания (сооружения).

Приложение А
(справочное)

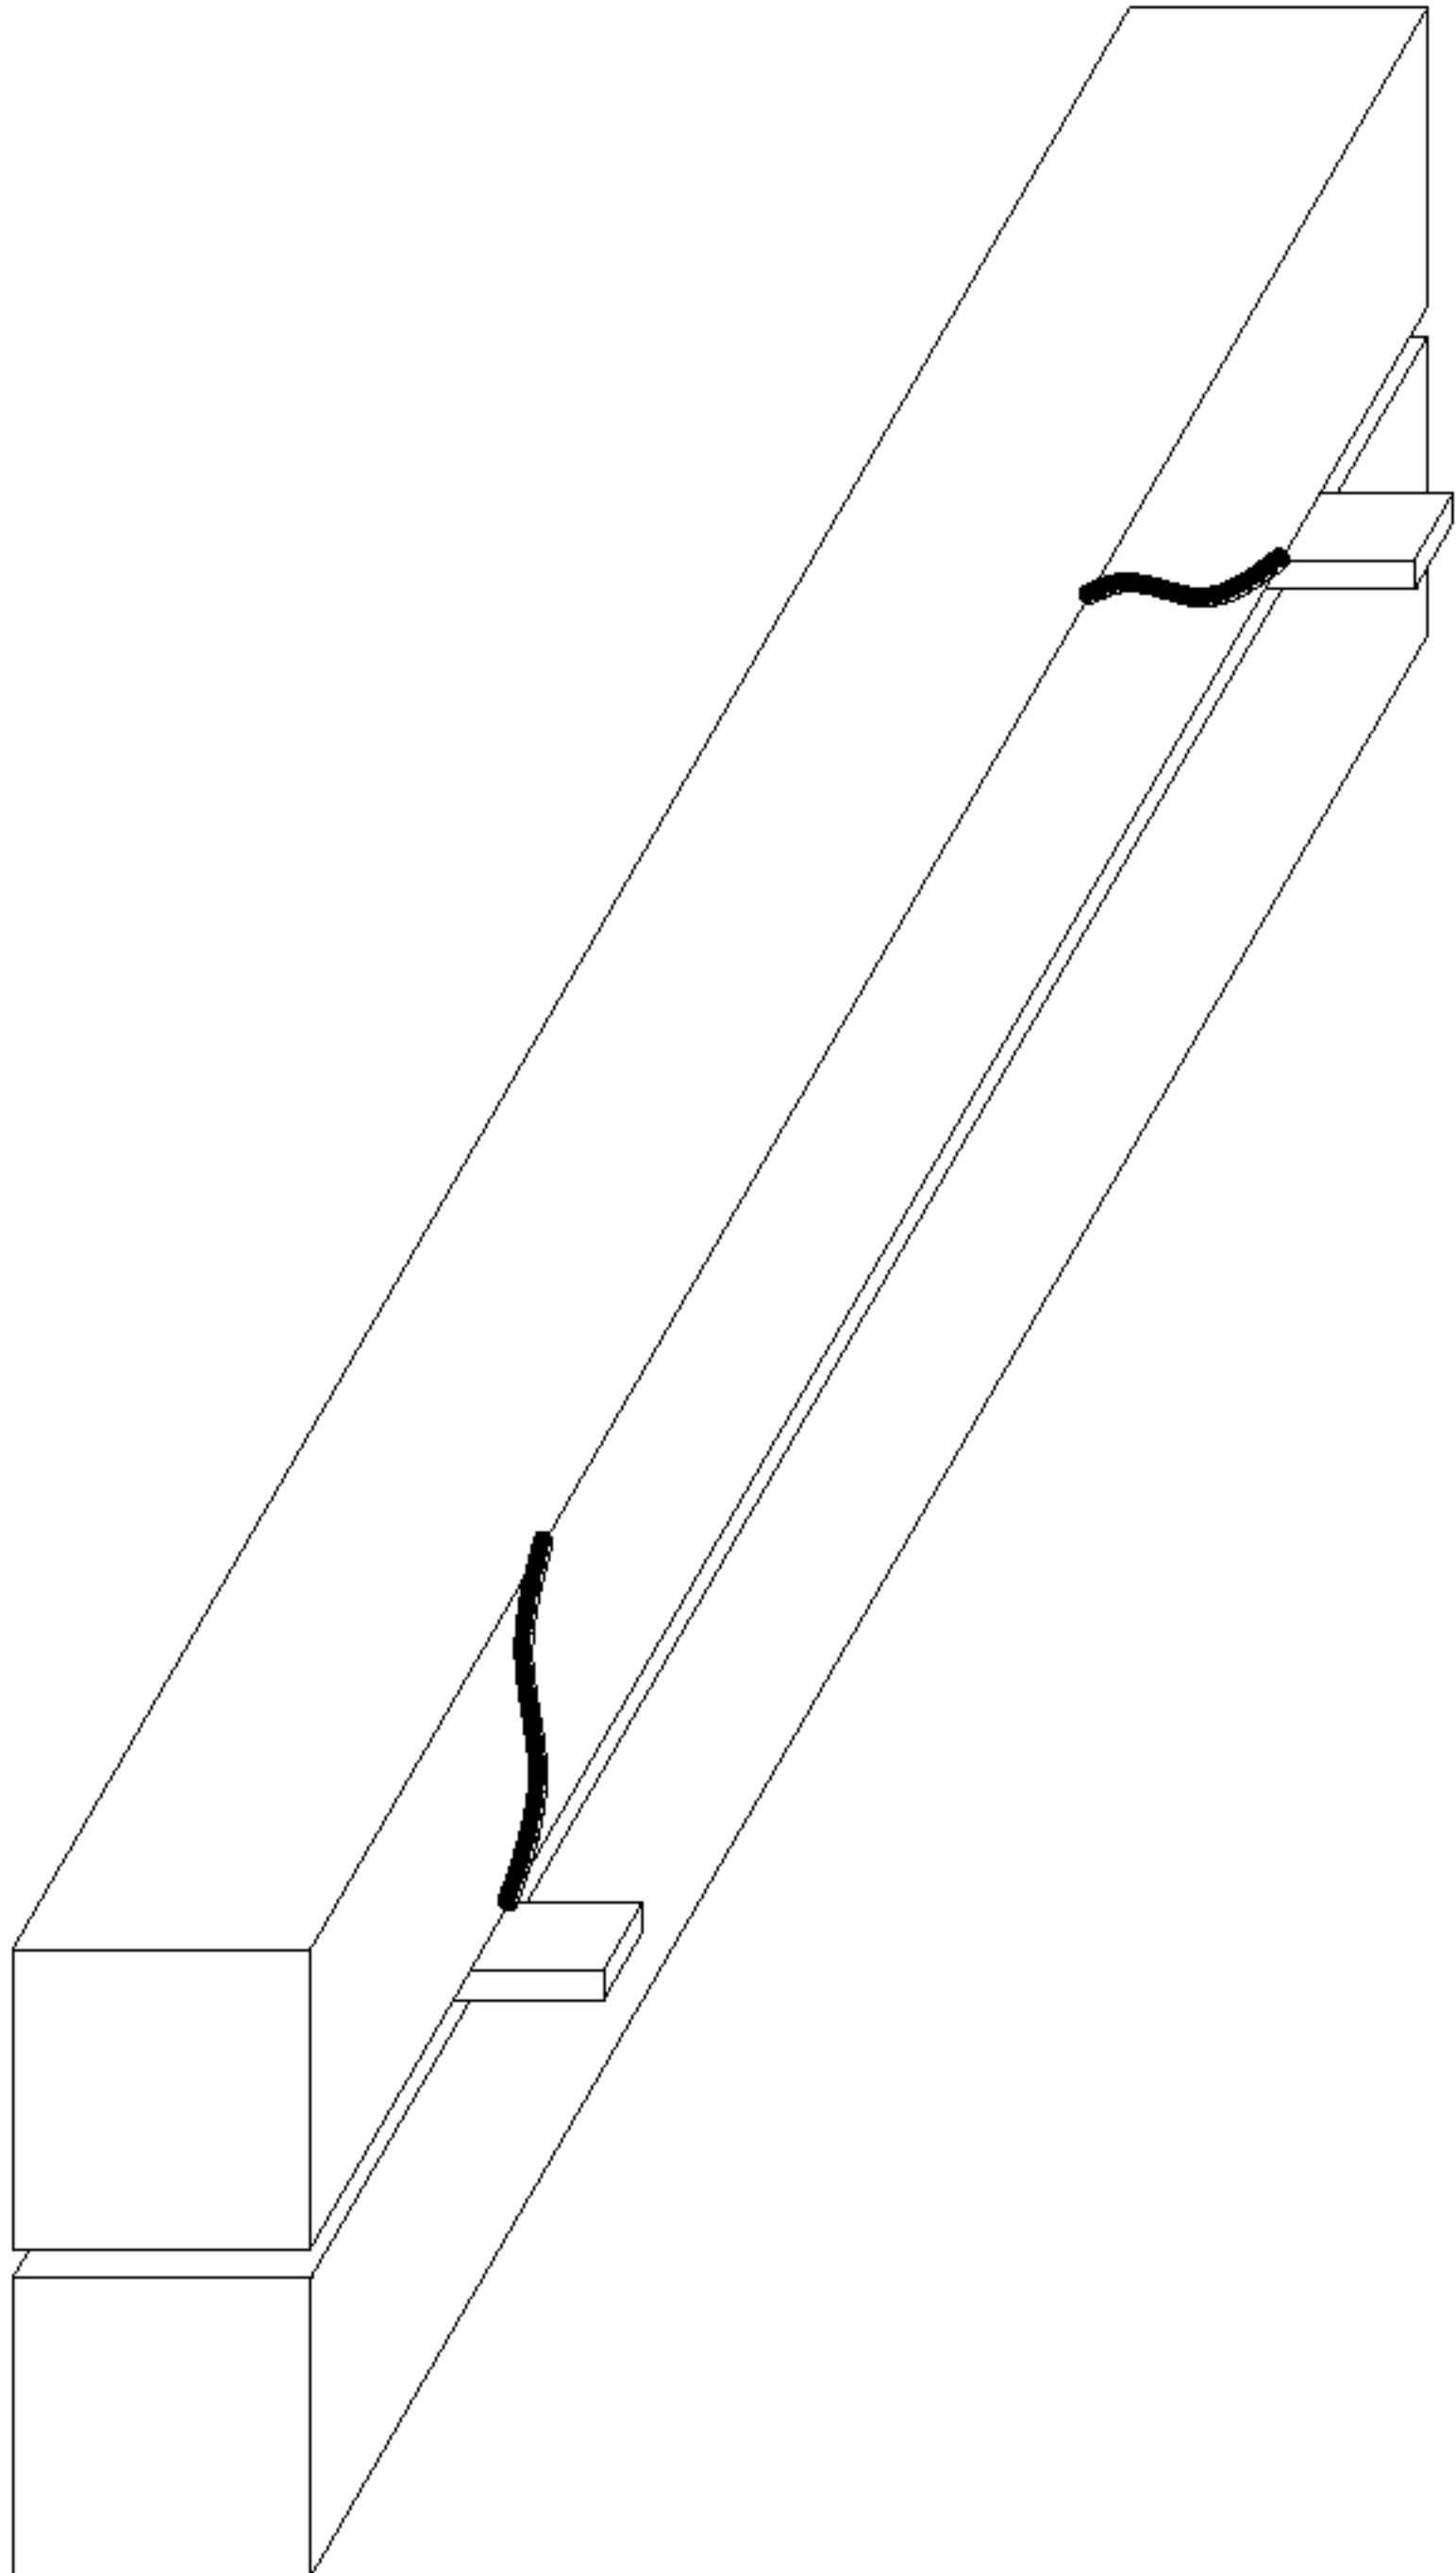
Примеры распространенных дефектов колонн массового применения

- А.1 В таблице А.1 приведены примеры дефектов, которые охватывают только наиболее часто встречающиеся.
- А.2 Причины возникновения дефектов, приведенных в таблице А.1, могут быть уточнены после проведения экспертизы.

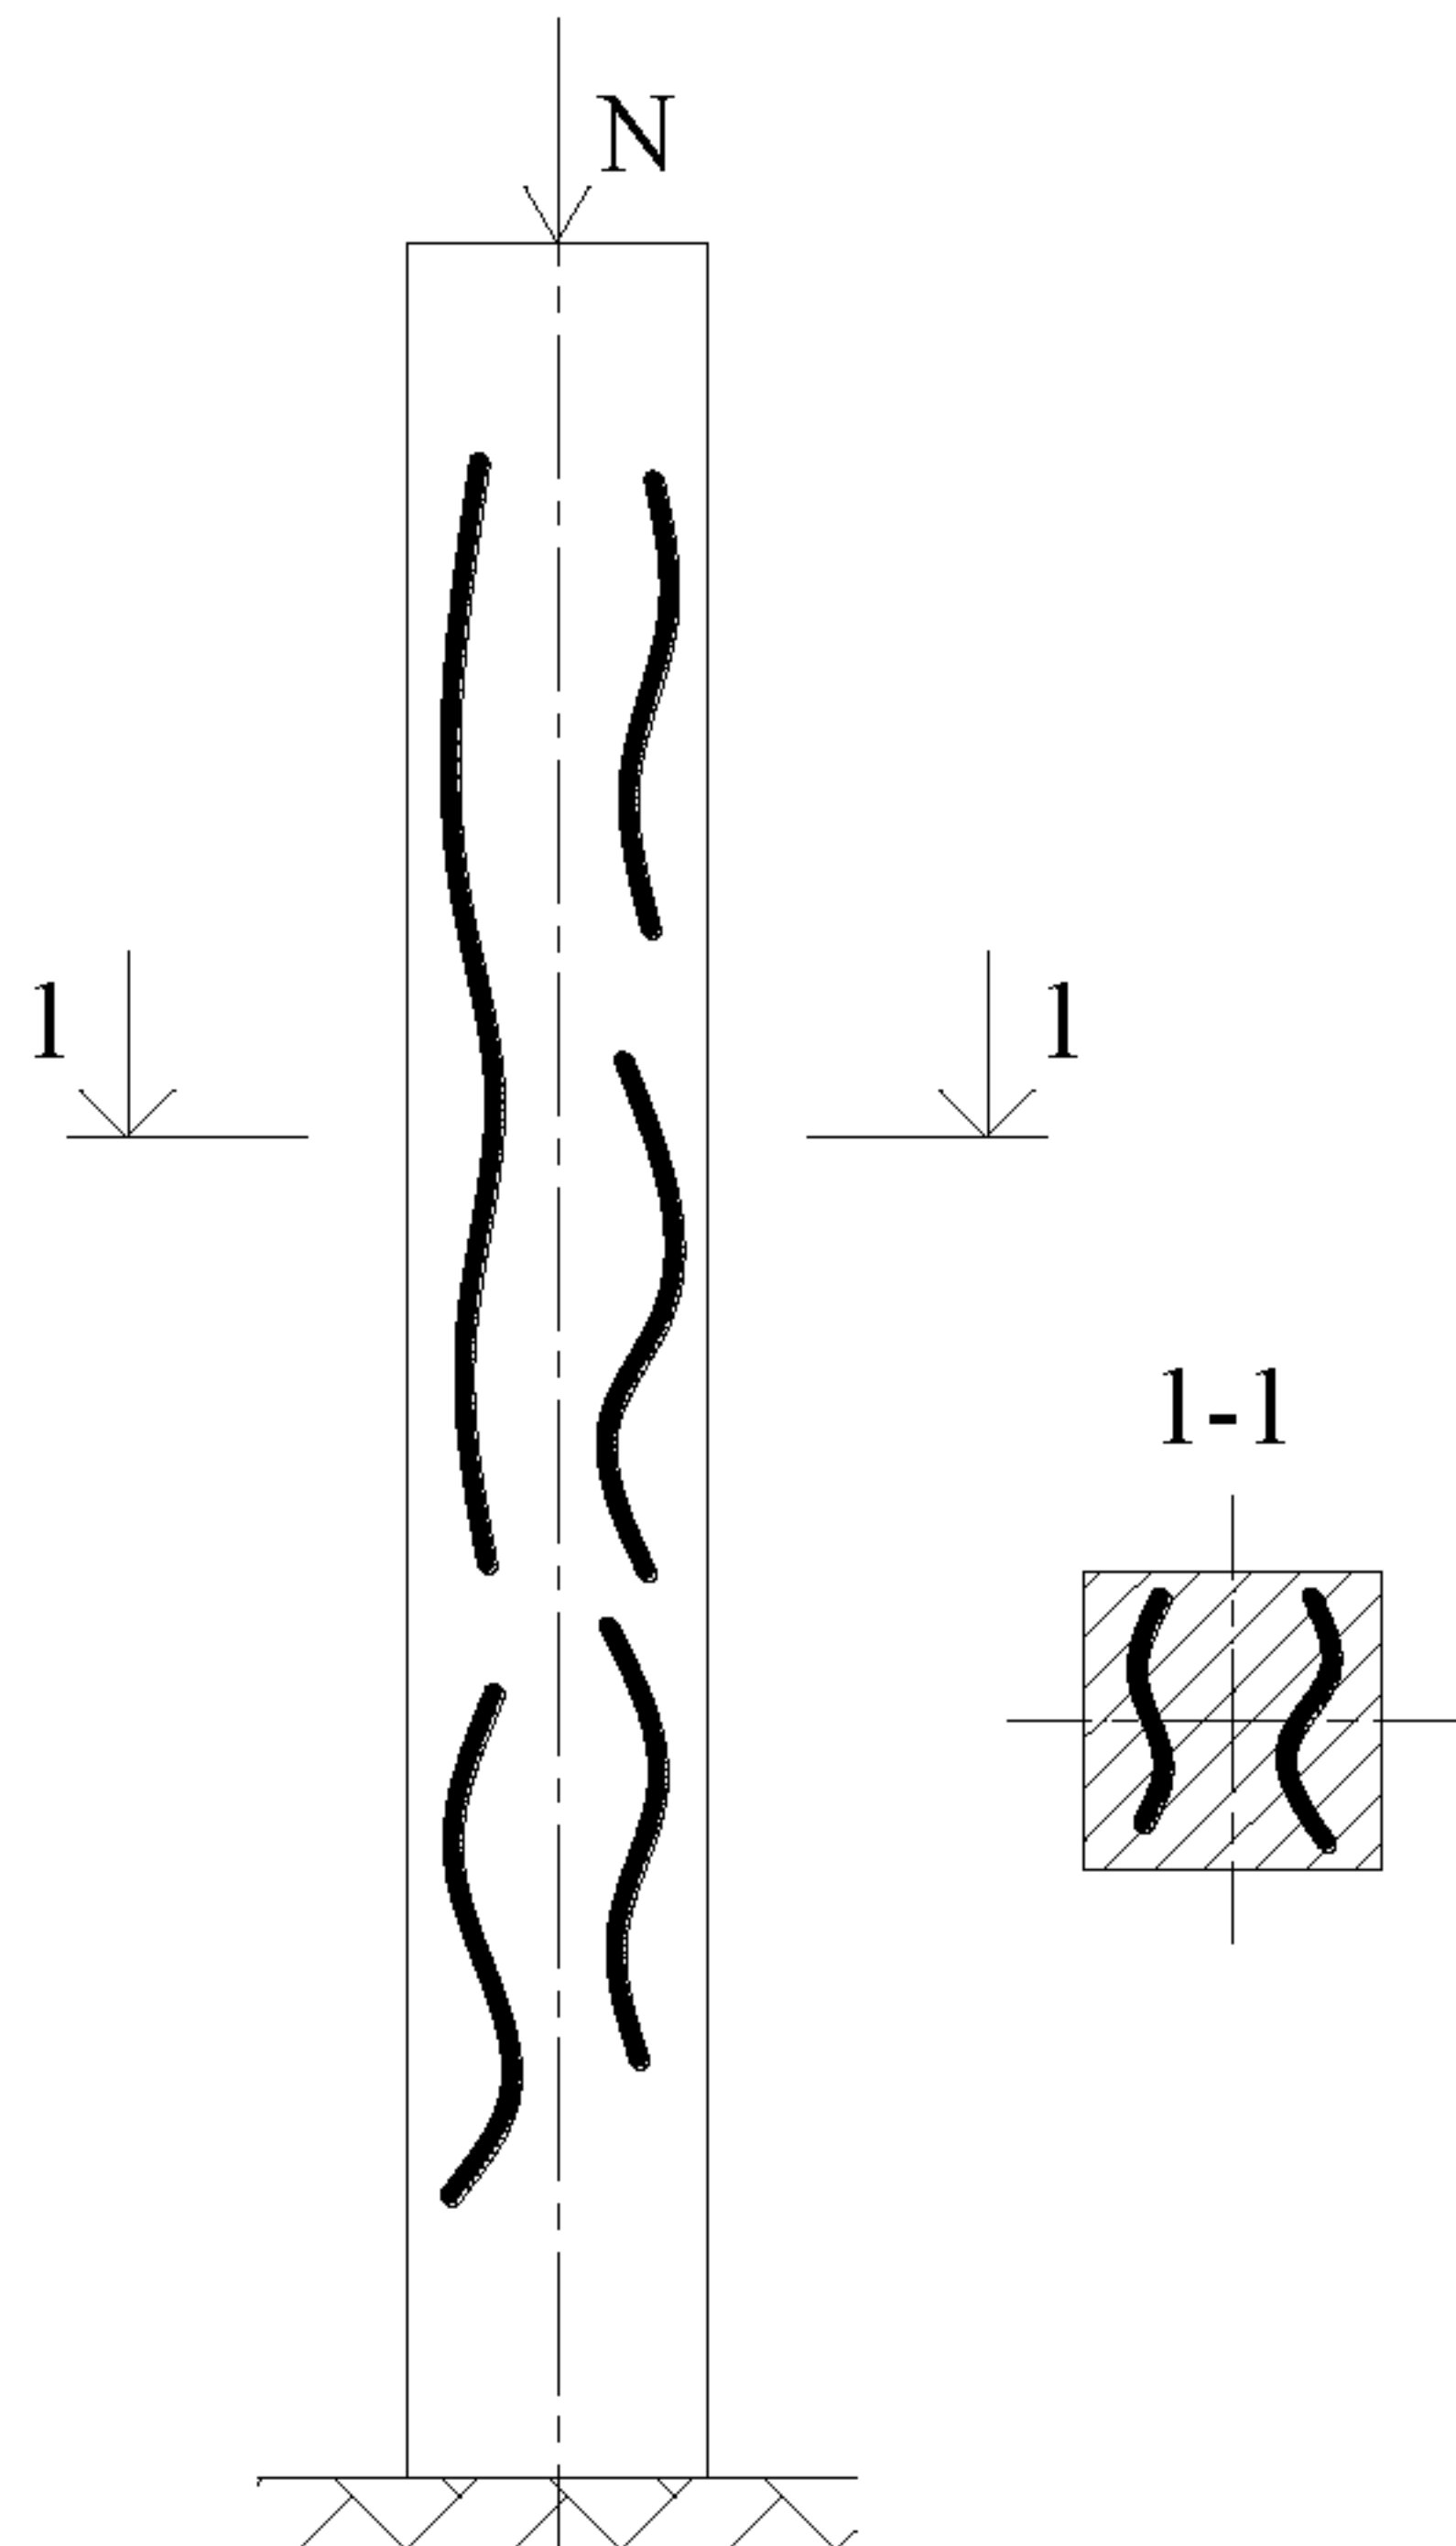
Таблица А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
1		Поперечные трещины.	Временная перегрузка плиты, снижение прочности бетона или площади продольной арматуры вследствие коррозии, дефекты строповки или крепления при транспортировке.	Если трещина не превышает 0,1 мм, колонна используется после пересчета со снижением несущей способности. Если превышает 0,1 мм, то требуется произвести усиление.

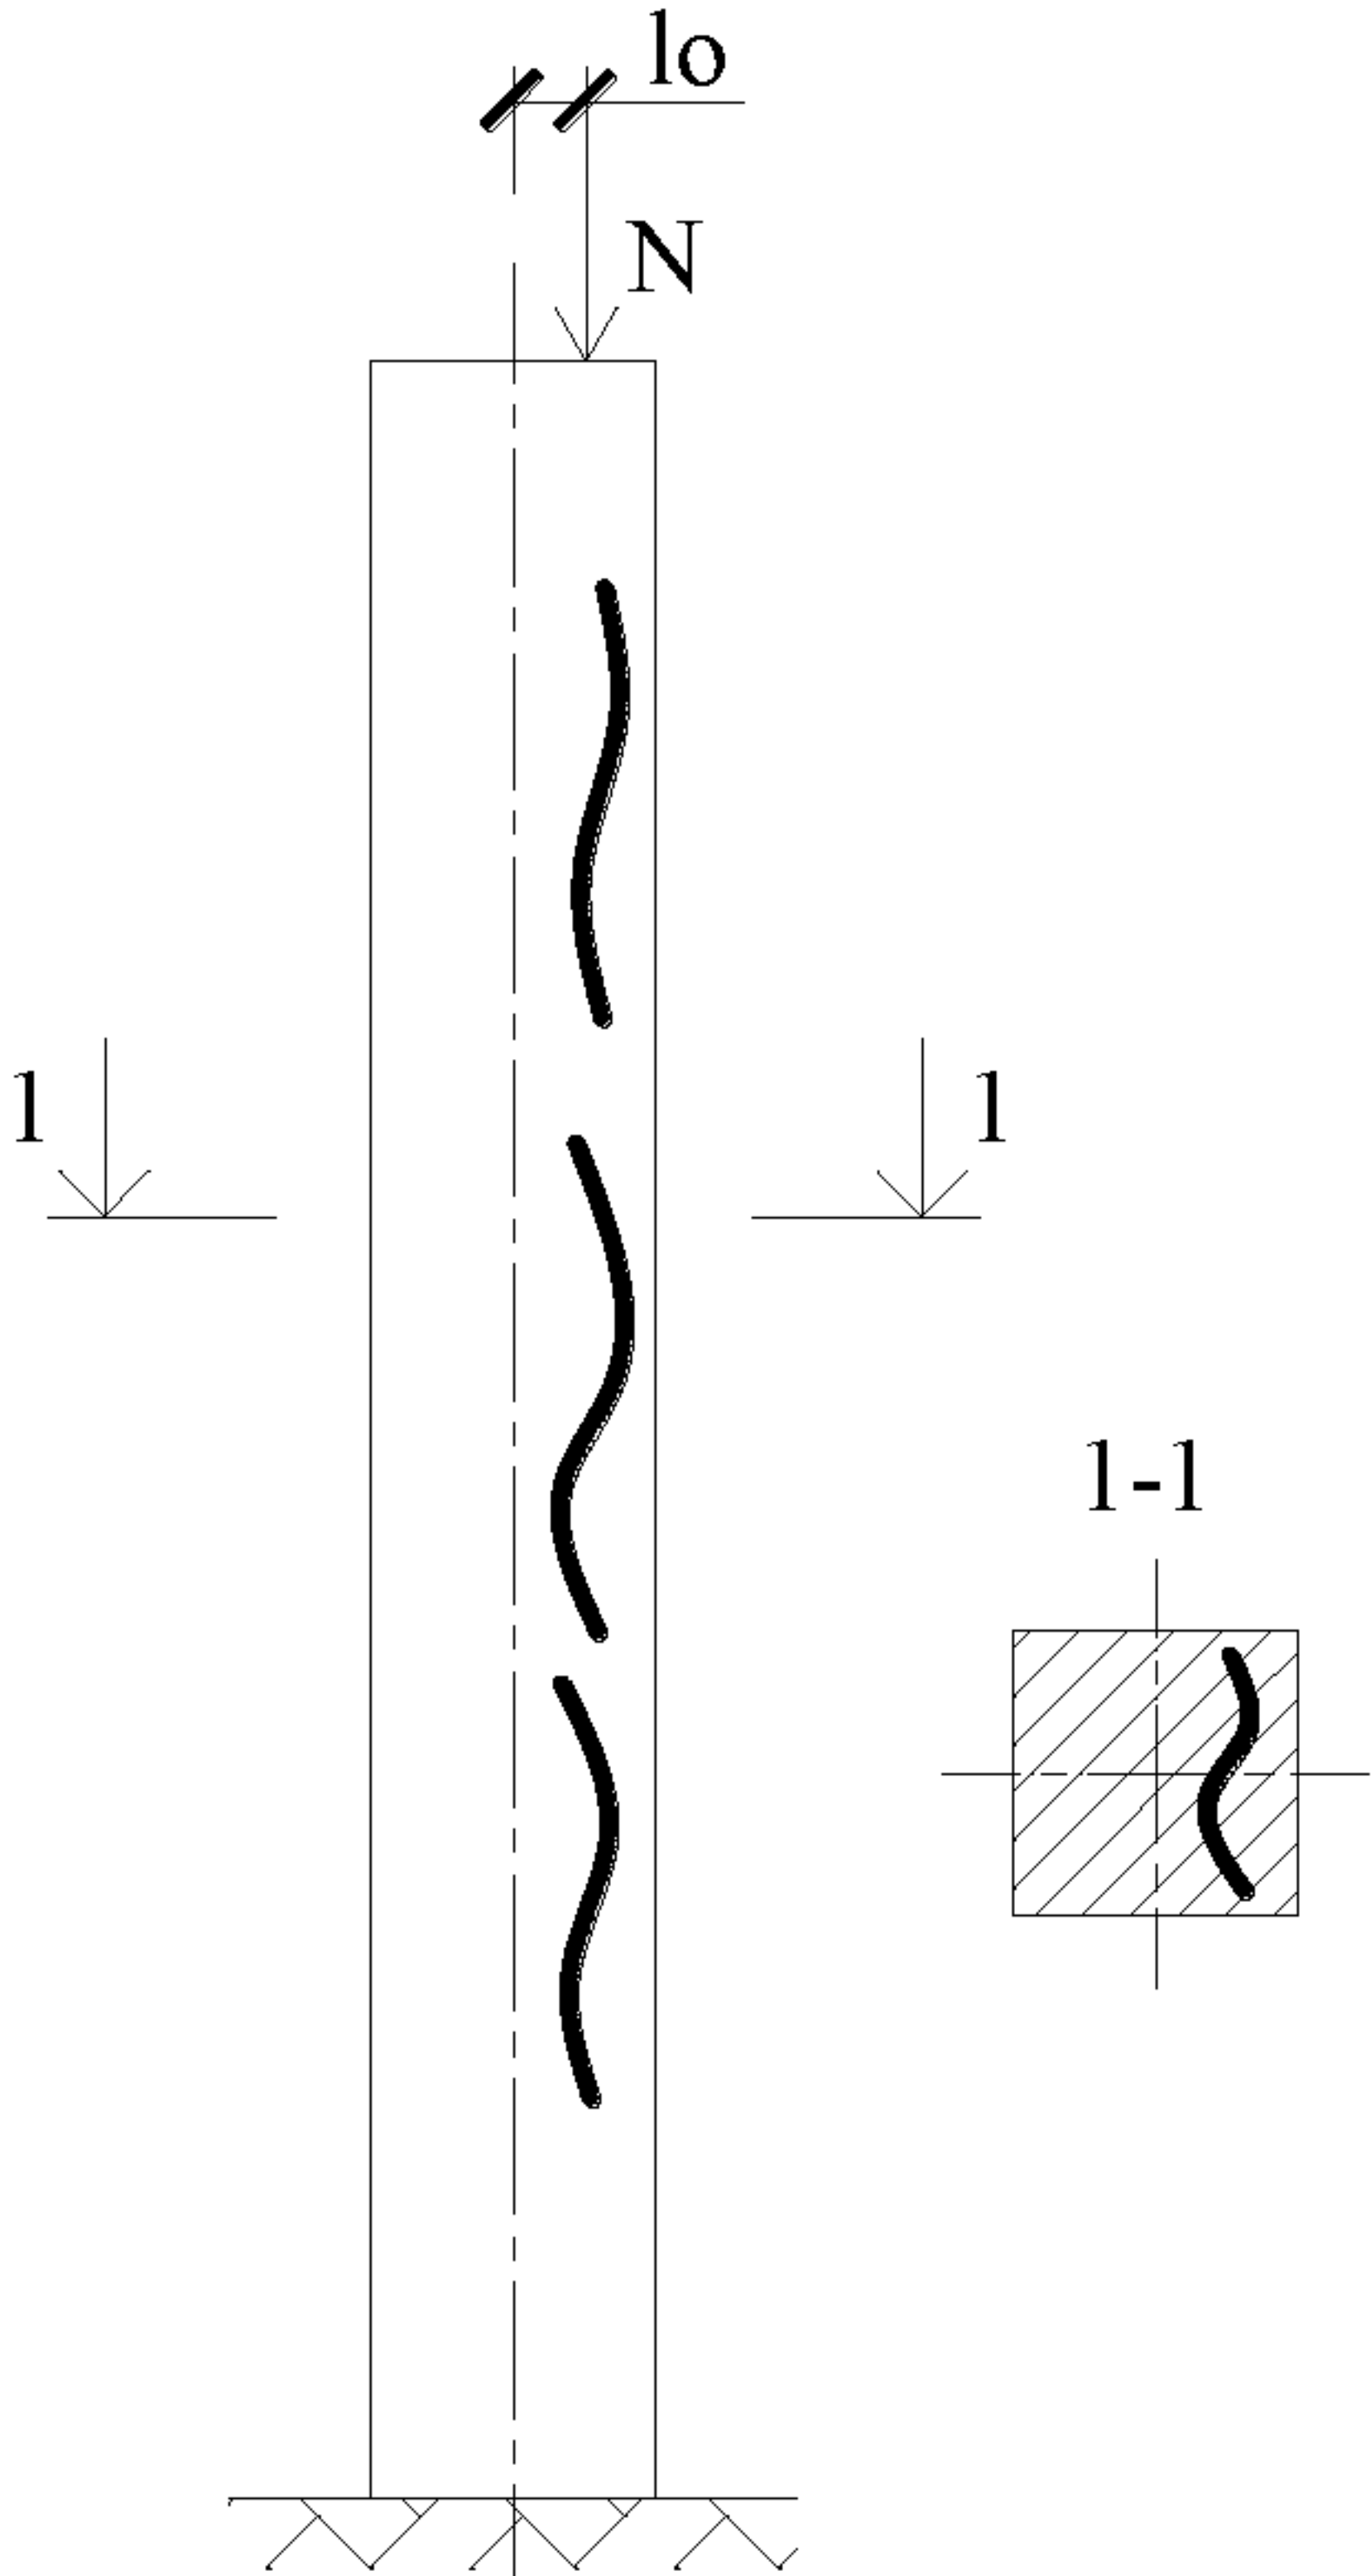
Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
2		Наклонные трещины.	Дефекты складирования или крепления при транспортировке, снижение прочности бетона, недостаточное поперечное армирование.	При ширине раскрытия трещин менее 0,1 мм колонна используется только после пересчета с понижением несущей способности. Если ширина раскрытия превышает 0,1 мм, то требуется произвести усиление.

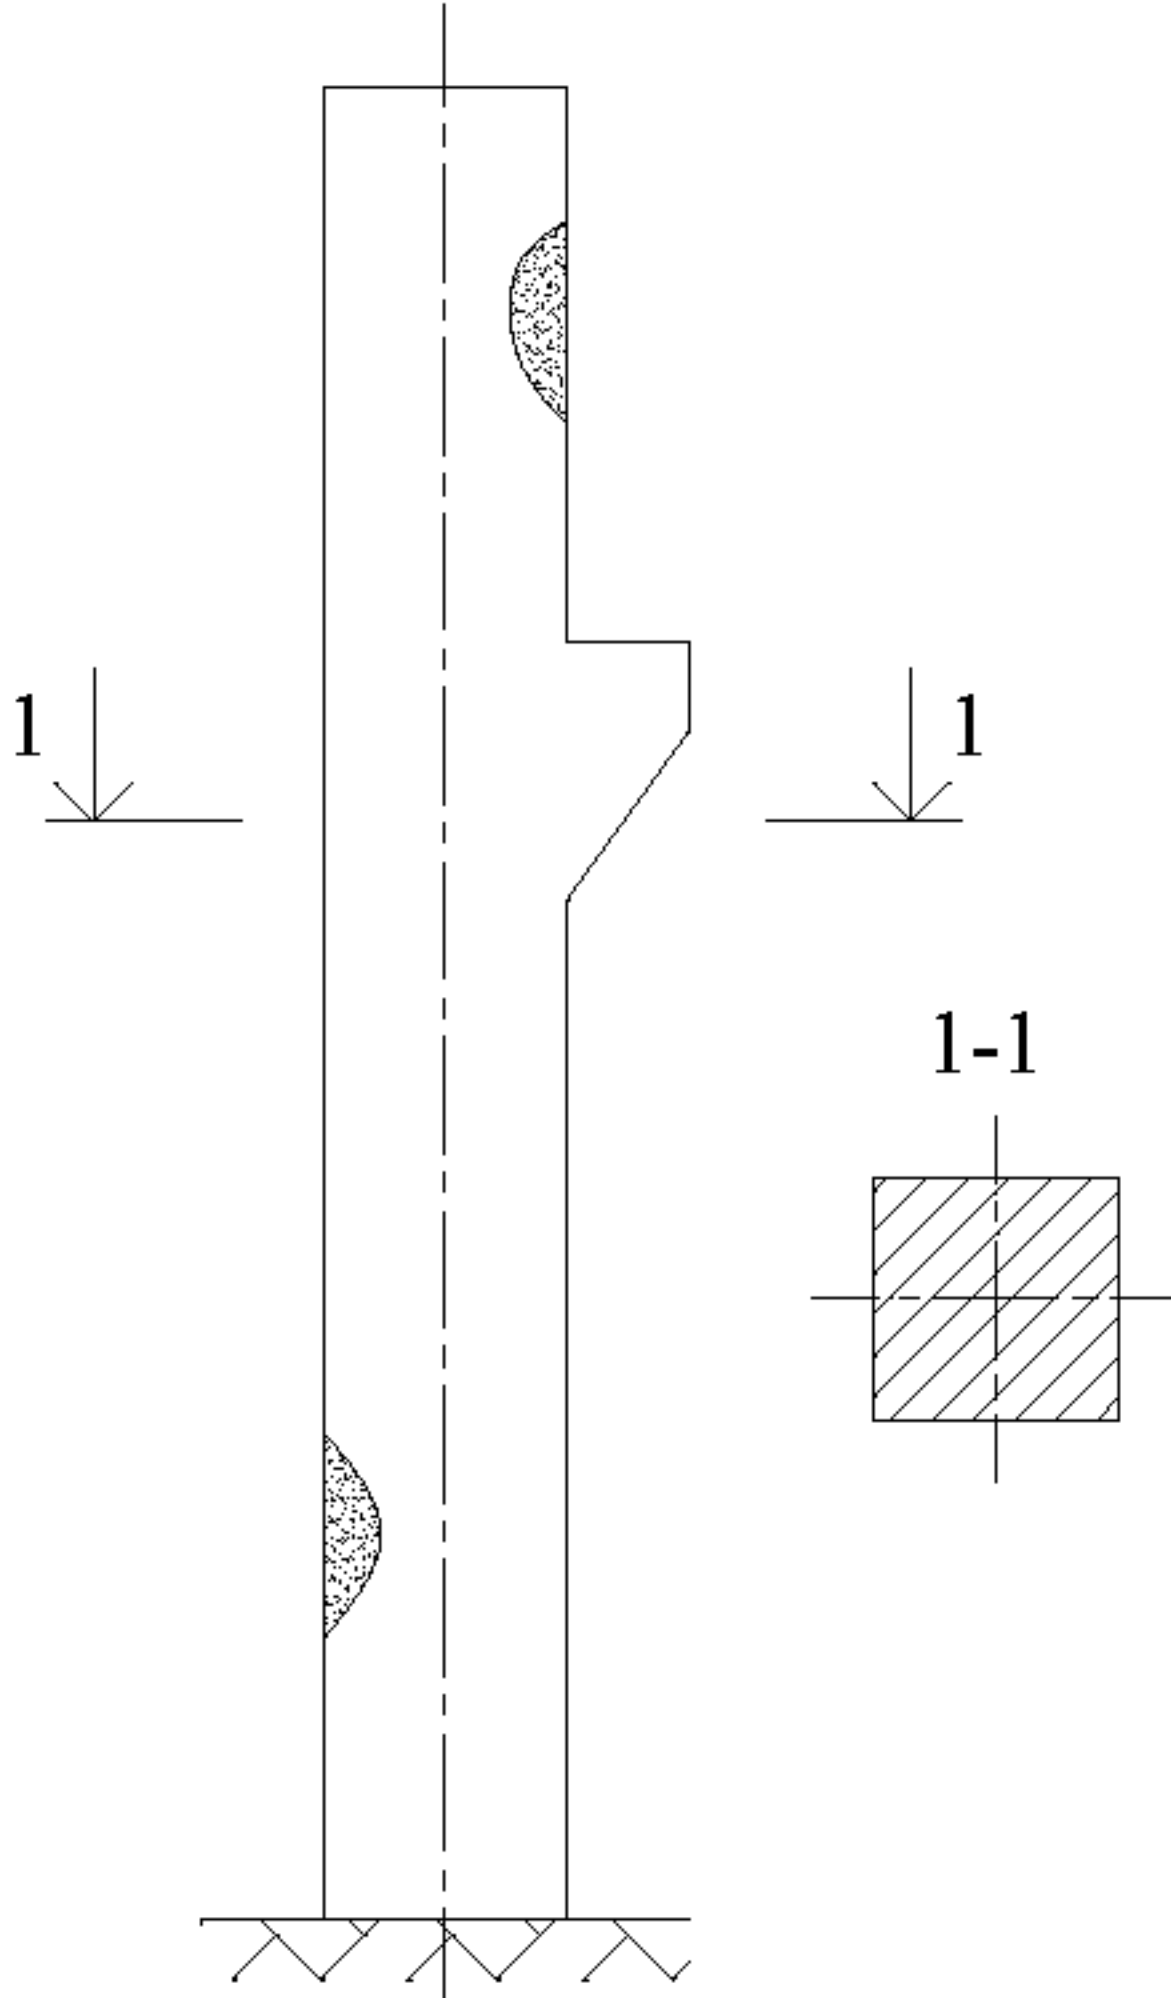
Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
3		Продольные трещины по всему сечению.	Снижение прочности бетона.	Требуется произвести усиление колонны по расчету.

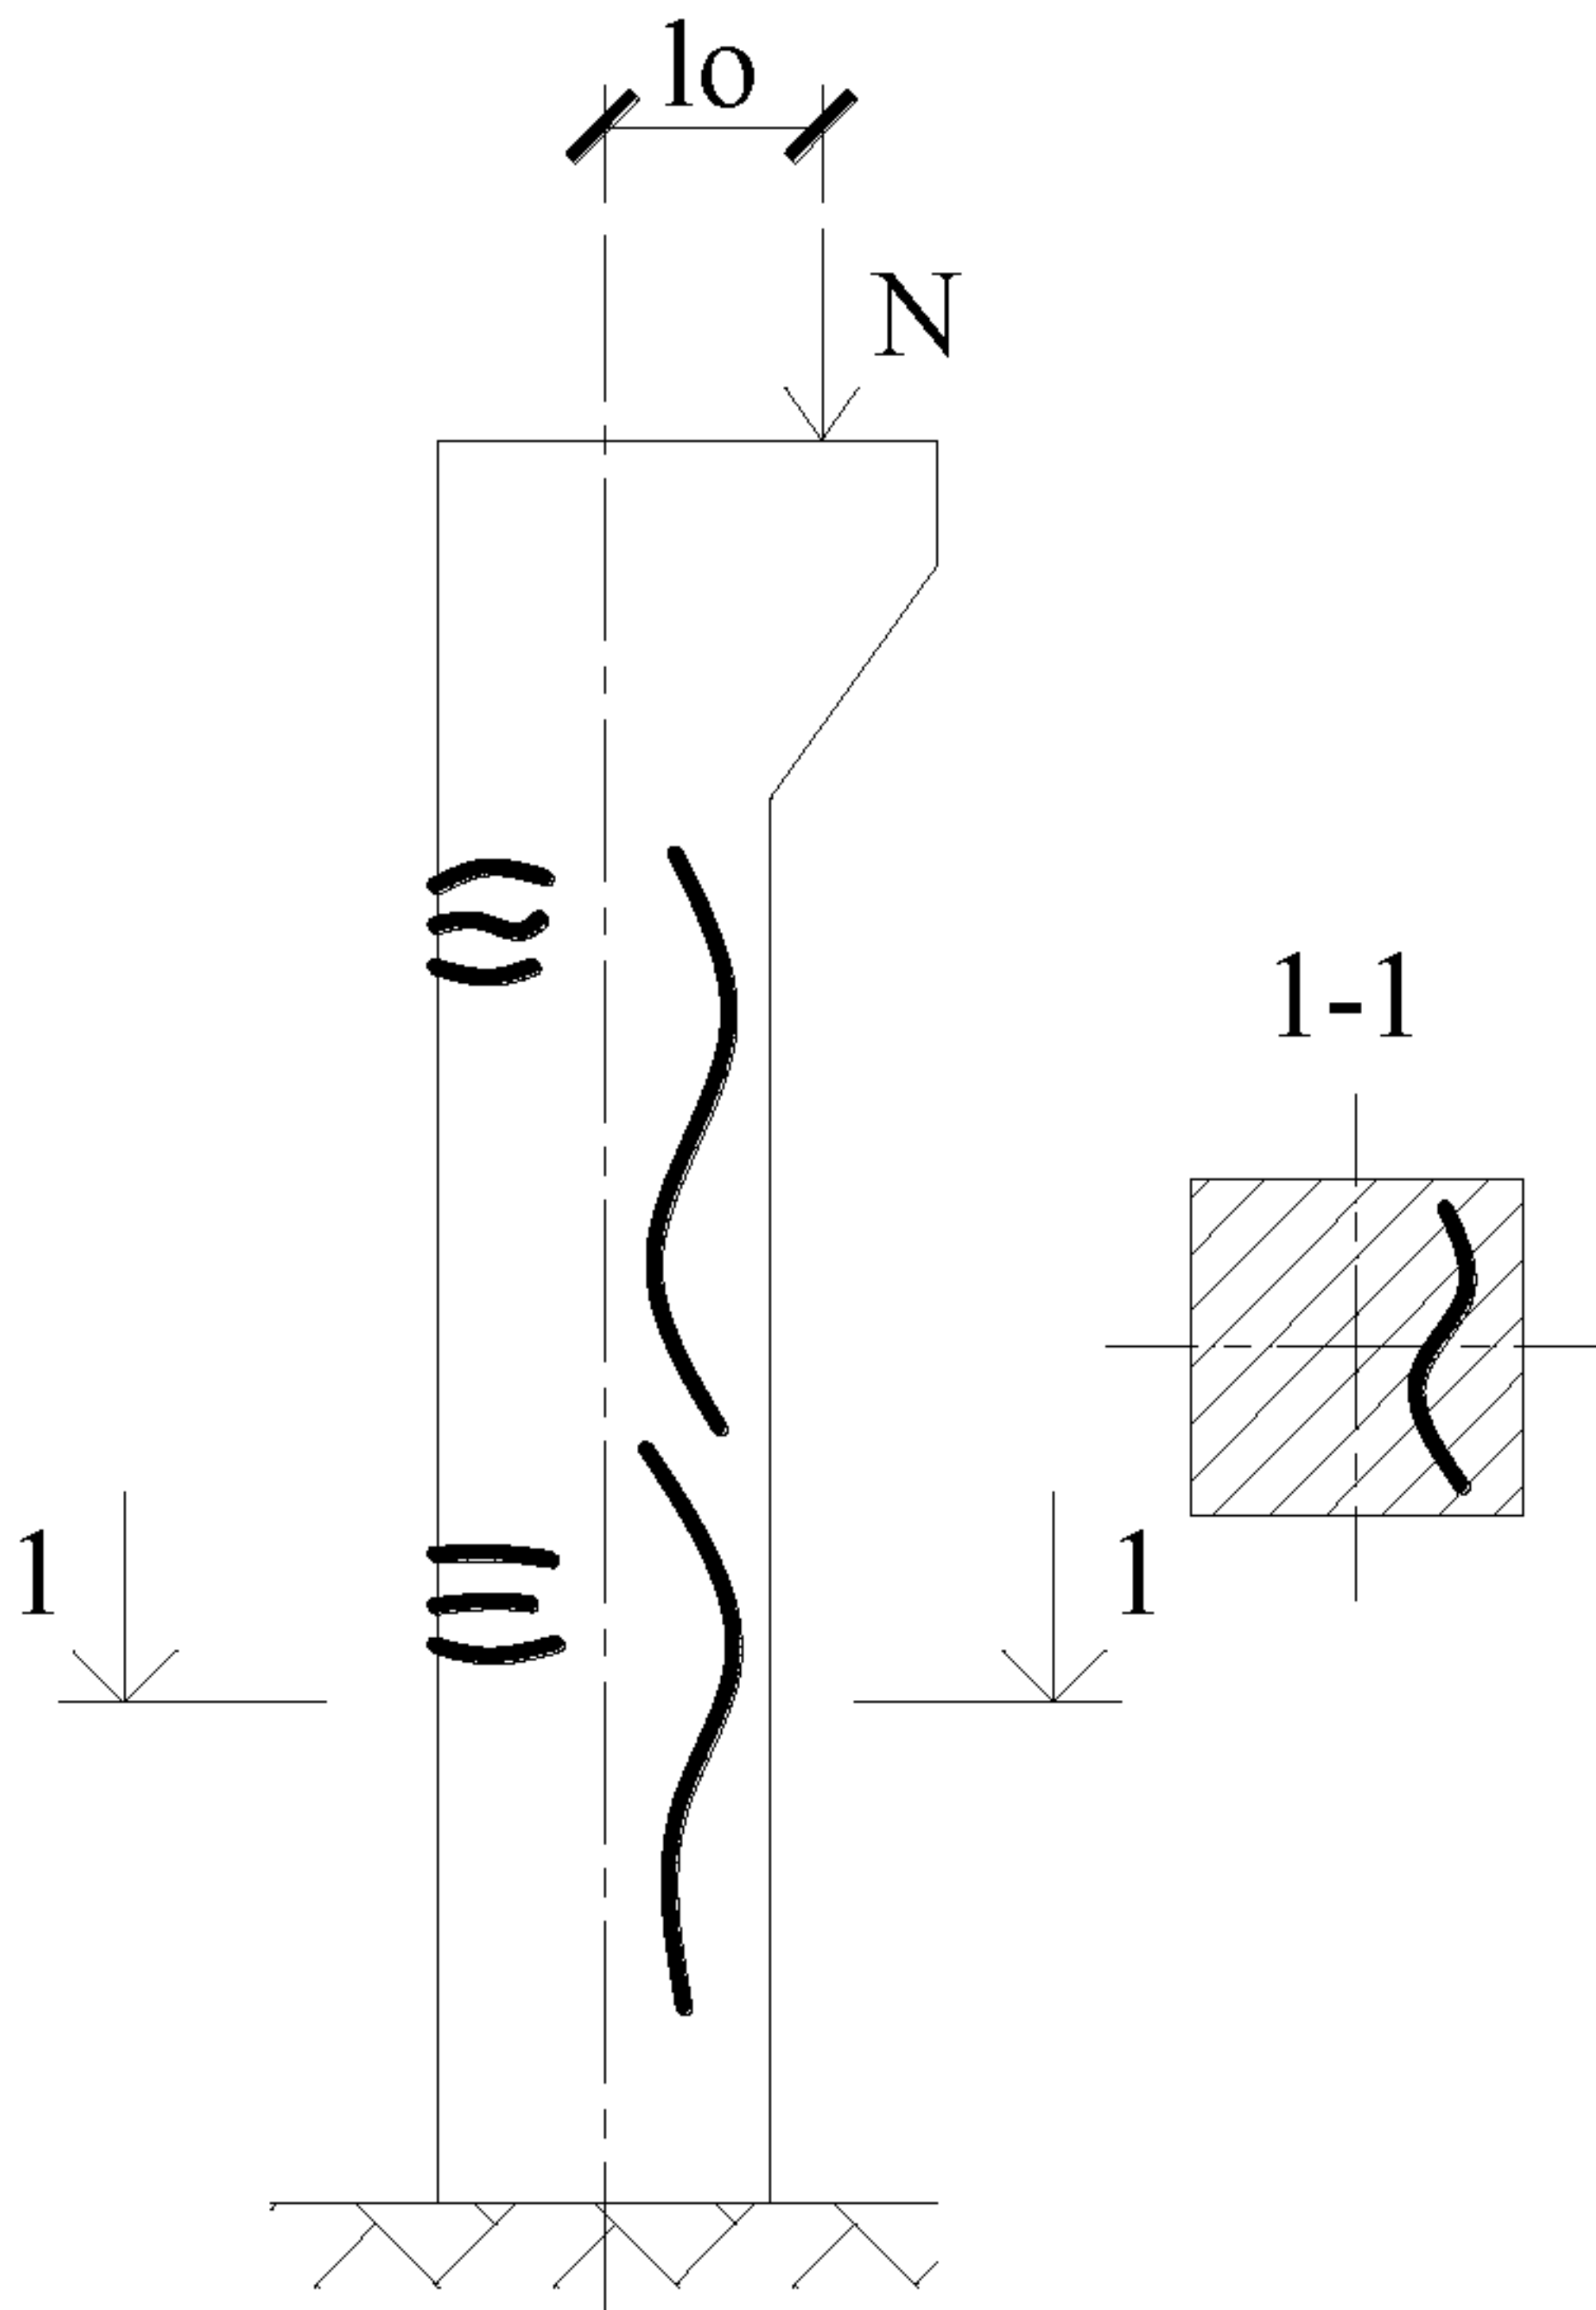
Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
4		Продольные трещины в сжатой зоне.	Перегрузка при малых эксцентриситетах, увеличение l_0 может возникнуть при перевозке или складировании; снижение прочности бетона; уменьшение диаметра сжатой арматуры вследствие коррозии.	Требуется произвести усиление колонны по расчету.

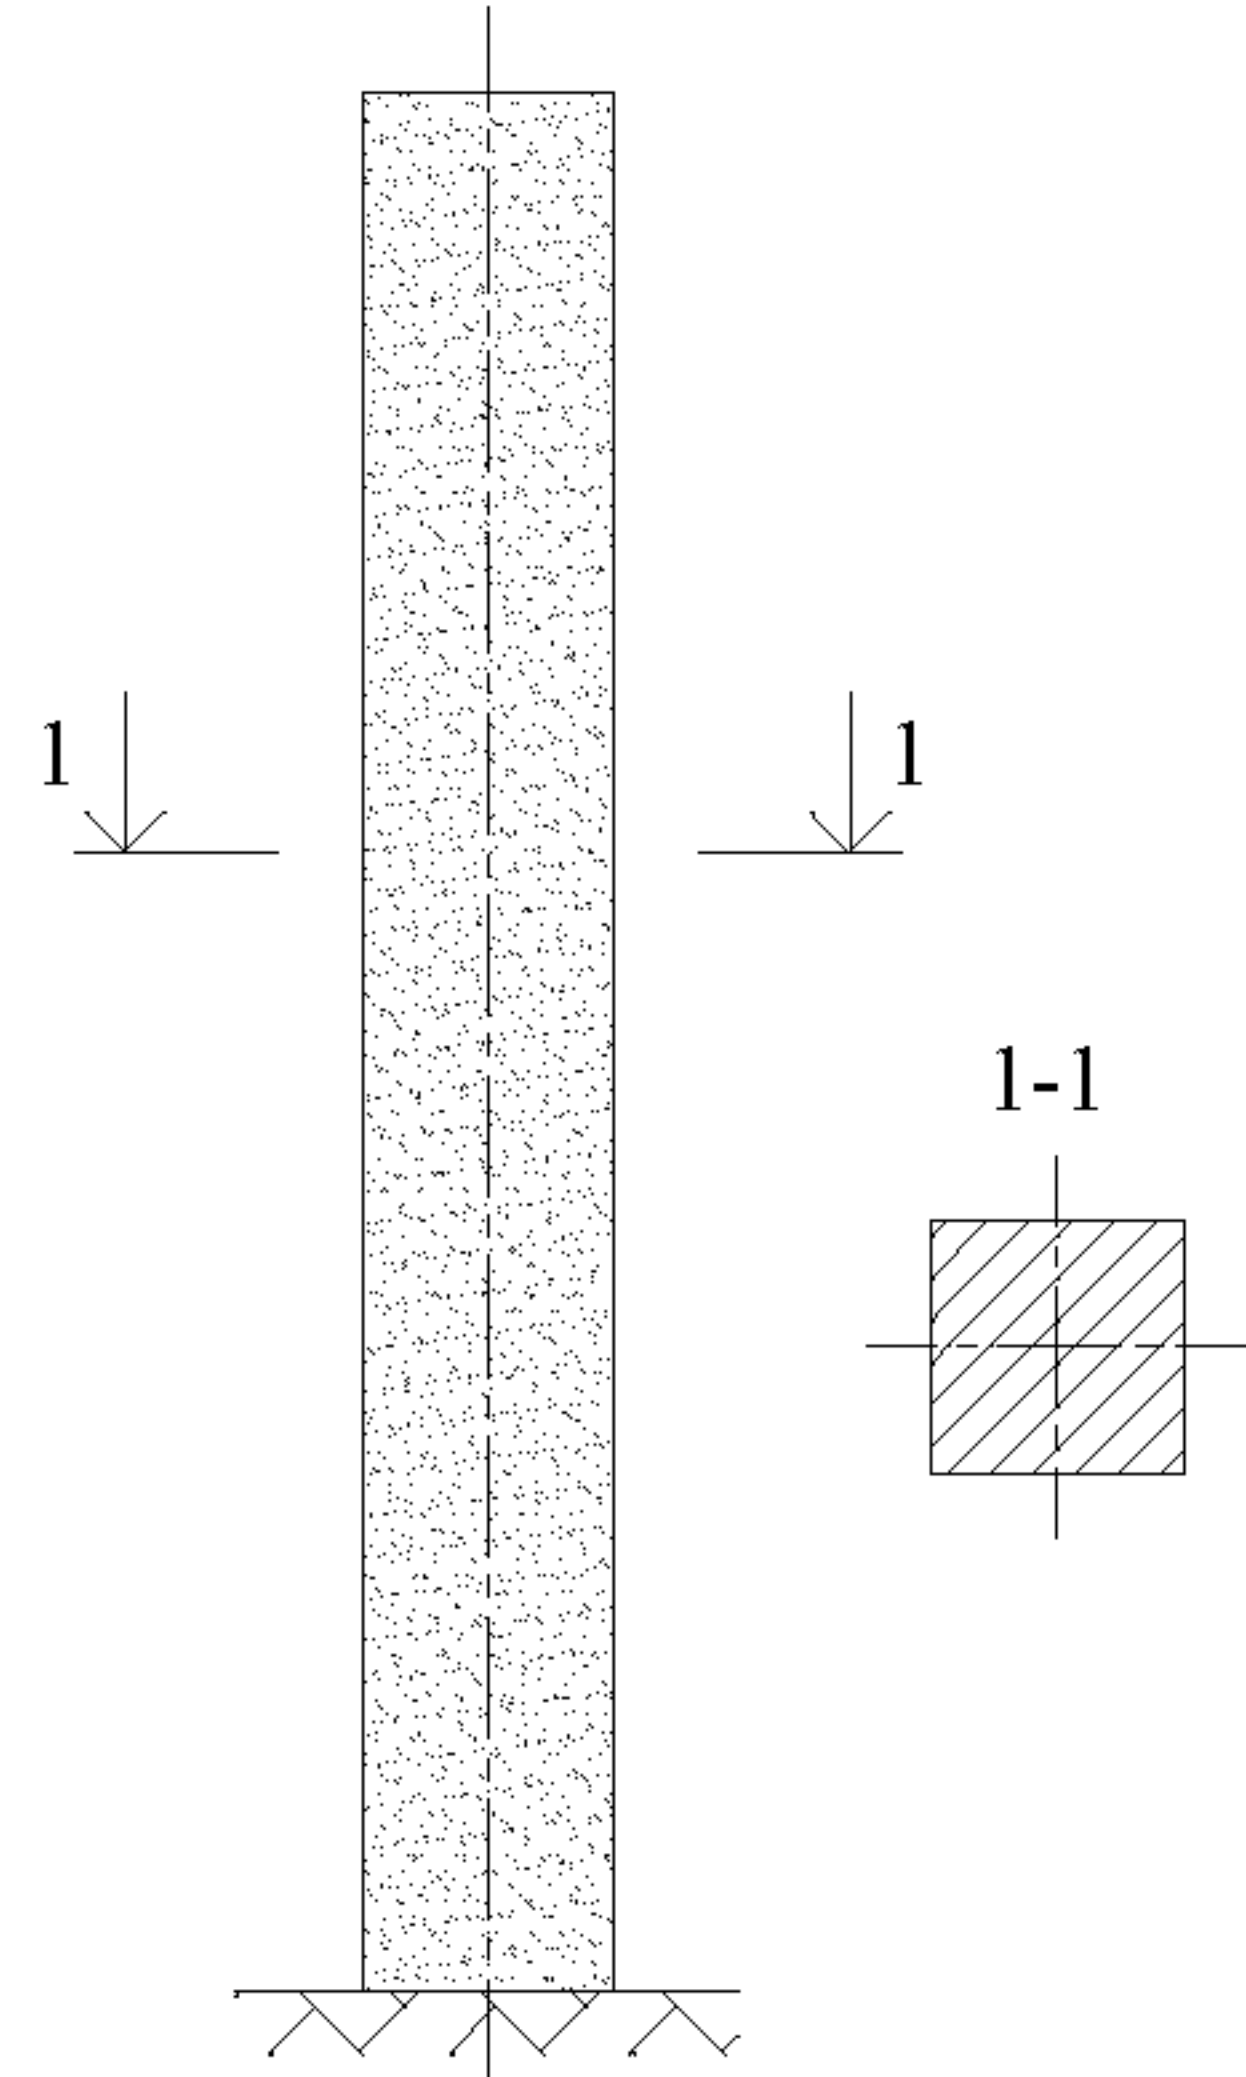
Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
5		Сколы бетона на ребрах.	Механические повреждения при перевозке и эксплуатации; коррозия арматуры; огневые воздействия.	Необходимо восстановить сколотые участки и произвести усиление по расчету.

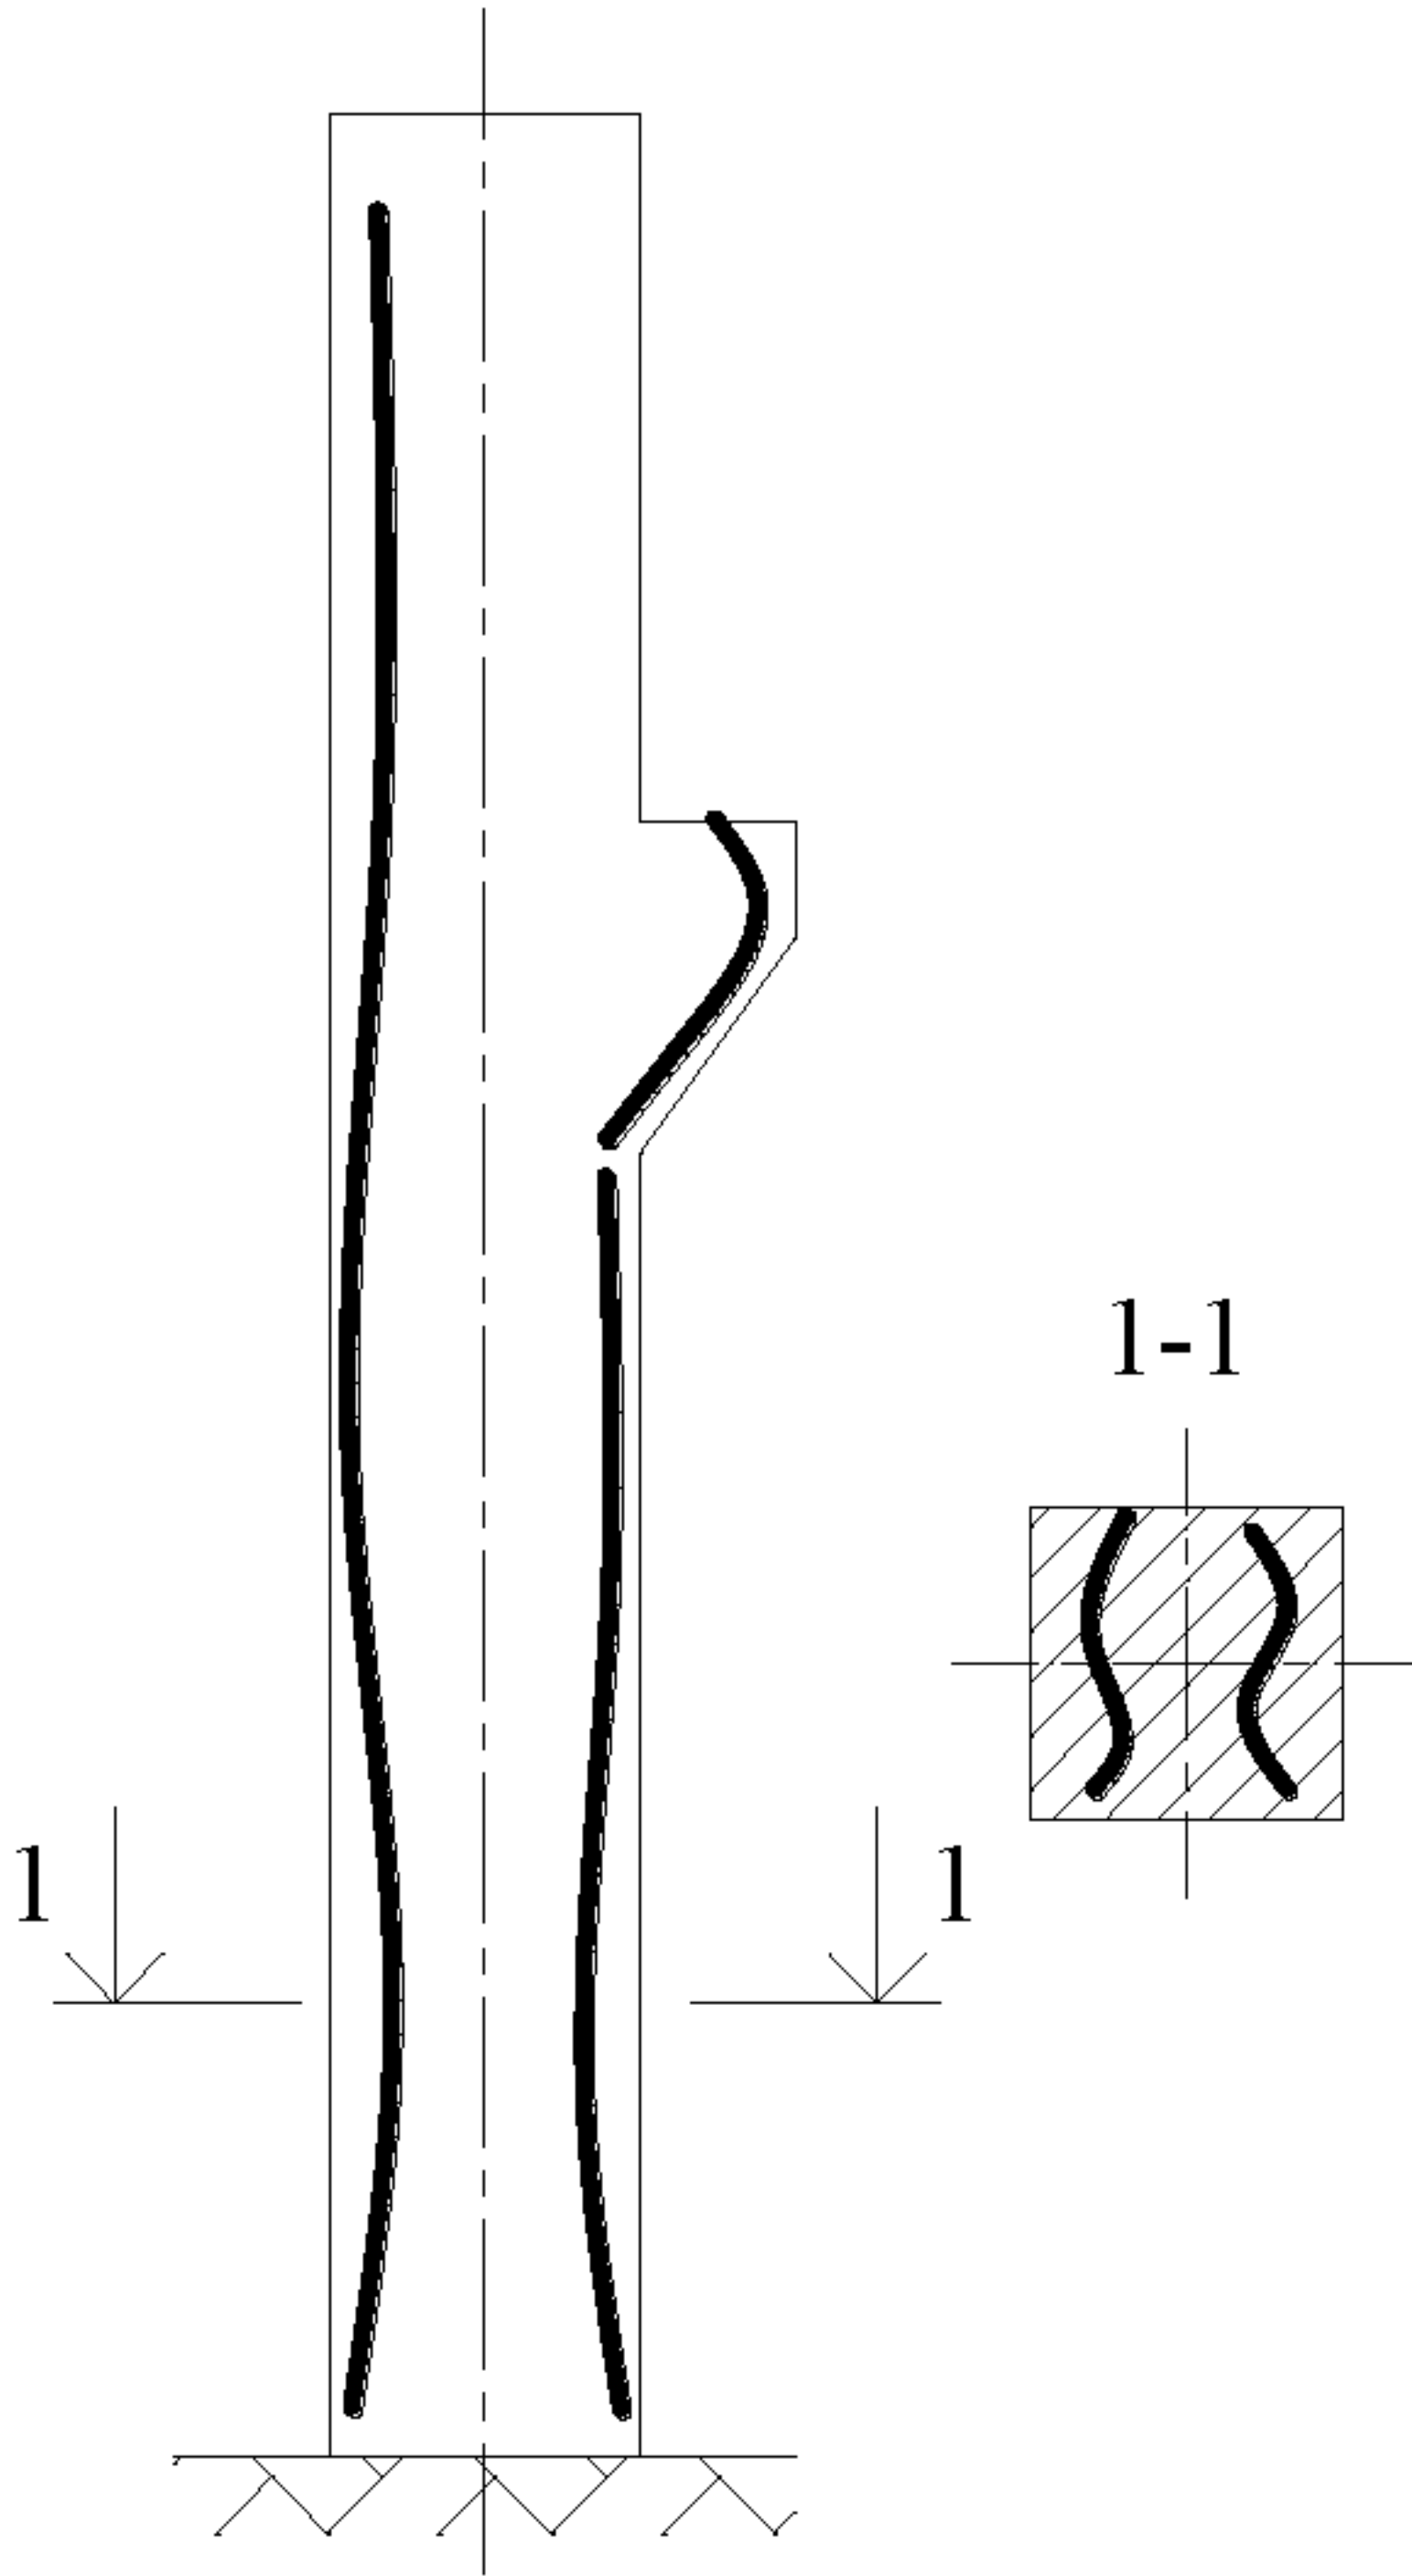
Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
6		Нормальные трещины в растянутой зоне, продольные трещины в сжатой зоне.	Перегрузка при больших эксцентриситетах, увеличение l_0 ; снижение прочности бетона; уменьшение диаметра сжатой арматуры вследствие коррозии. Может возникнуть во время перевозки и складирования.	Необходимо произвести усиление колонны по расчету.

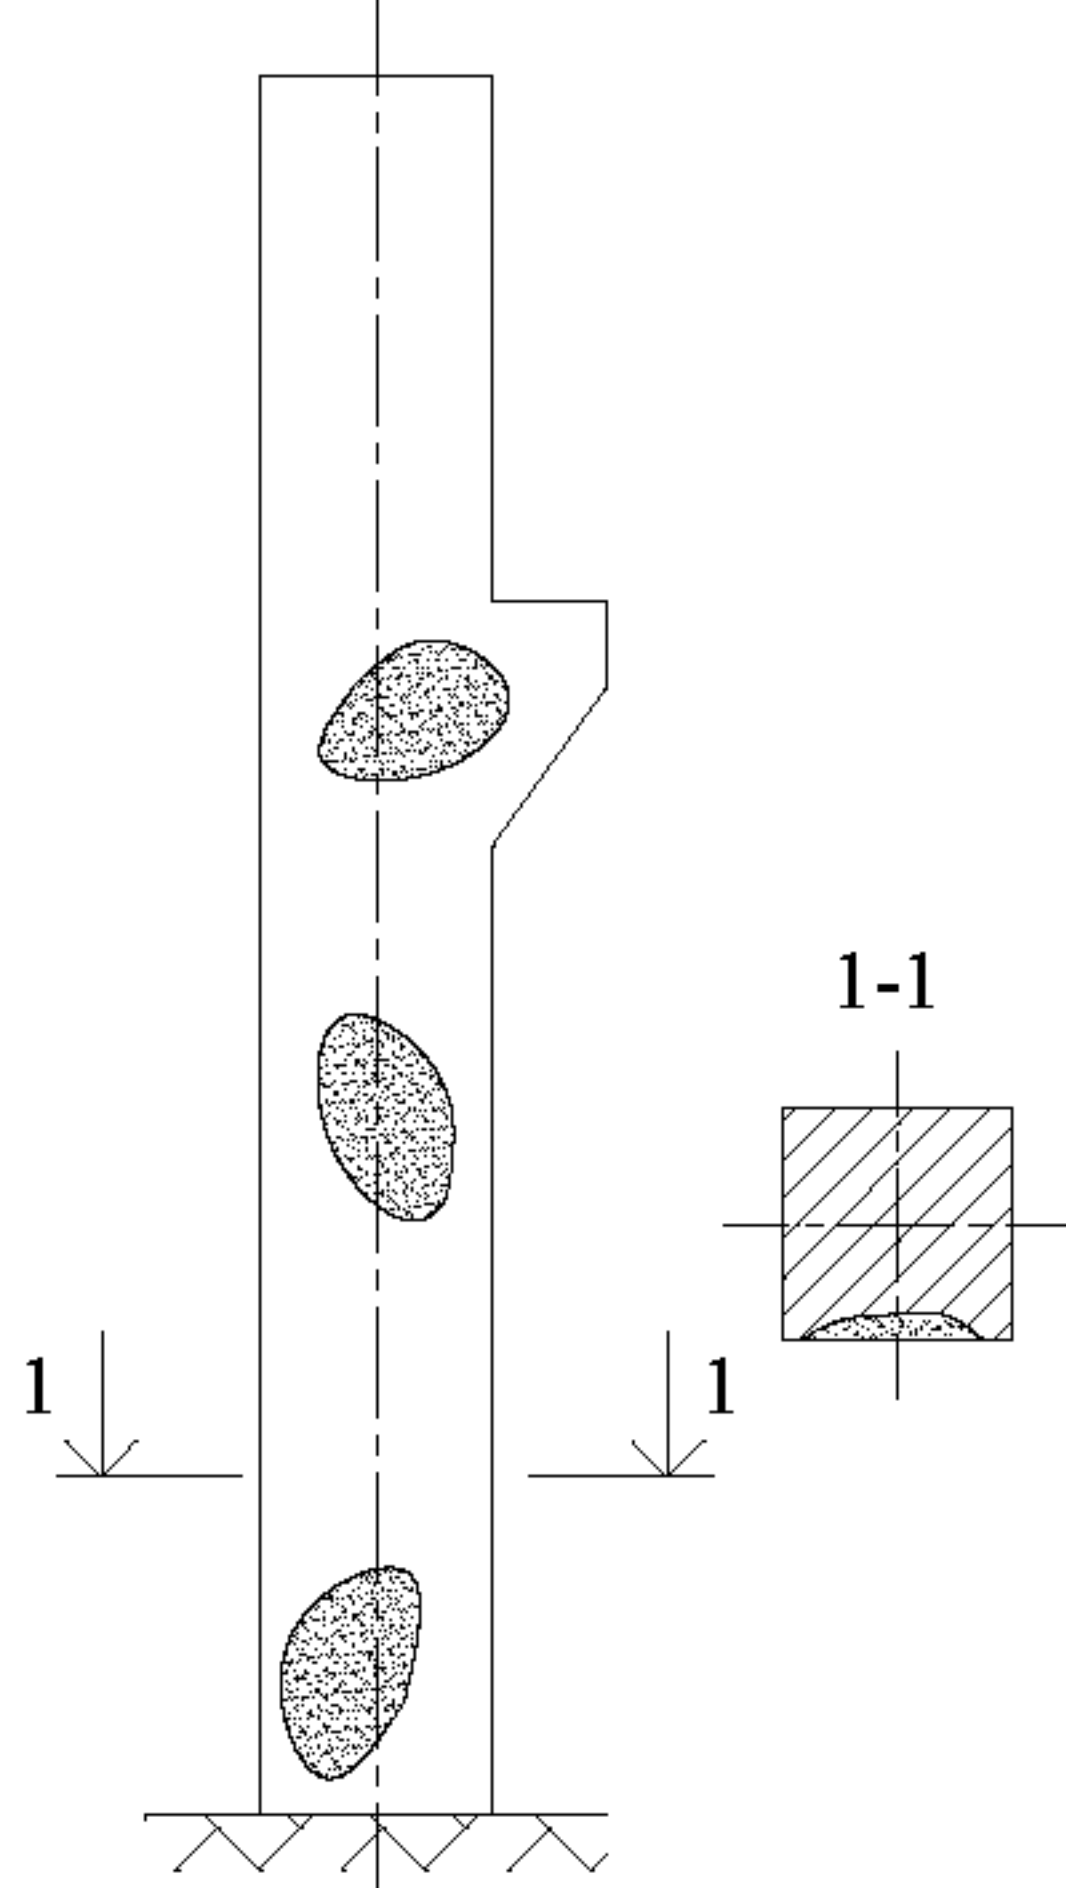
Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
7		Повреждение поверхности бетона.	Воздействие агрессивных сред; попеременное замораживание/оттаивание или увлажнение/высыхание.	Необходимо защитить от агрессивного воздействия среды; восстановить поверхность бетона.

Продолжение таблицы А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
8		Трещины вдоль арматуры, ржавые подтеки.	Коррозия арматуры вследствие нарушения защитного слоя бетона и воздействия агрессивных сред. Может возникнуть при длительном хранении.	Требуется восстановить защитные слои бетона; защитить арматуру от коррозии; усилить колонны по расчету.

Окончание таблицы А.1

№ п/п	Эскиз	Описание дефекта	Причины возникновения	Примечания
9		Отслоившиеся кусочки бетона.	Огневое воздействие при пожаре; давление новообразований (солей, льда).	Необходимо восстановить поврежденные участки; усилить колонны по расчету.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Выбор крана для монтажа колонн

Б.1 Исходными данными при выборе кранов являются габариты и объемно-планировочное решение здания, параметры и рабочее положение грузов, технология монтажа, условия производства работ. При этом рассматриваются как базовые модели кранов, так и их модификации с различными видами сменного оборудования, приведенные в приложении Д СТО НОСТРОЙ 2.7.55.

Б.2 Выбору предшествует определение организационных методов монтажа, характеризующих направление и последовательность установки элементов, уясняются места расположения и схемы движения кранов.

Б.3 Выбор башенного крана производят путем определения трех основных предельных технических параметров: грузоподъемности, высоты подъема крюка и вылета стрелы.

Расчетная схема показана на рисунке Б.1.

Б.3.1 Грузоподъемность Q , т, определяется по формуле

$$Q = q_{эл} + q_{снл}, \quad (Б.1)$$

где $q_{эл}$ – масса наиболее тяжелого элемента, т,

$q_{снл}$ – суммарная масса строповочного устройства, монтажных приспособлений, элементов усиления, т.

Б.3.2 Высота подъема крюка H , м, определяется по формуле

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4, \quad (Б.2)$$

где h_1 – высота последнего монтажного горизонта от уровня стоянки крана, м,

h_2 – высота подъема элемента над опорой ($h_2 = 1$ м),

h_3 – высота (толщина) элемента, м,

h_4 – высота строповки, м.

Б.3.3 Вылет стрелы L , м, определяется по формуле

$$L = B + b + 1, \quad (Б.3)$$

где B – ширина здания, м,

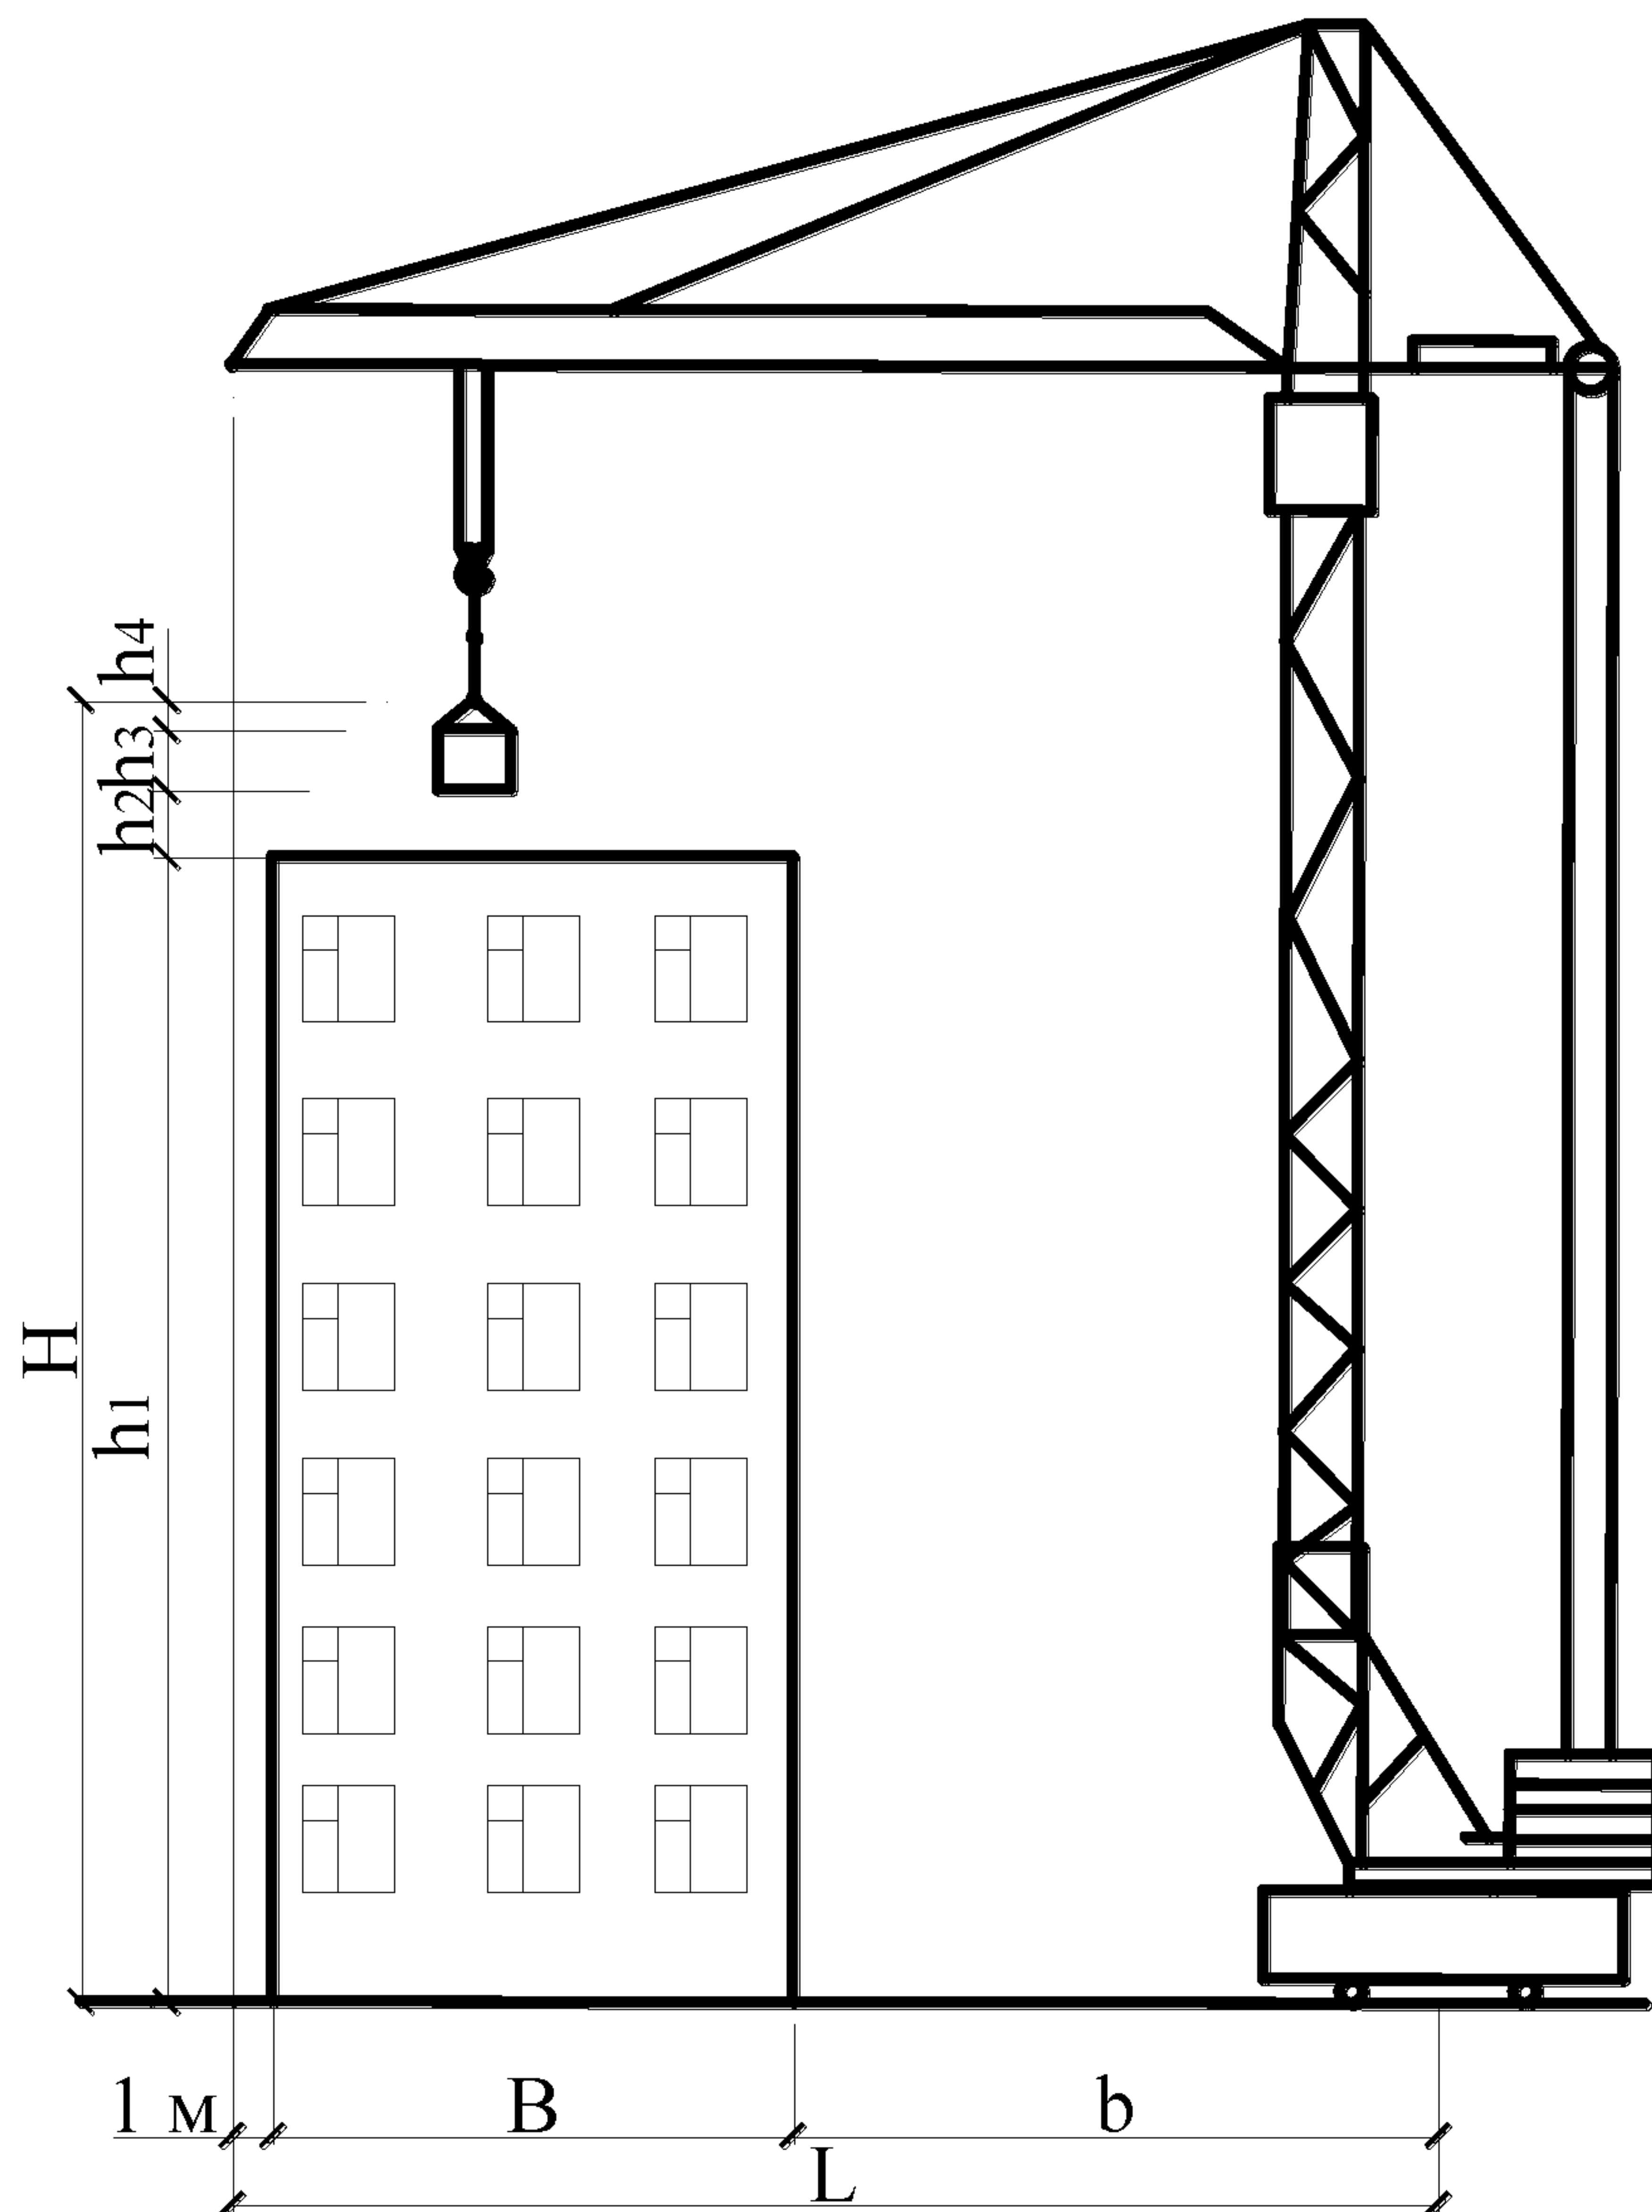
b – расстояние от здания до оси рельсового пути, рассчитанное из условия обеспечения безопасного расстояния (не менее 1 м) от здания до наиболее выступающей

части крана, м.

Б.4 После предварительного выбора крана в соответствии с данной схемой определяют вылеты при монтаже критических элементов (самого тяжелого, самого удаленного и др.) и по графику грузоподъемности выбранного крана проверяют возможность монтажа указанных элементов.

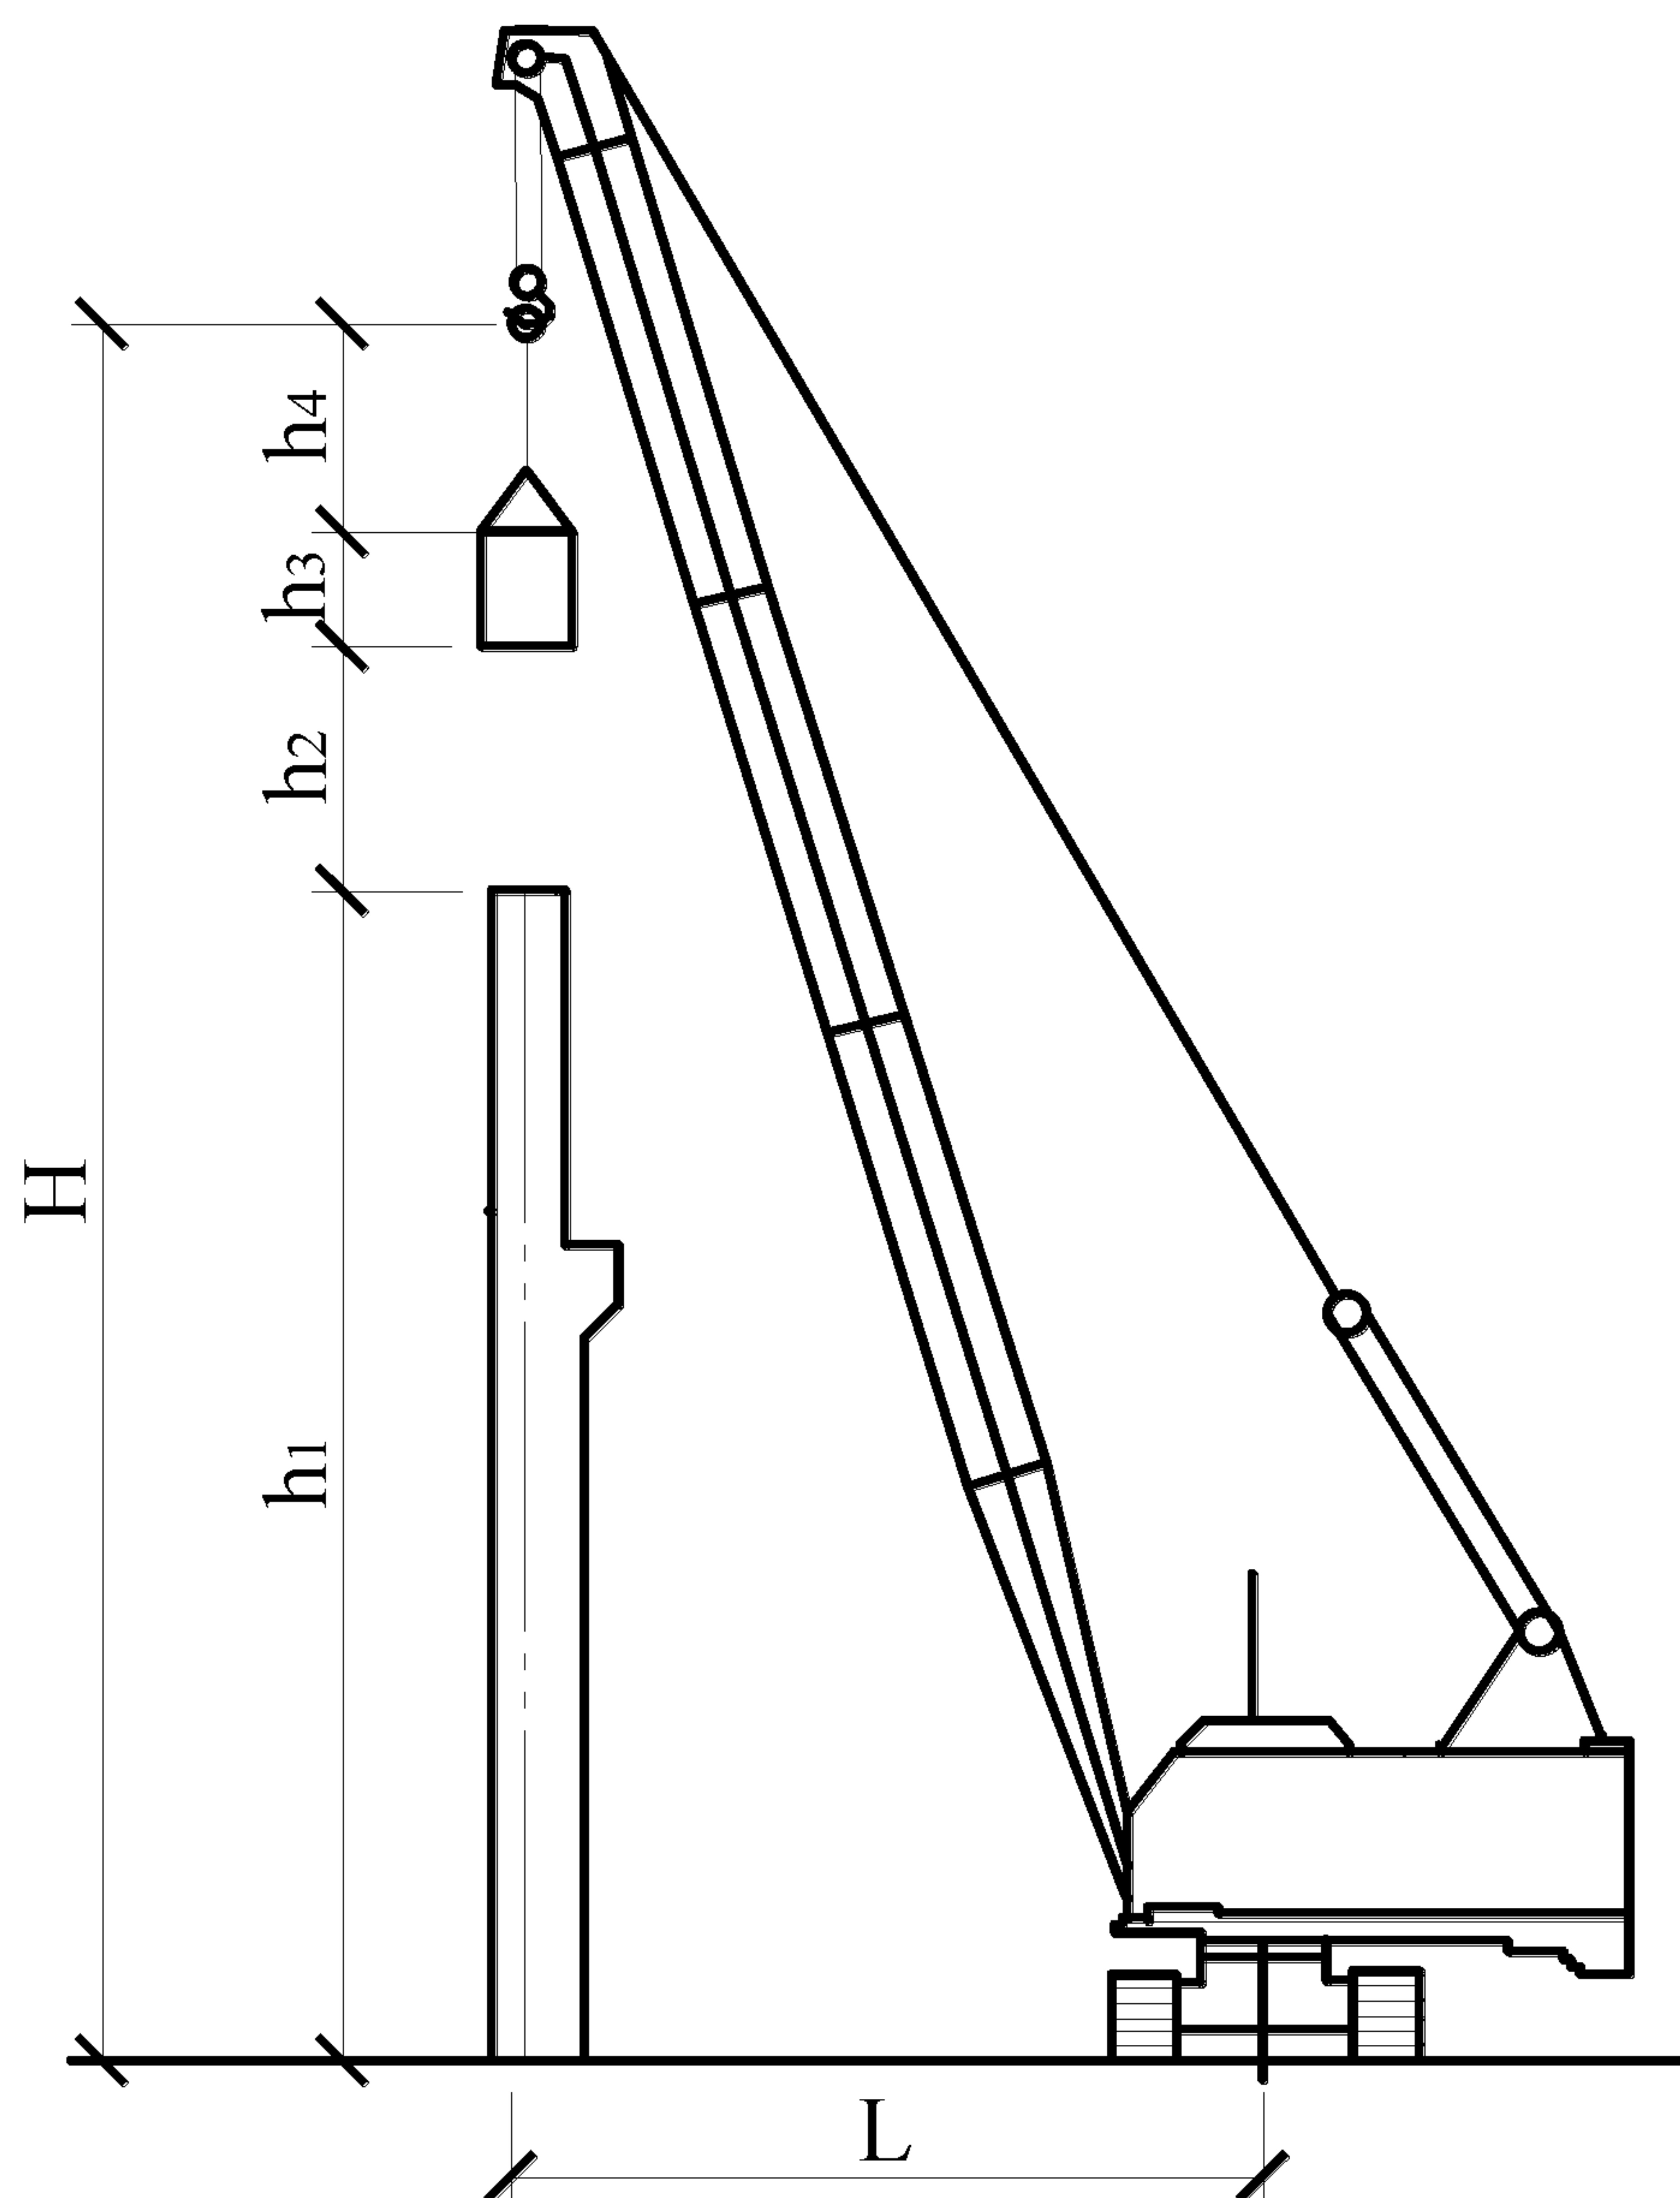
Б.5 Выбор самоходного стрелового крана для монтажа ригелей и балок, являющимися открытыми конструкциями, осуществляют по двум параметрам – грузоподъемности и высоте подъема крюка, которые определяют также, как при выборе башенного крана (формула Б.1 и Б.2 соответственно). Вылет крана при этом близок к минимальному значению, при котором кран имеет минимальный запас по грузоподъемности и обеспечивает лучшие экономические показатели монтажного процесса.

Расчетная схема выбора крана показана на рисунке Б.2.



H – высота подъема крюка, h_1 – высота последнего монтажного горизонта от уровня стоянки крана, h_2 – высота подъема элемента над опорой ($h_2 = 1$ м), h_3 – высота (толщина) элемента, h_4 – высота строповки, B – ширина здания, b – расстояние от здания до оси рельсового пути, рассчитанное из условия обеспечения безопасного расстояния (не менее 1 м) от здания до наиболее выступающей части крана, L – вылет стрелы.

Рисунок Б.1 – Расчетная схема для выбора башенного крана



H – высота подъема крюка, h_1 – высота последнего монтажного горизонта от уровня стоянки крана, h_2 – высота подъема элемента над опорой ($h_2 = 1$ м), h_3 – высота (толщина) элемента, h_4 – высота строповки, L – вылет стрелы.

Рисунок Б.2 – Расчетная схема выбора крана для монтажа открытых конструкций

Приложение В

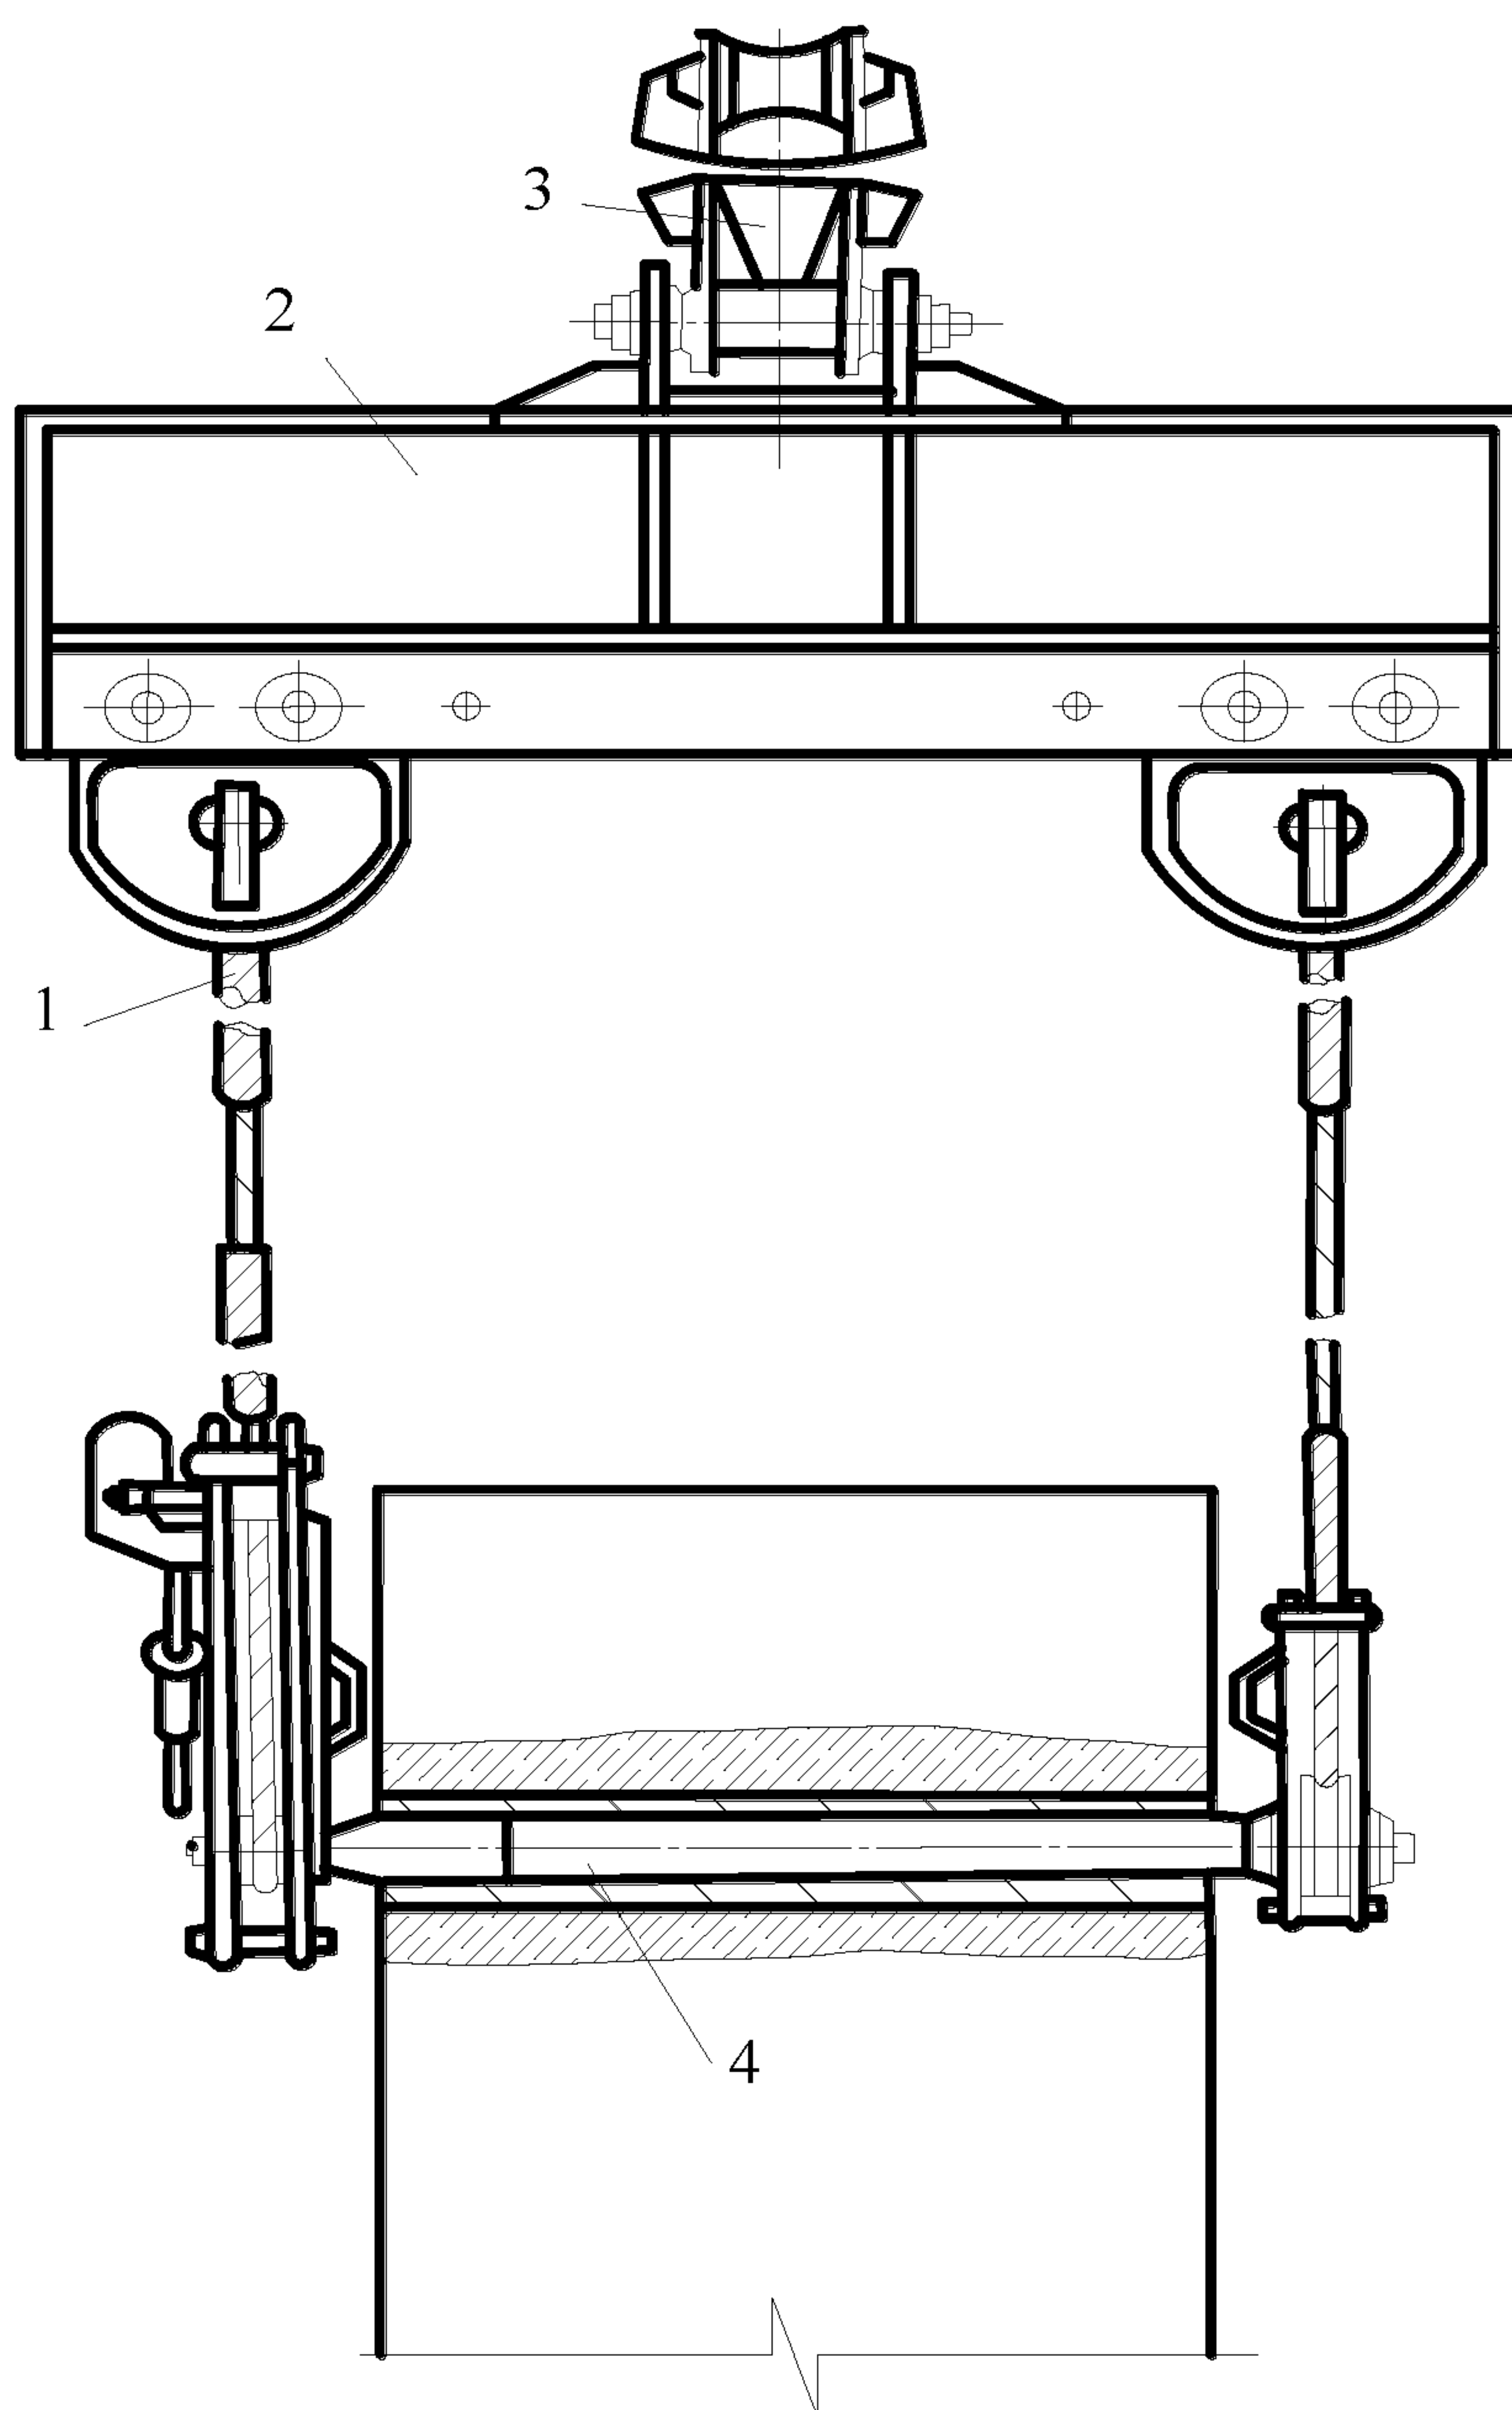
(рекомендуемое)

Строповочные приспособления для монтажа колонн

В.1 Главными требованиями к строповочным устройствам для монтажа колонн является необходимость автоматической или дистанционной расстроповки колонн с монтажного горизонта и обеспечение вертикального положения колонны при подъеме.

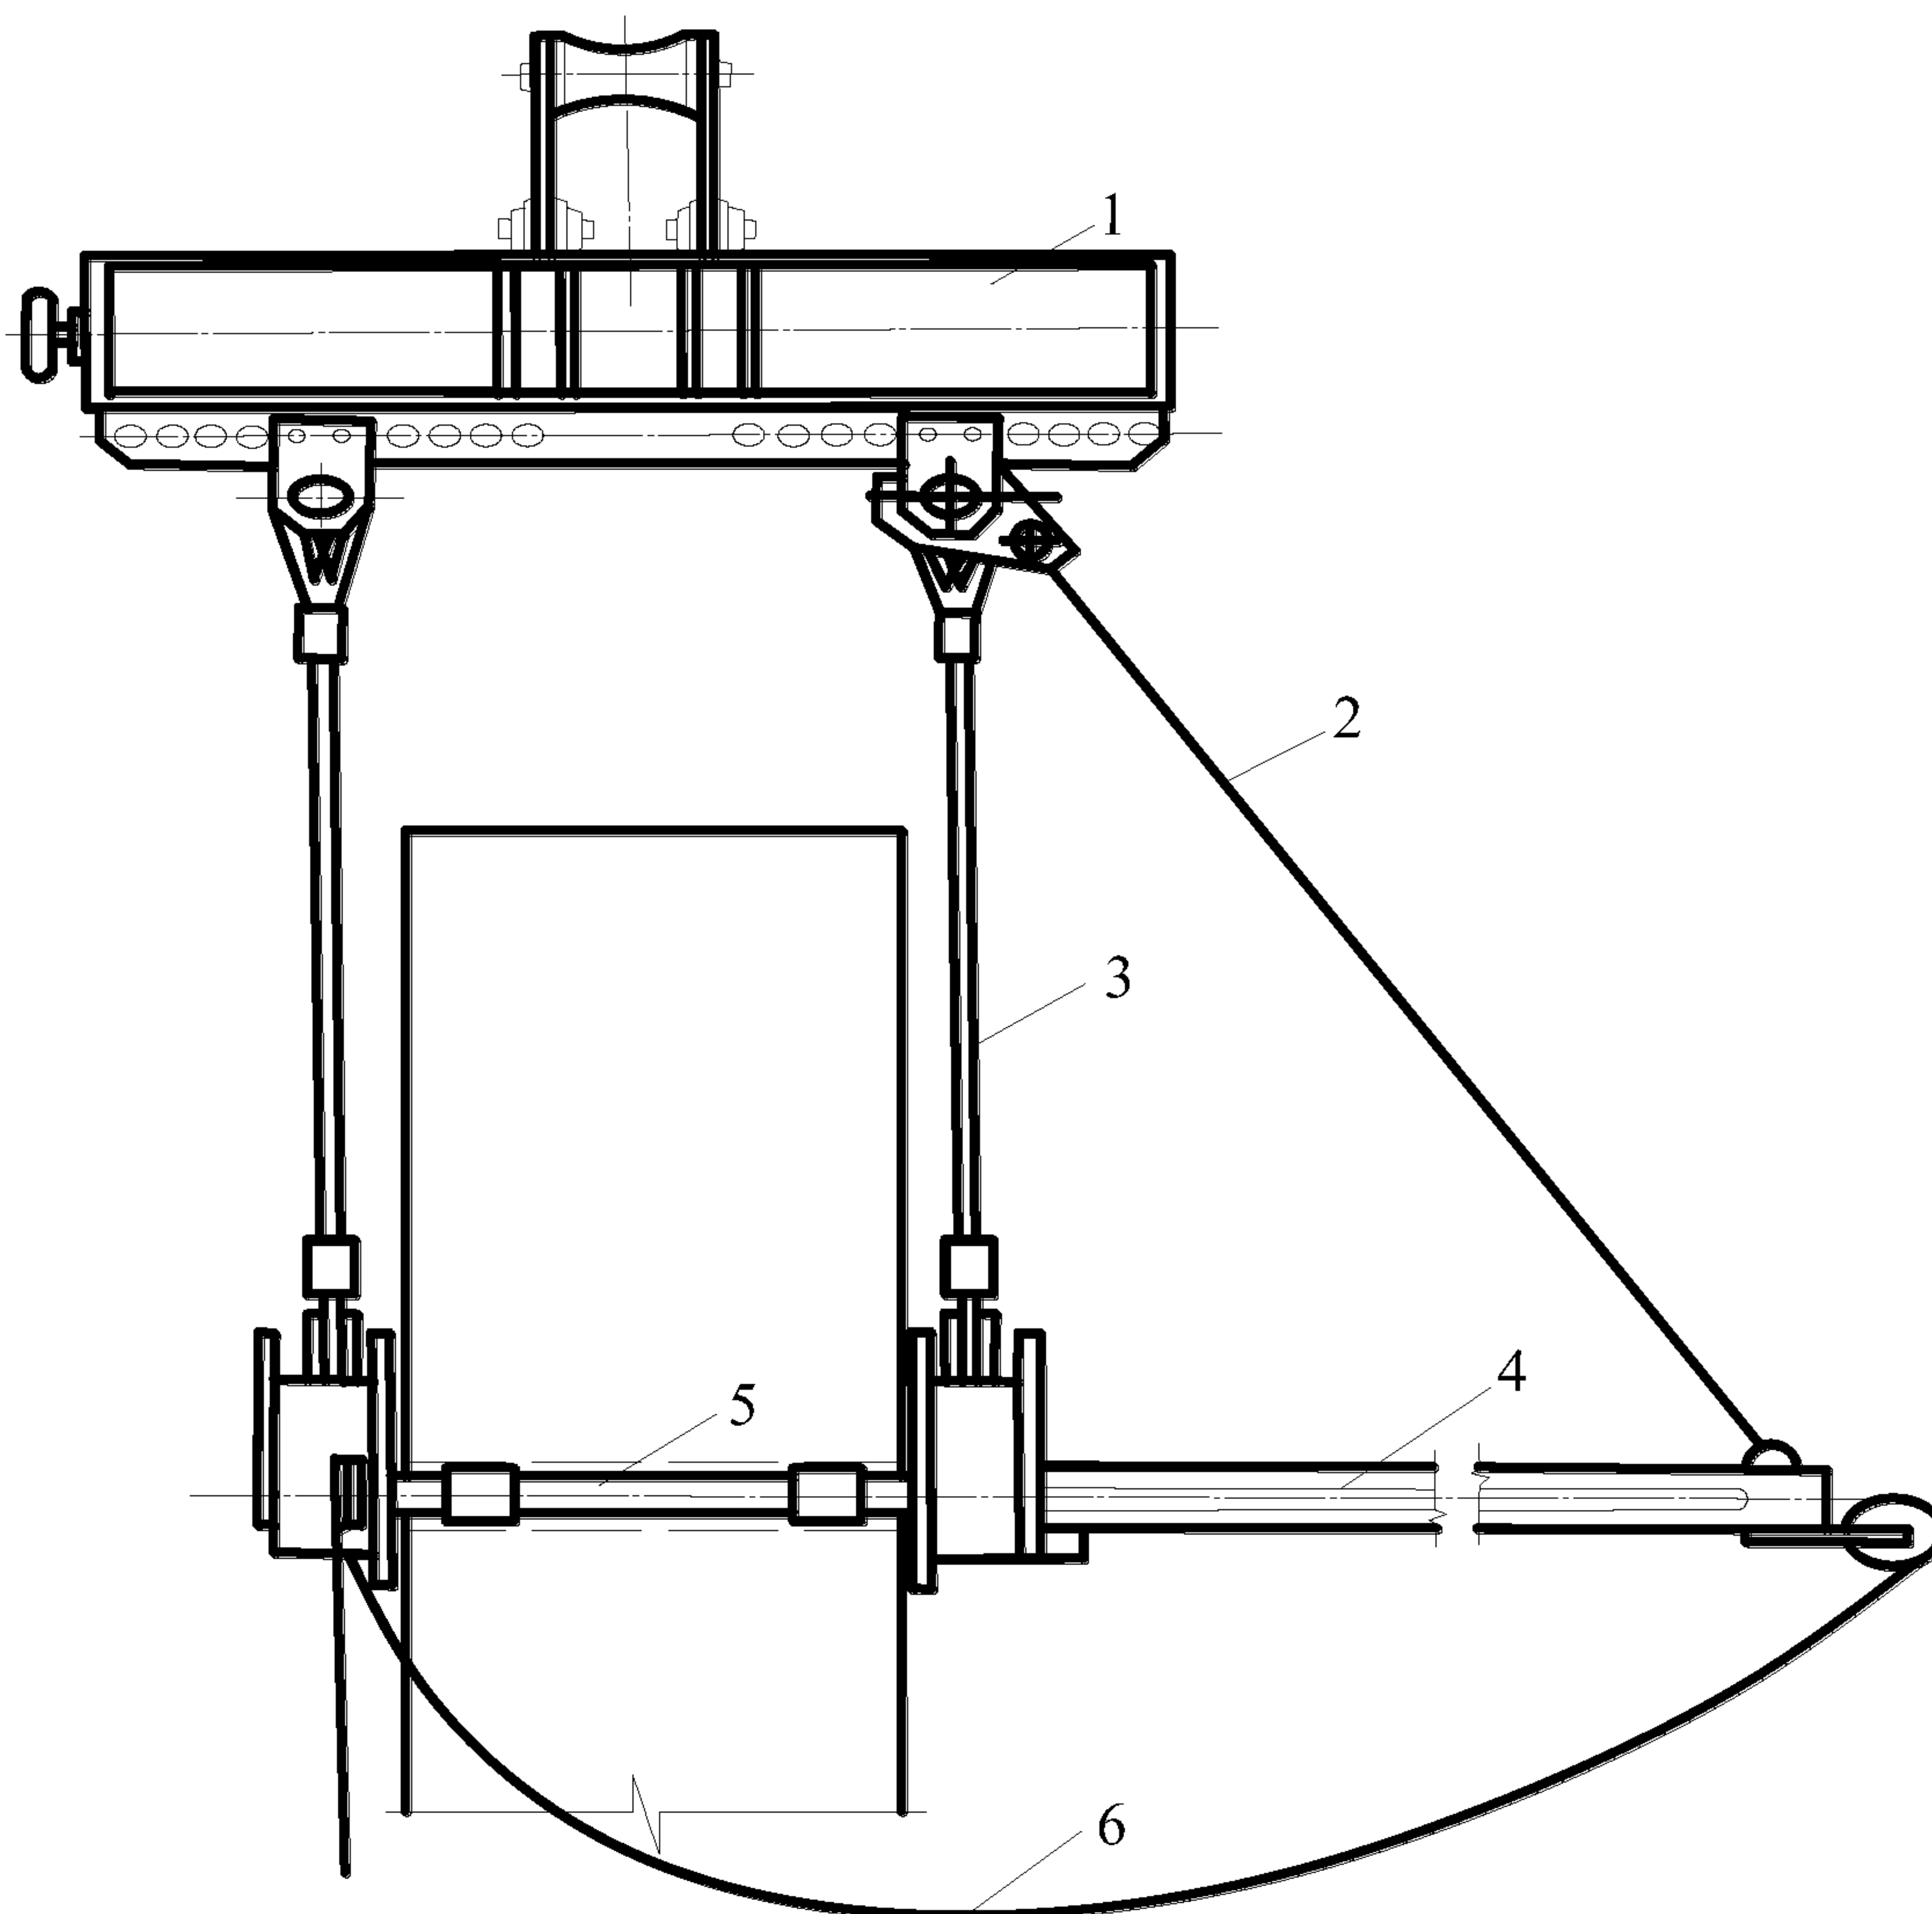
В.2 При наличии в колонне специальных строповочных отверстий используют унифицированные траверсы с пальцевым захватом и штырьевым замком с устройством для дистанционной расстроповки (см. рисунок В.1), а также захваты с расстроповочным канатом (см. рисунки В.2; В.3).

В.3 Для подъема колонн с консолями используют рамочные захваты различных конструкций. Рамочный захват с двумя рамками позволяет выполнить расстроповку с монтажного горизонта путем опускания нижней разъемной рамки после временного закрепления колонны. Рамочный П-образный захват с замыкающей планкой (см. рисунок В.4) снабжен канатом для дистанционной расстроповки.



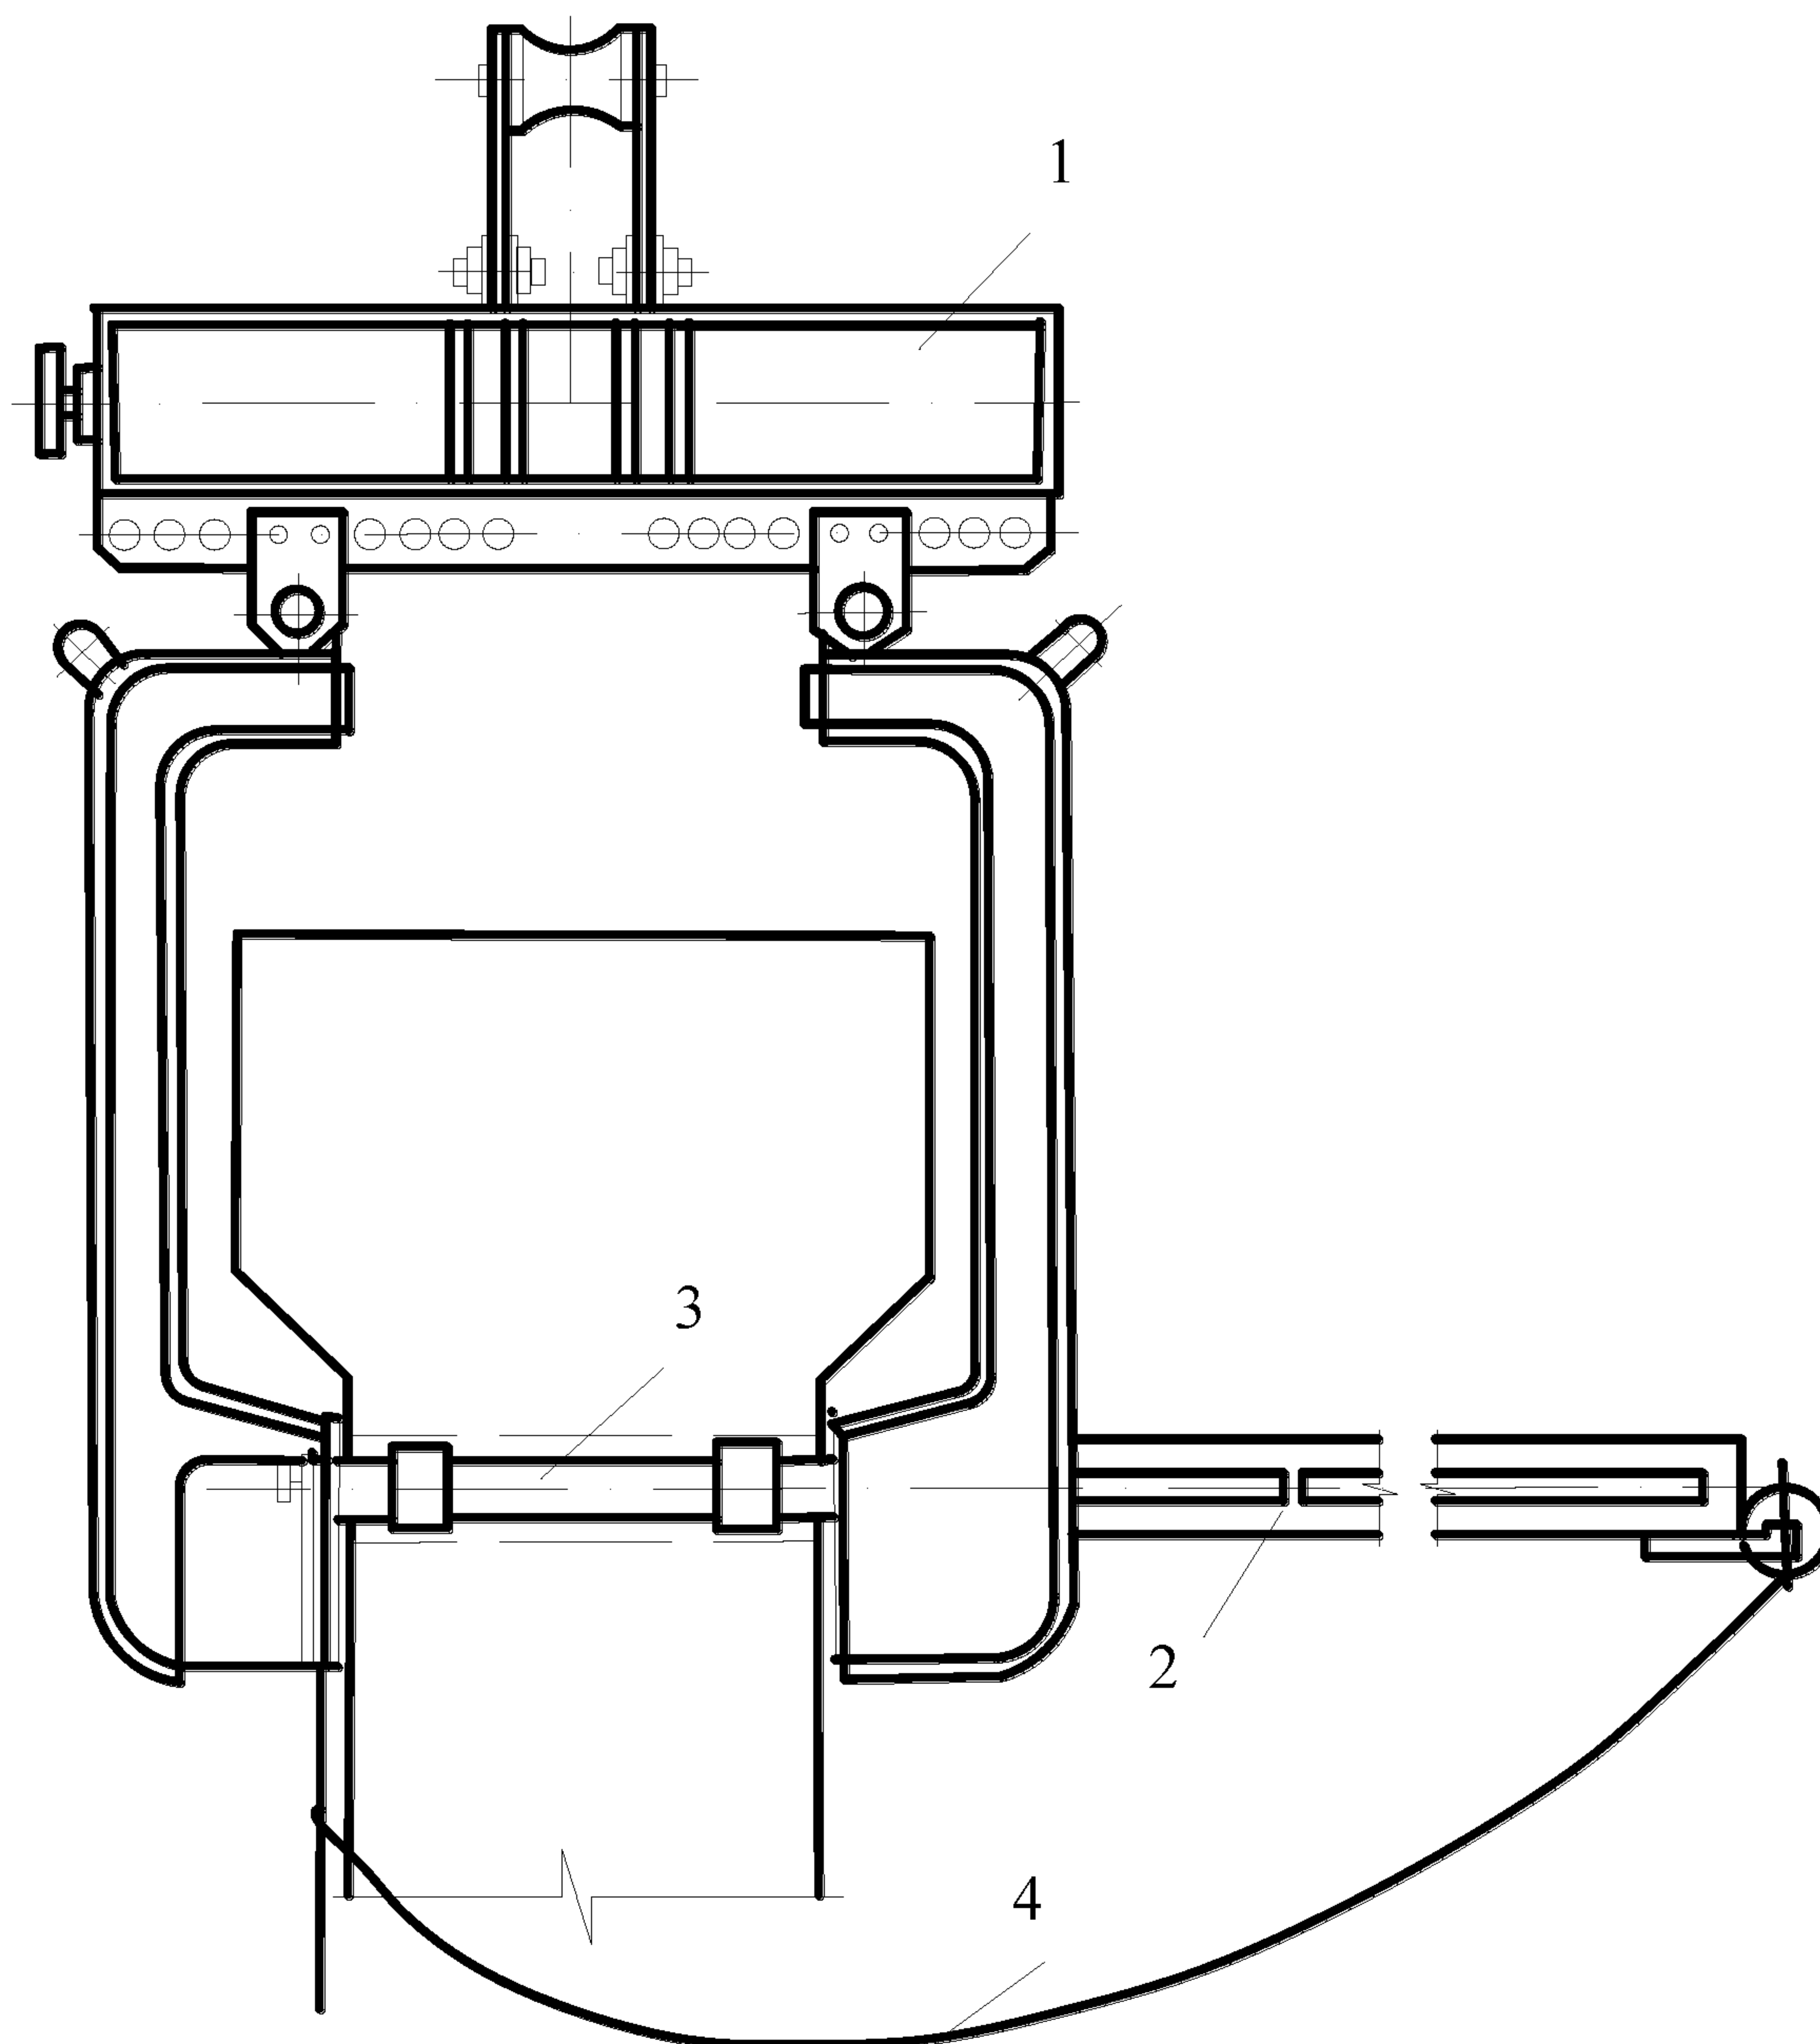
1 – строп, 2 – балка, 3 – подвеска, 4 - палец

Рисунок В.1 – Унифицированная траверса для монтажа колонн



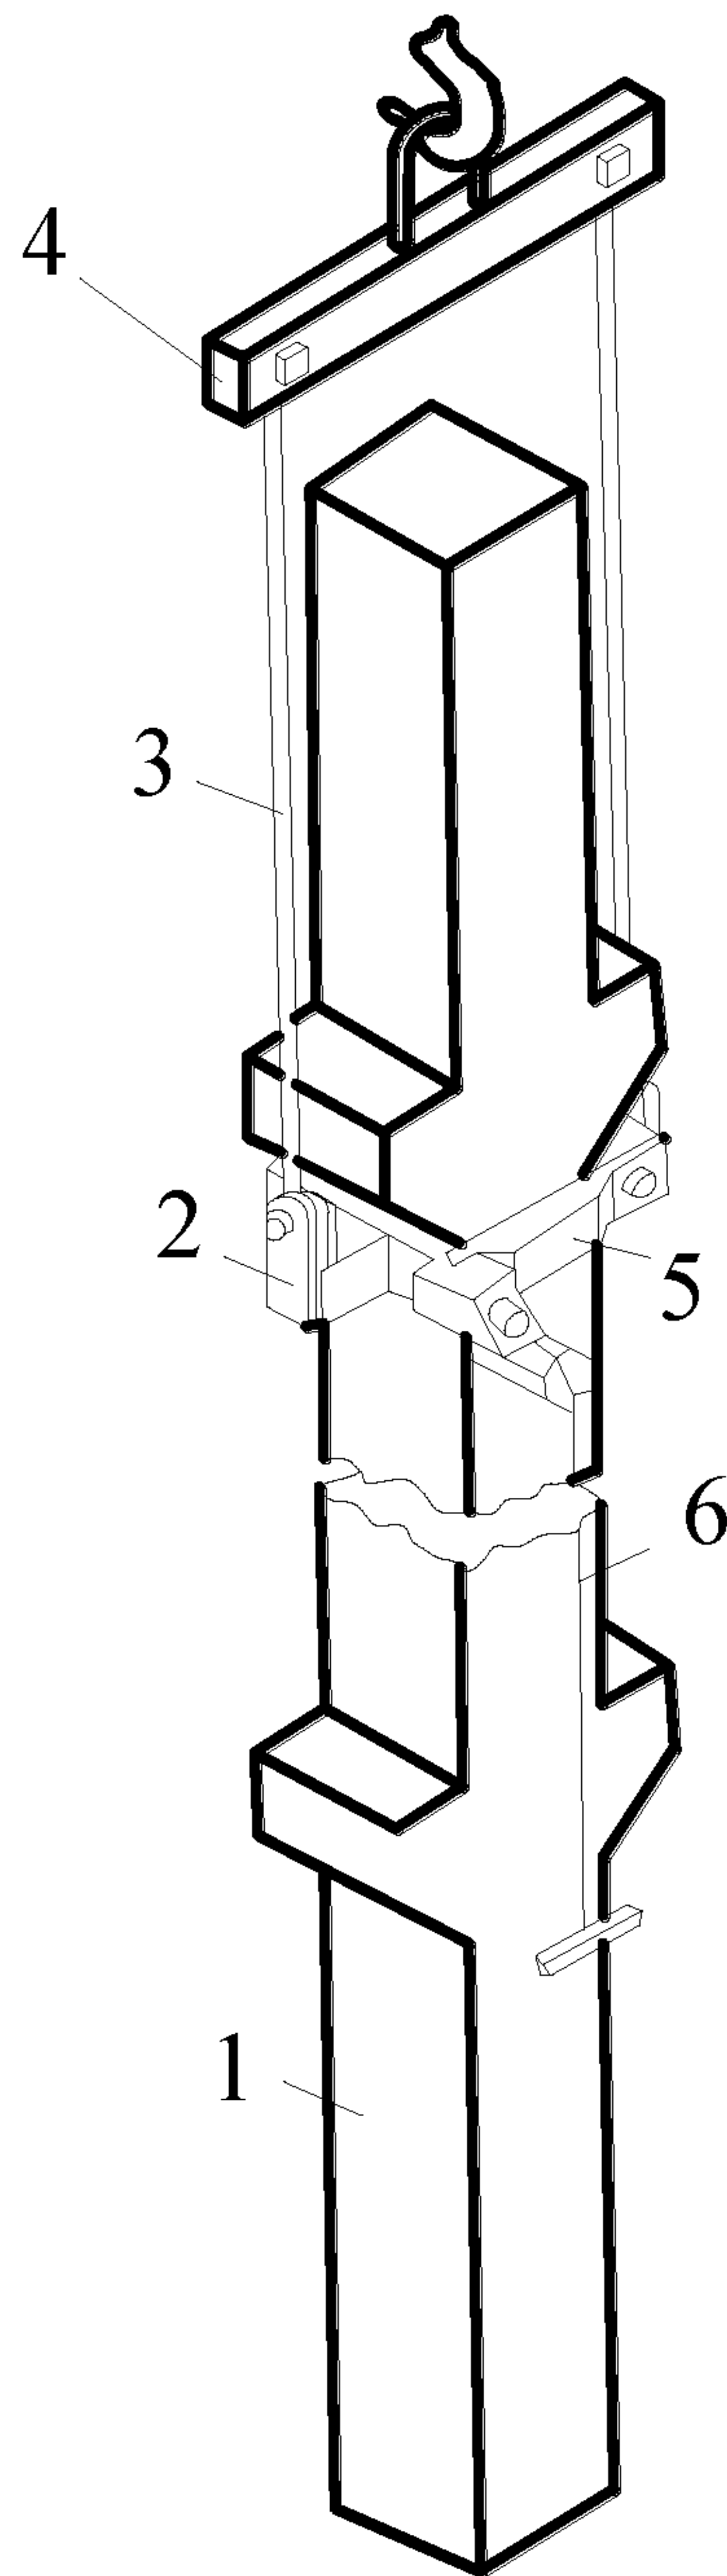
1 – универсальная траверса; 2 – натяжная цепь; 3 – несущий канат; 4 – направляющий штырь; 5 – несущий палец; 6 – расстроповочный канат

Рисунок В.2 – Захват для монтажа прямоугольных колонн



1 – универсальная траверса, 2 – направляющий штырь, 3 – несущий палец, 4 – расстроповочный канат

Рисунок В.3 – Захват для монтажа прямоугольных колонн с расширенной головкой.



1 – колонна, 2 – П-образная рама, 3 – строп, 4 – траверса, 5 – замыкающая планка 6 – трос дистанционной расстроповки

Рисунок В.4 – Рамочный захват с замыкающей планкой для строповки колонн

Приложение Г

(рекомендуемое)

Устройства для временного закрепления и выверки колонн

Г.1 Комплект монтажного оснащения для установки колонн в стаканы фундаментов (см. рисунок Г.1) серий 1.020.1 (ИИ-04) состоит из клиновых вкладышей, опорных балочек, анкерных устройств, хомутов и подкосов, балансирующего и рамочного захватов. Телескопический подкос длиной 4 м с крюками на концах, фаркопфом и двумя зажимными патрубками для закрепления подкоса к петлям хомута и опорной балочке.

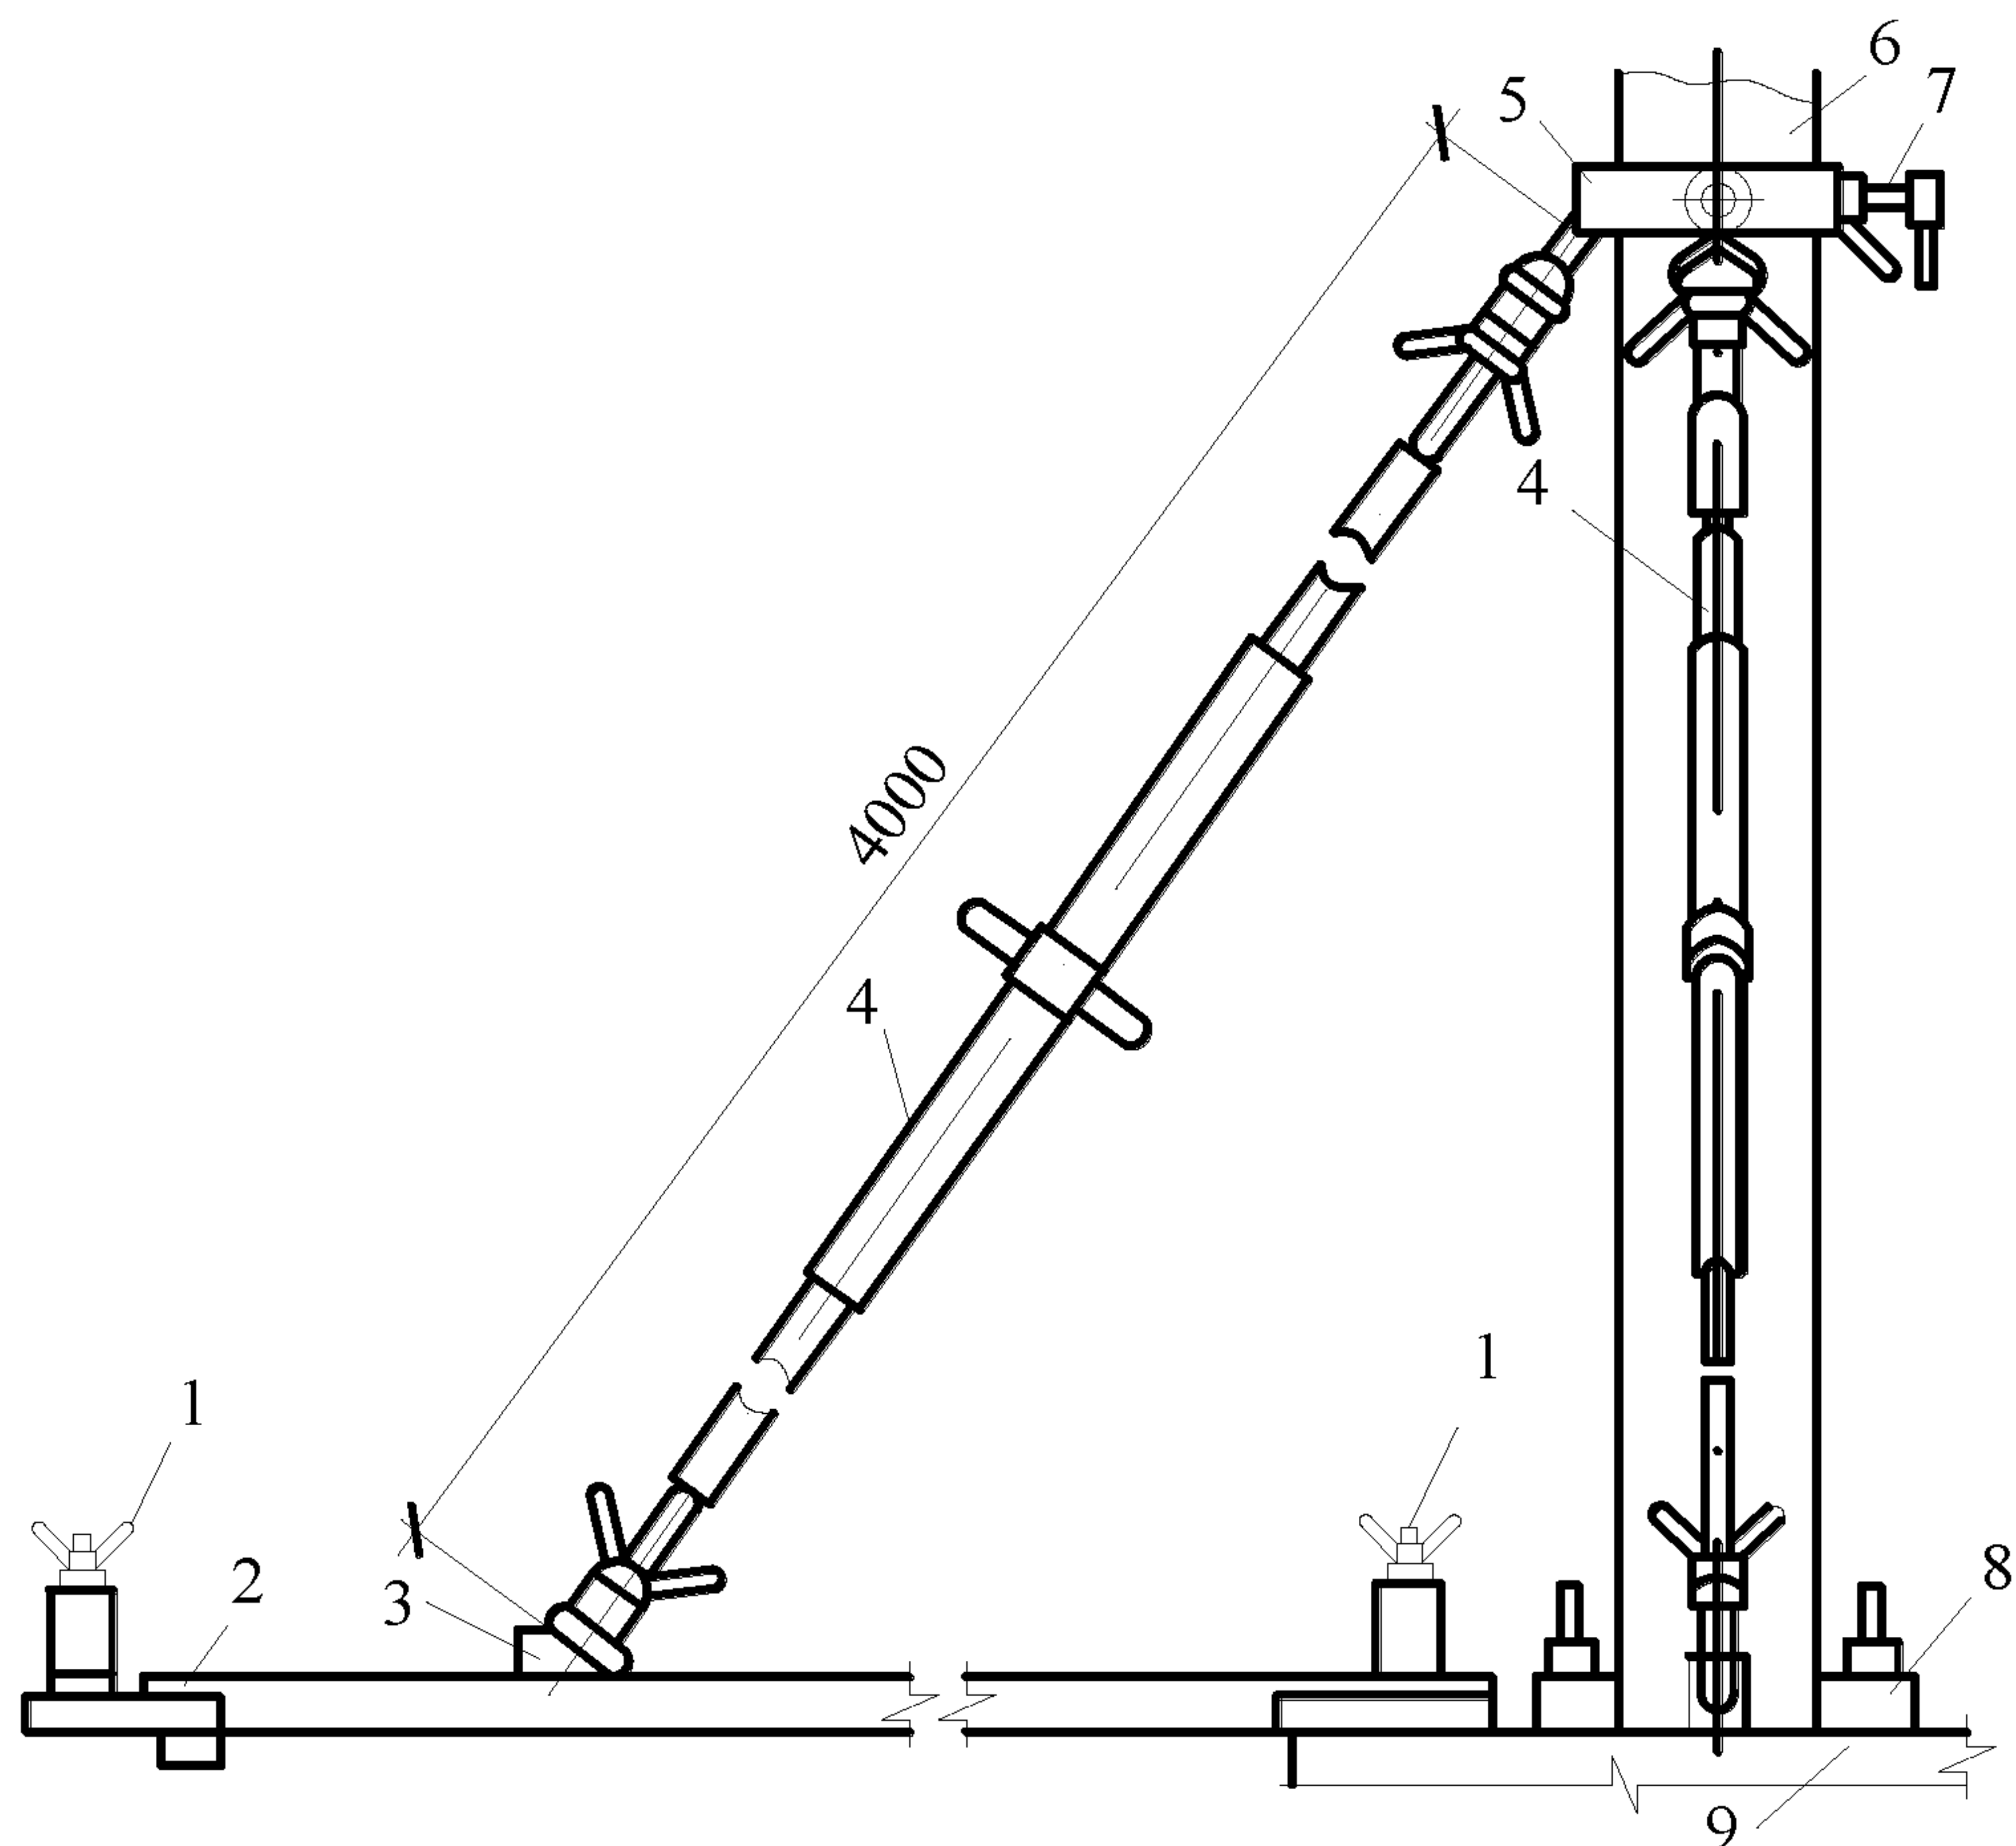
Г.2 Одиночный разъемный кондуктор со стяжными винтами (см. рисунок Г.2) состоит из двух Г-образных полурам, соединенных между собой по диагонали четырьмя парами стяжных винтов и защелки. С каждой стороны кондуктора имеется по четыре ряда винтов, из которых две нижние пары служат для закрепления его на оголовке нижестоящей колонны, а две верхние пары – для выверки и временного закрепления устанавливаемой колонны.

Г.3 Полуавтоматический одиночный кондуктор (см. рисунок Г.3) состоит из двух секций-полурам, соединенных между собой с одной стороны шарниром, а с противоположной стороны замками. На одной полураме укреплены прижимные подпружиненные рычаги и устройства для их запираения и включения. На другой полураме закреплены упорные регулируемые ролики с приспособлениями для изменения их положения, а также неподвижные ролики. Кондуктор с закрытыми замками подают краном на оголовки ранее смонтированной колонны. Под действием массы кондуктора подпружиненные рычаги отжимаются, и кондуктор самоустанавливается, скользя по неподвижным упорным роликам и роликам подпружиненных рычагов. После жесткого закрепления кондуктора в него устанавливают колонну, которая под действием подпружиненных рычагов в процессе опускания занимает положение, близкое к проектному. С помощью регулировочных устройств колонна приводится в проектное положение. Жесткое закрепление колонны производят путем запираения прижимных устройств.

Г.4 Групповой кондуктор для монтажа колонн сечением 400х600 мм и высотой до 17 м (см. рисунок Г.4) состоит из четырех стоек, связанных между собой в четырех уровнях поясами в виде ферм. Устойчивость кондуктора при монтаже обеспечивается за счет крепления его подкосами к монтажным петлям ригелей и плит перекрытия. По периметру в двух уровнях кондуктор оснащен подмостями и поворотными площадками, обеспечивающими безопасное ведение работ при укладке и сварке ригелей двух этажей

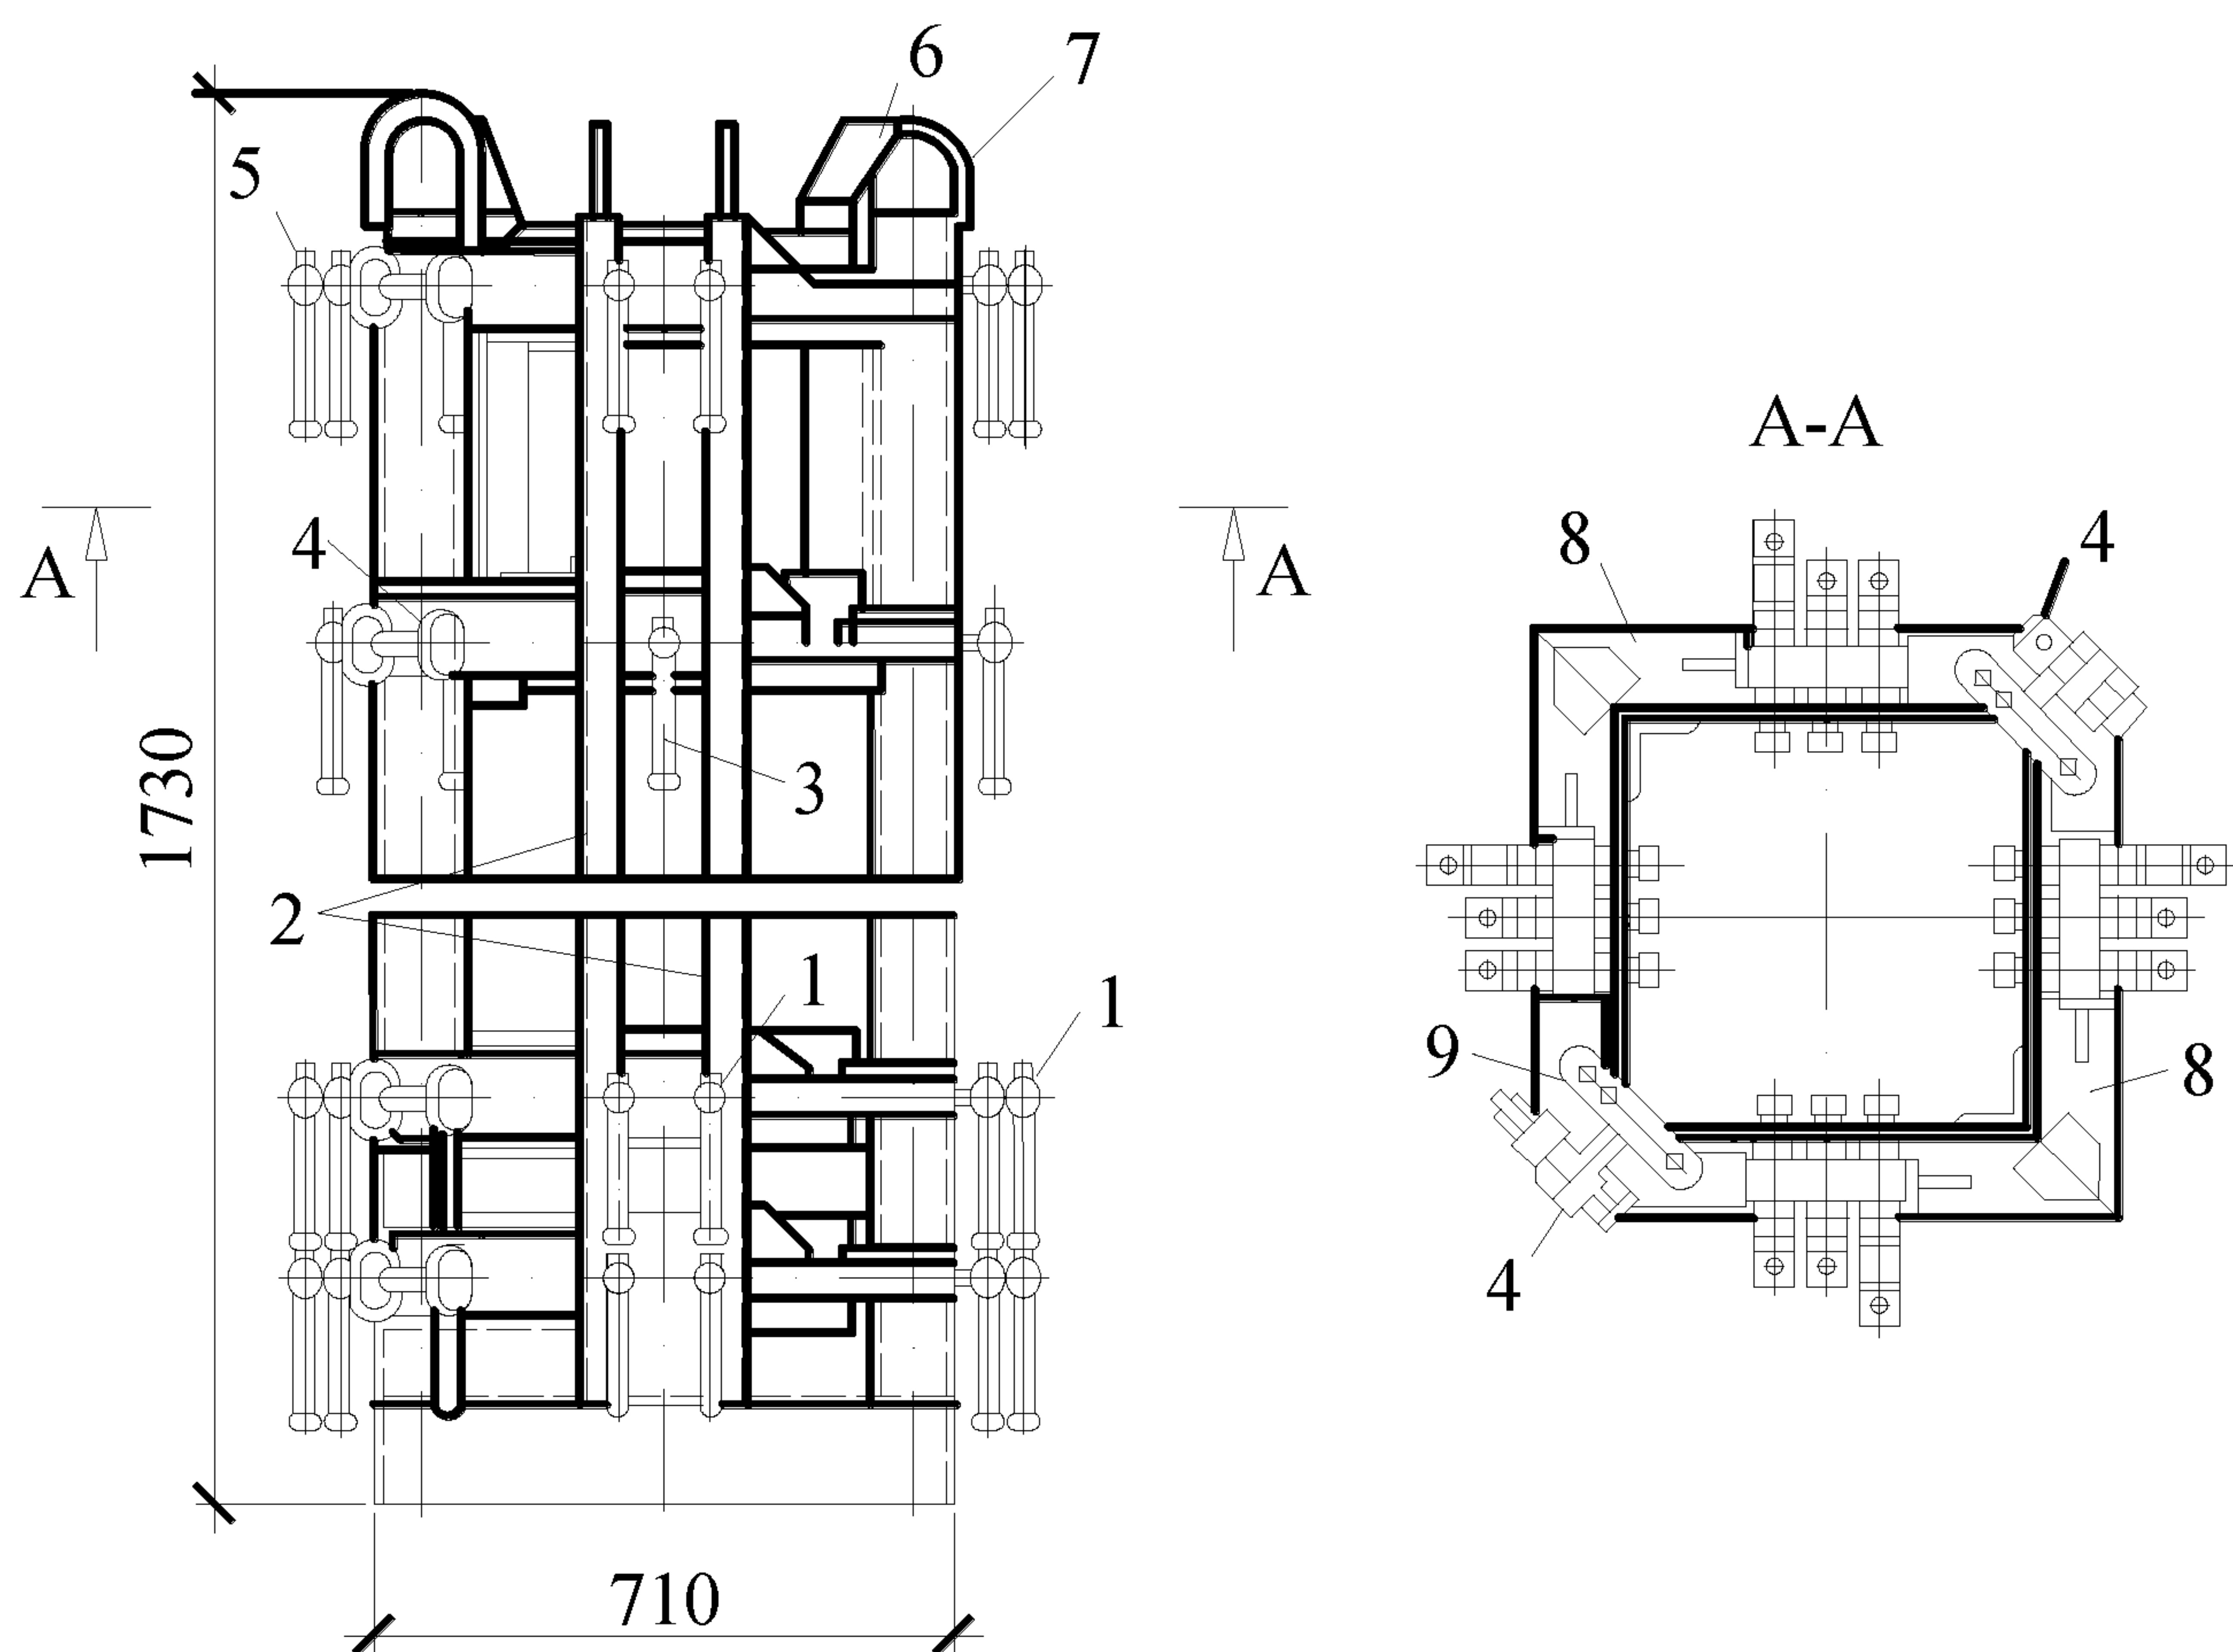
яруса колонн. На стойках кондуктора укреплены два ряда хомутов для выверки и временного закрепления низа и верха устанавливаемой колонны.

Г.5 Рамно-шарнирные индикаторы (РШИ) применяют для ограниченно свободного метода монтажа колонн. Как правило, применяют комплект монтажного оснащения, состоящий из четырех РШИ. Плавающие рамы РШИ выверяют с помощью теодолитов и системы парных продольных и поперечных связей. Последующая установка и временное закрепление конструкций осуществляется безвыверочно. Последовательность монтажа конструкций с применением РШИ показана на рисунке Г.5.



1 – анкер с натяжным крюком, 2 – балка, 3 – упор, 4 – подкос, 5 – хомут, 6 – колонна, 7 – винт для крепления хомута к колонне, 8 – клиновой вкладыш, 9 – фундамент

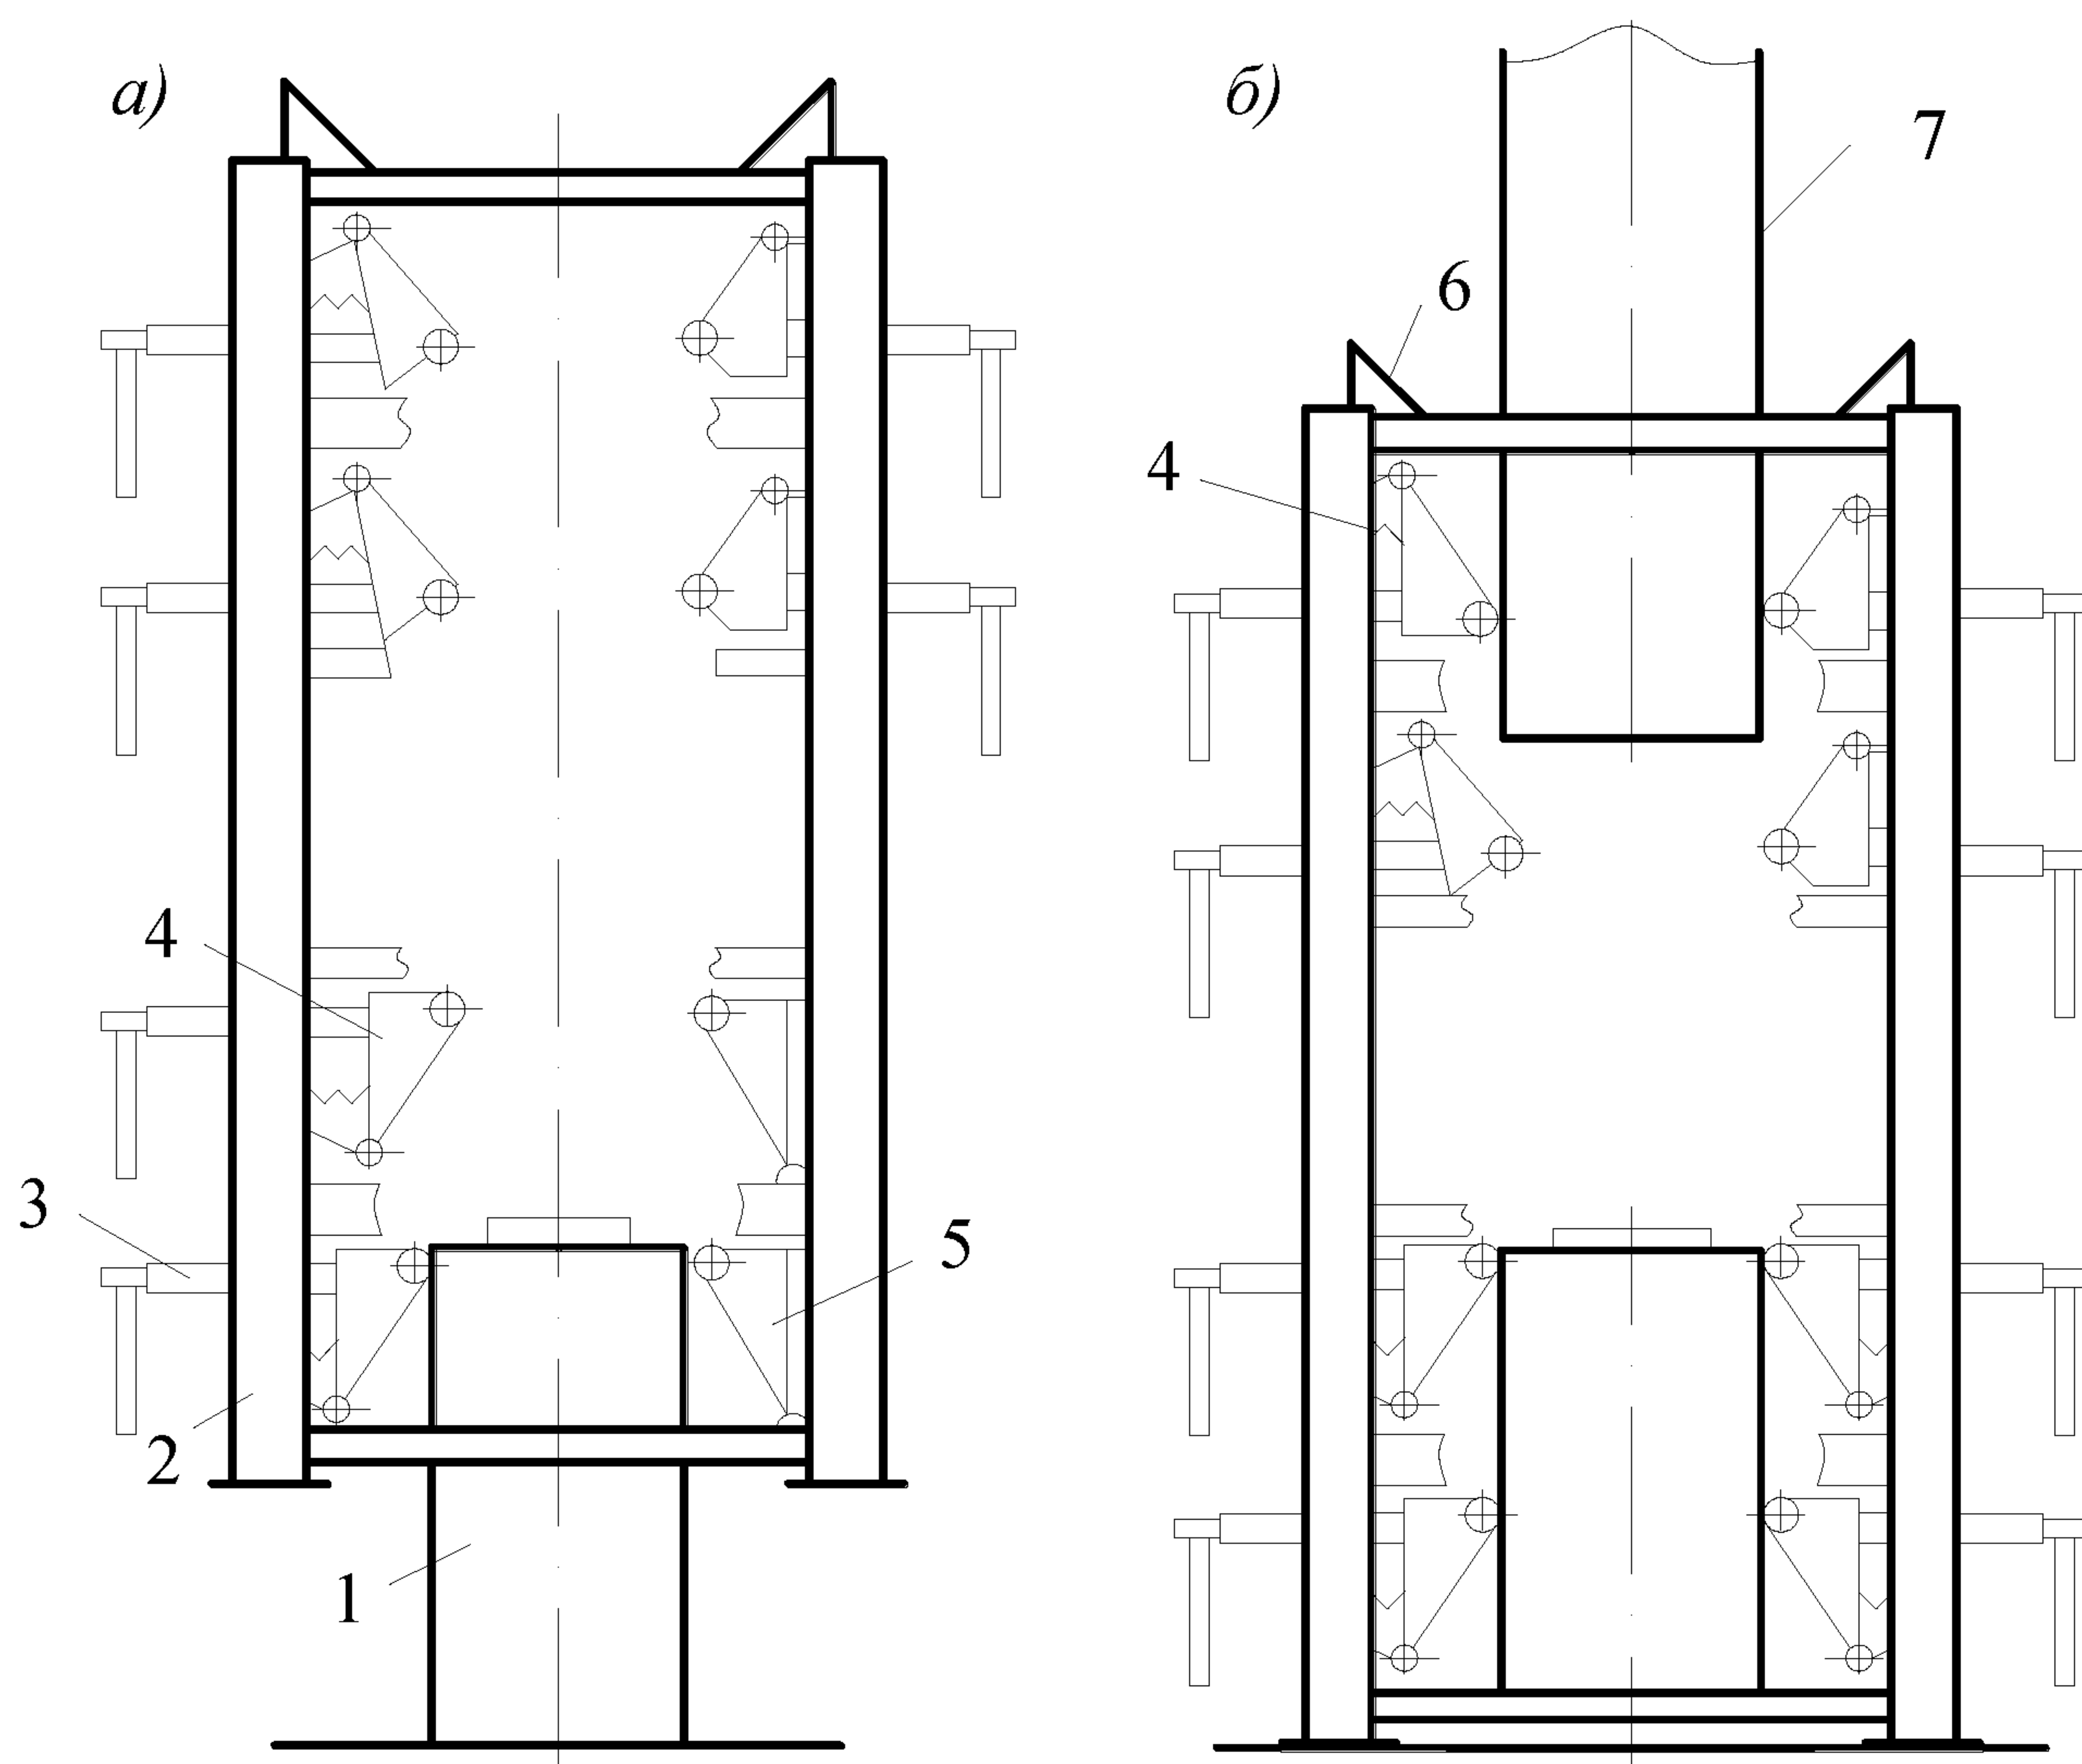
Рисунок Г.1 – Комплект монтажного оснащения для установки многоэтажных колонн



1 – винты для крепления кондуктора к оголовку колонны, 2 – стойки кондуктора, 3 – винты для выверки низа колонны, 4 – стяжные винты, 5 – винты для выверки верха колонны, 6 – направляющие, 7 – монтажные петли, 8 – секции кондуктора, 9 – защелка

Рисунок Г.2 – Одиночный разъемный кондуктор со стяжными винтами*

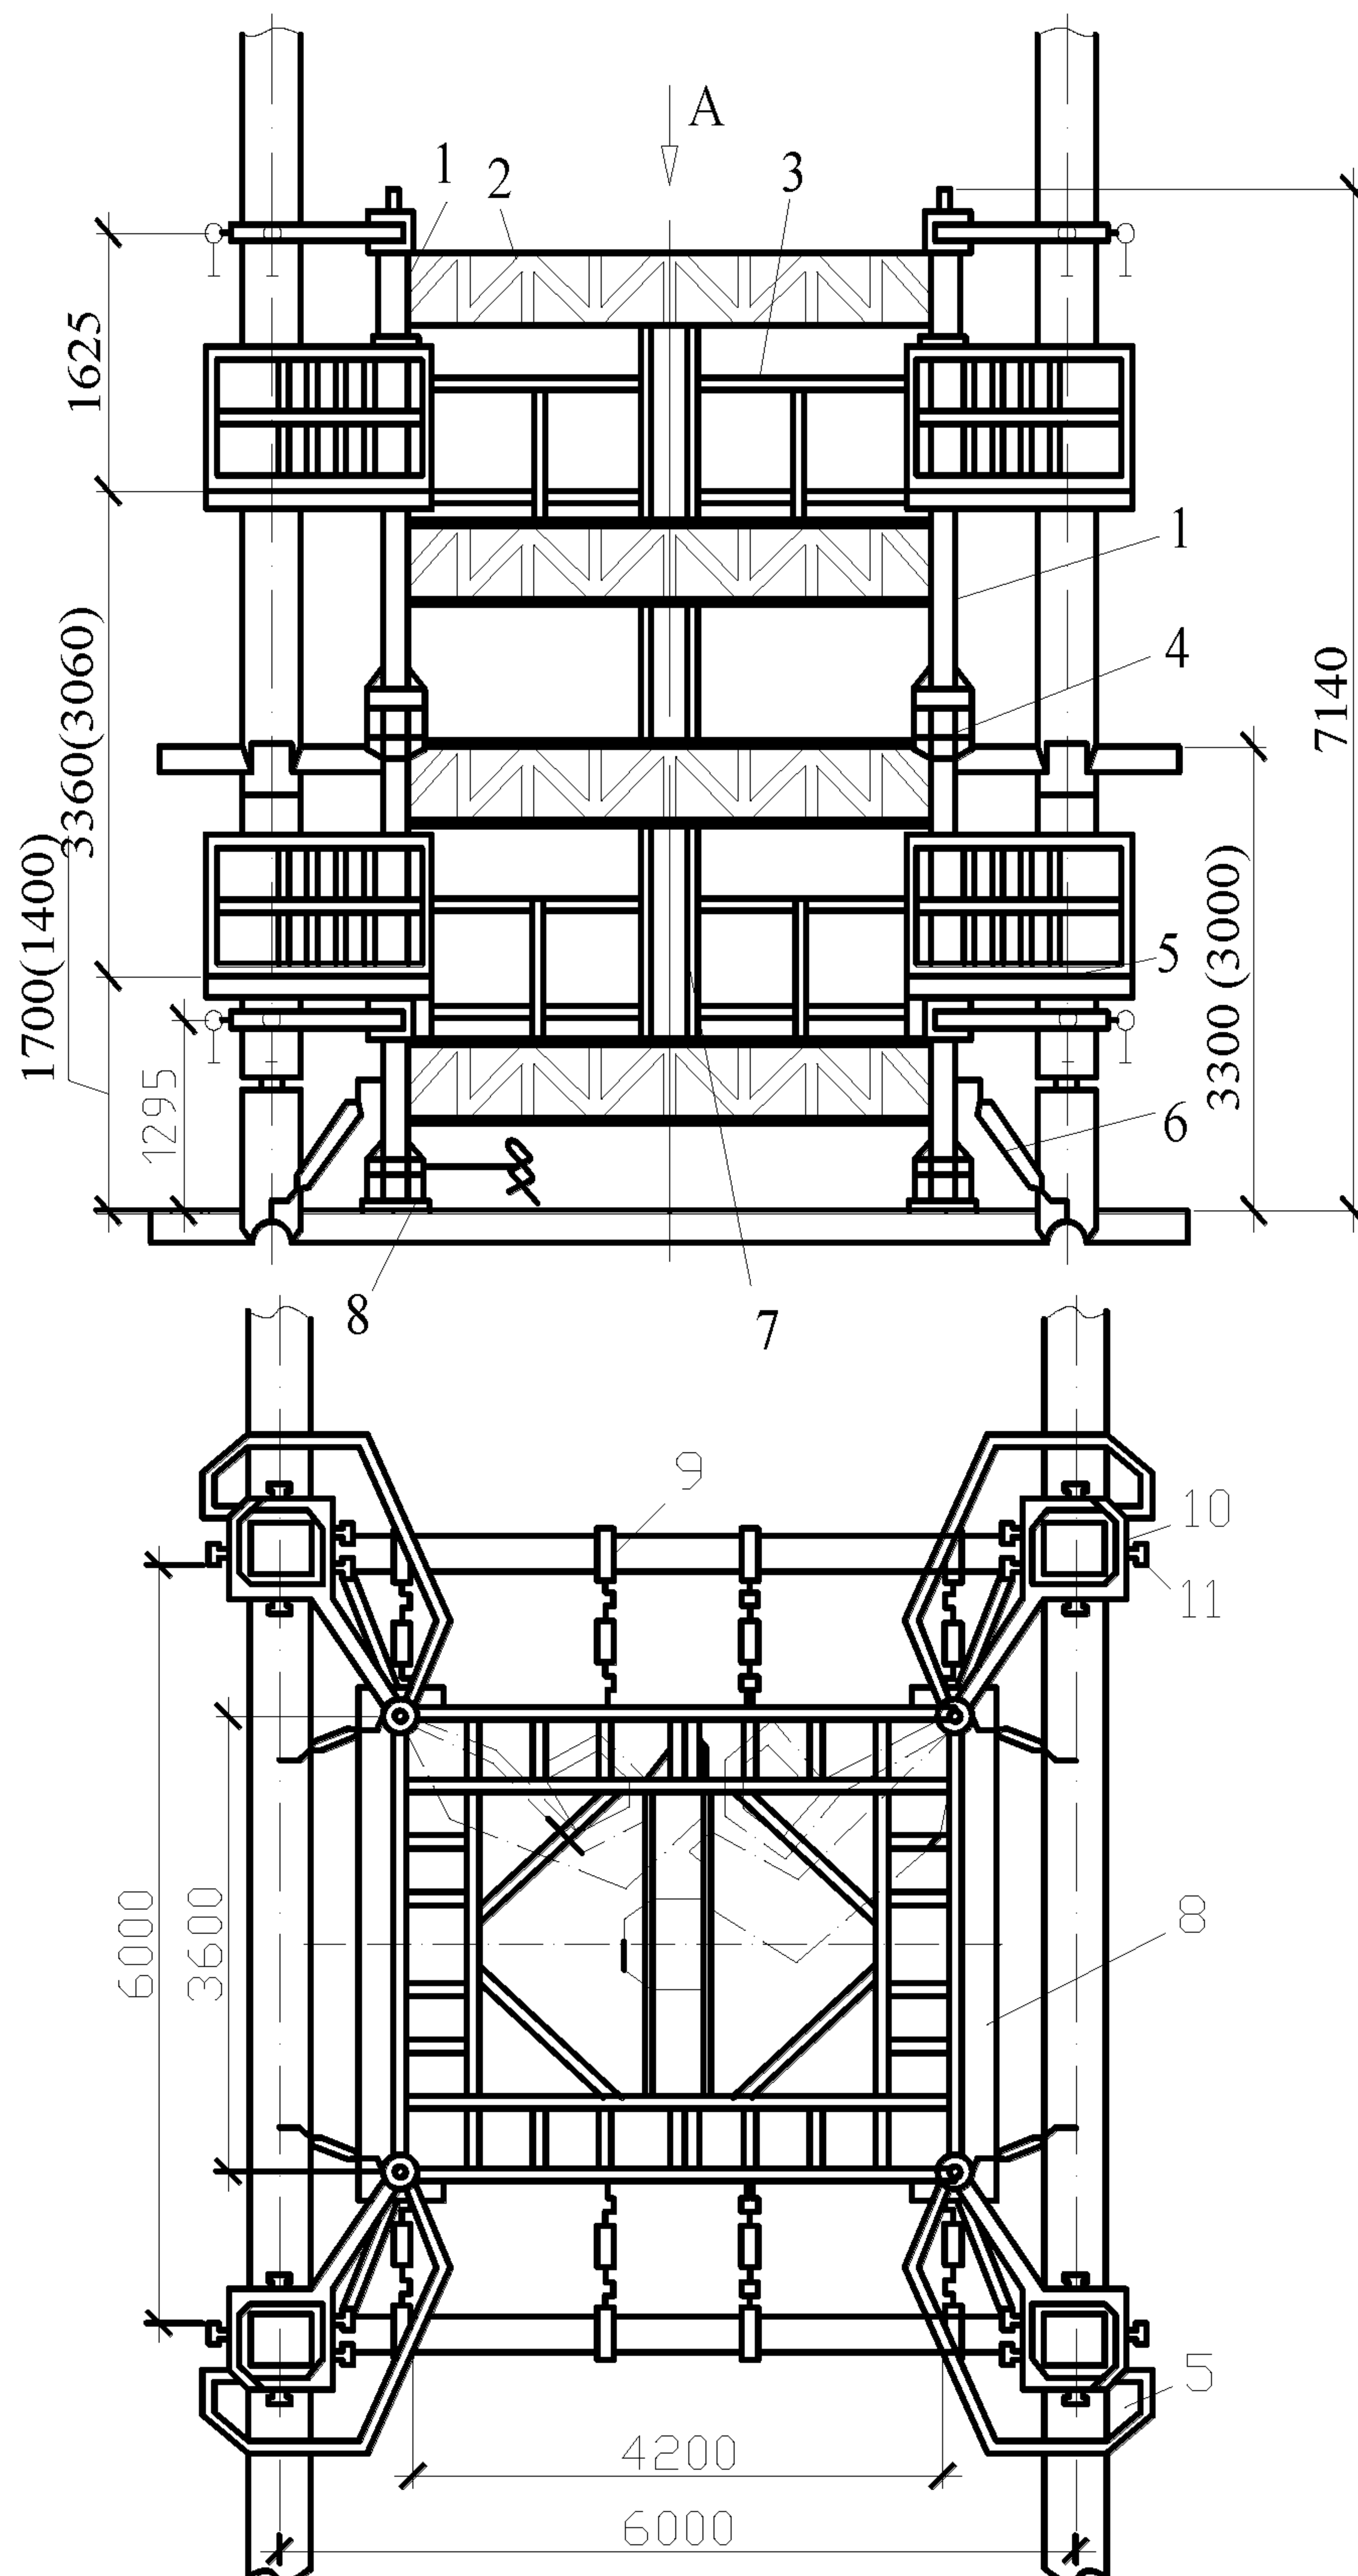
* Конструкции Мосоргстроя



а – установка и закрепление кондуктора, б – установка колонны.

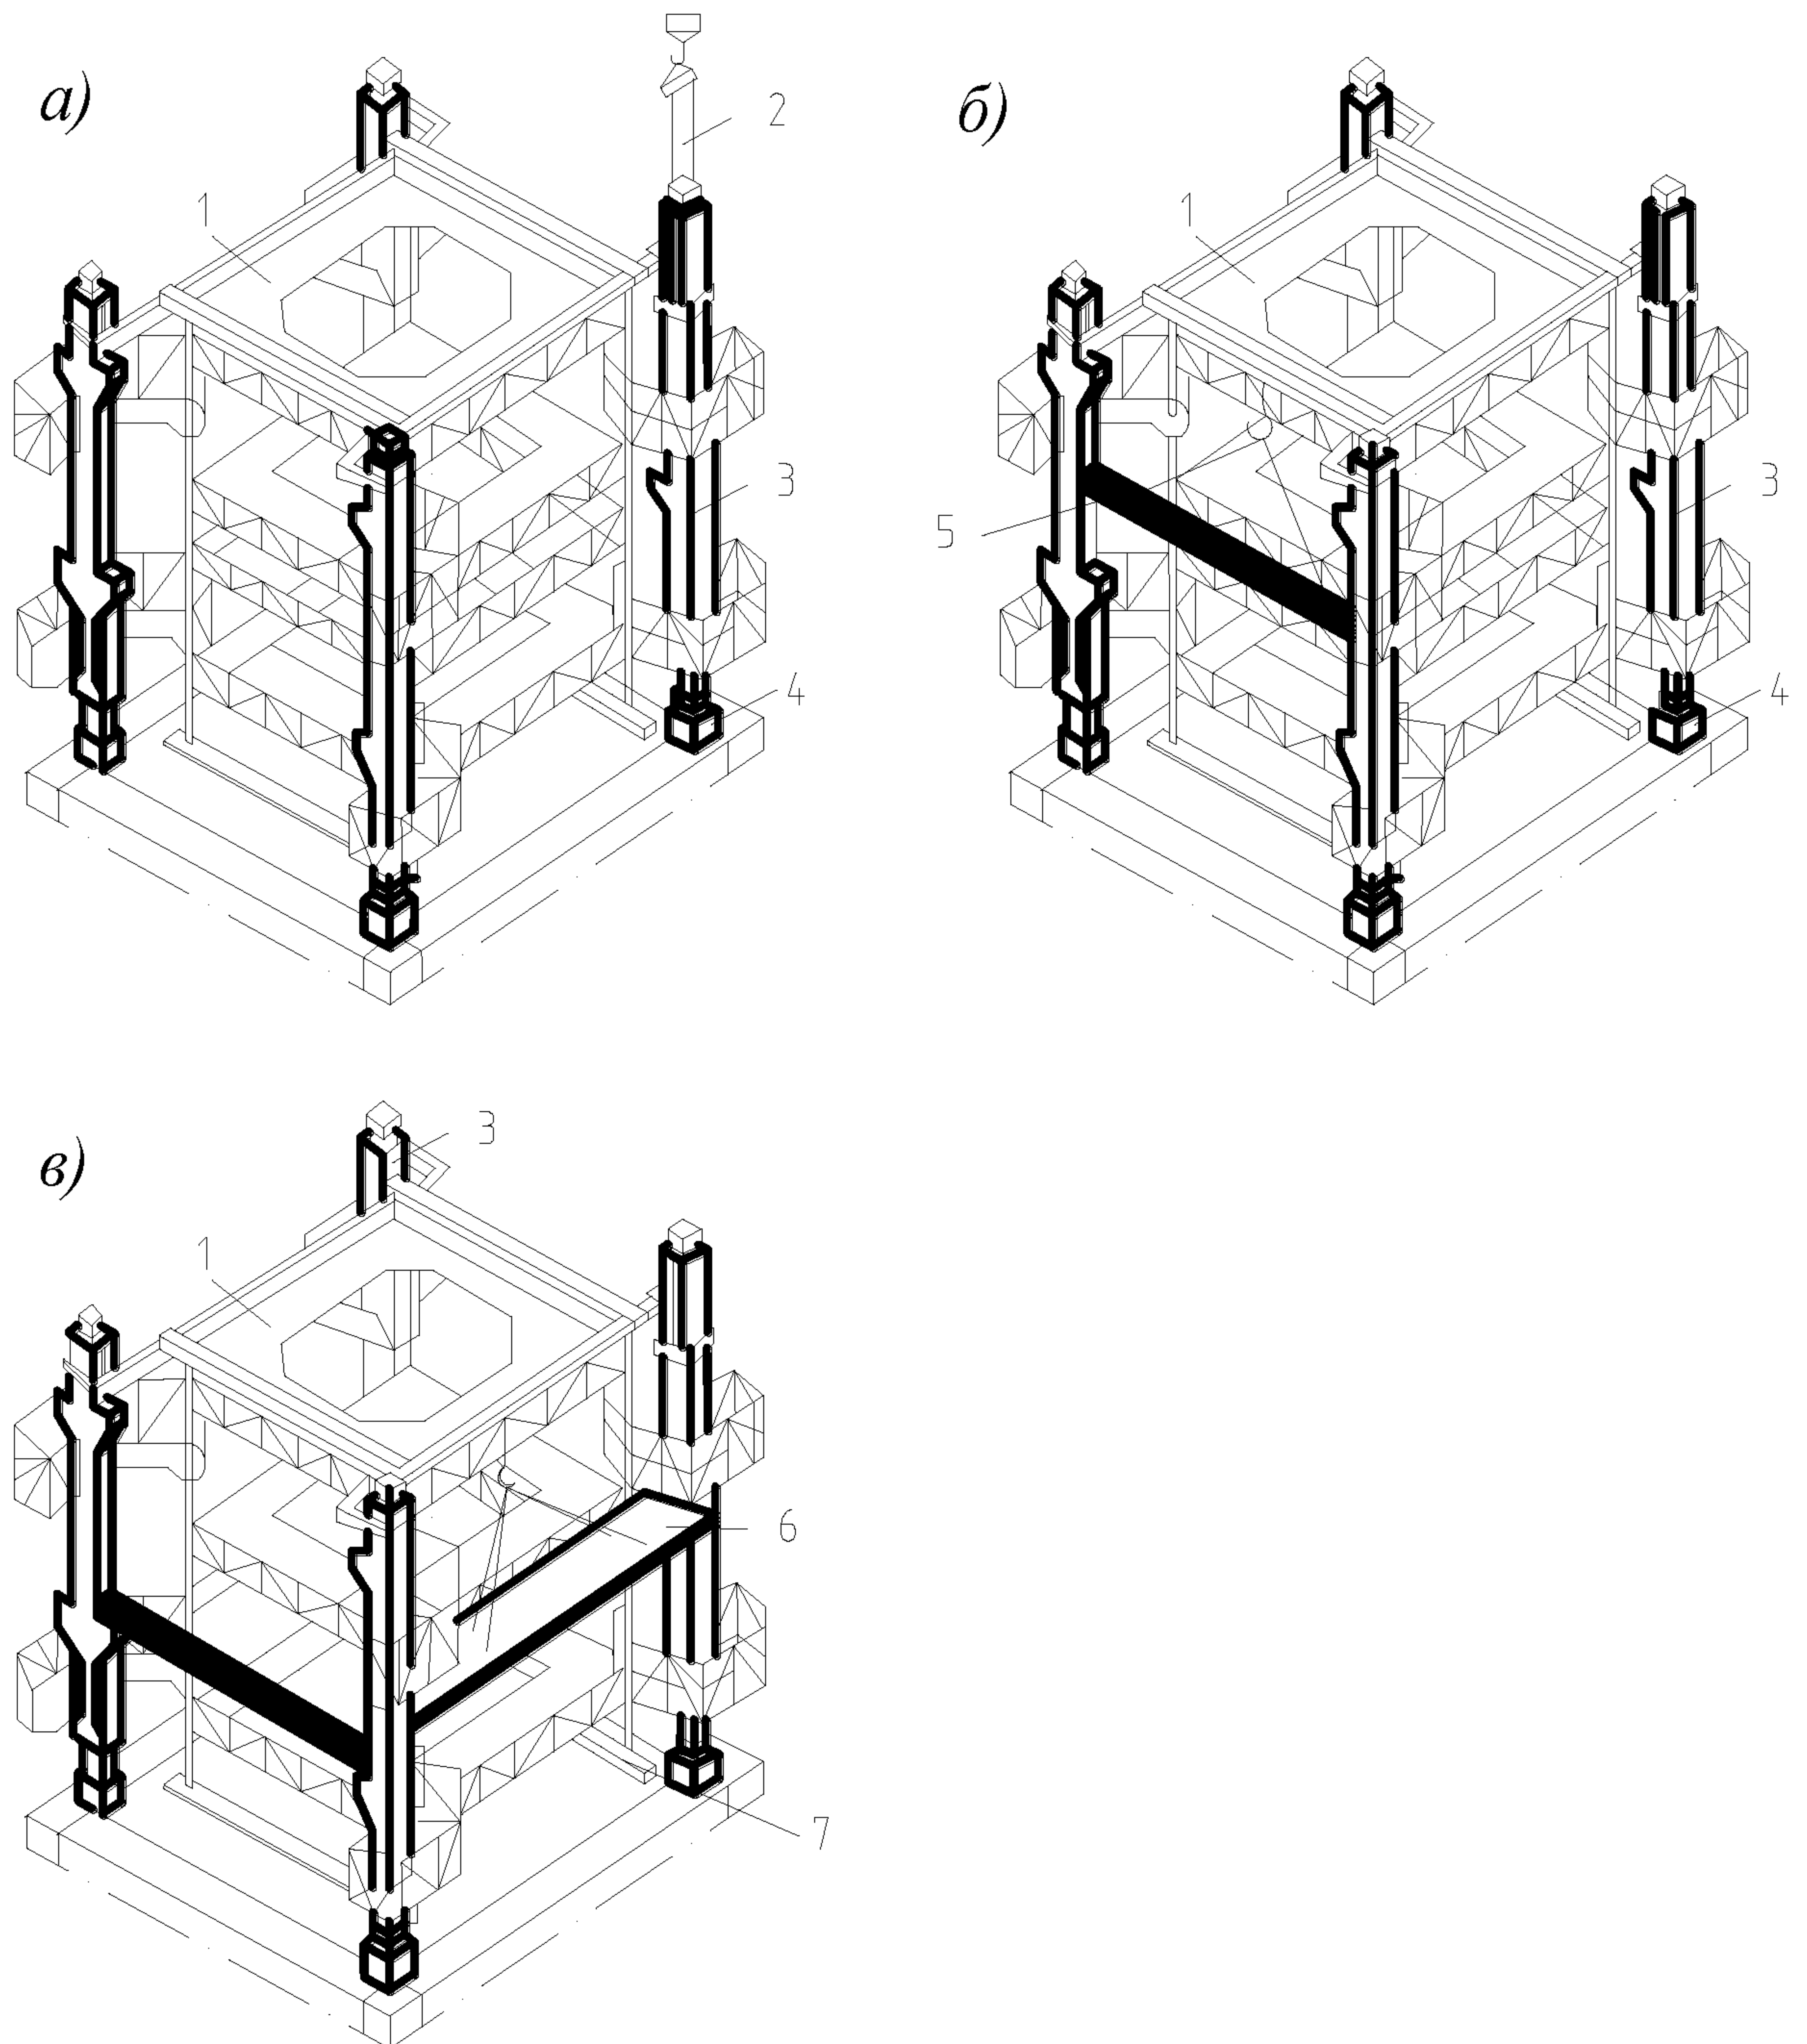
1 – оголовок колонны, 2 – кондуктор, 3 – винт, 4 – подпружиненный рычаг, 5 – неподвижный упор, 6 – направляющая, 7 – монтируемая колонна

Рисунок Г.3 – Полуавтоматический кондуктор для монтажа каркасов серии 1.020; 1.420-6 и 1.420-12



1 – стойки, 2 – рамы, 3 – ограждение, 4 – вставка, 5 – площадка монтажная, 6 – подкос, 7 – лестница, 8 – подкладка, 9 – струбины со стяжкой, 10 – хомут с регулировочными винтами, 11 – винт

Рисунок Г.4 – Групповой кондуктор



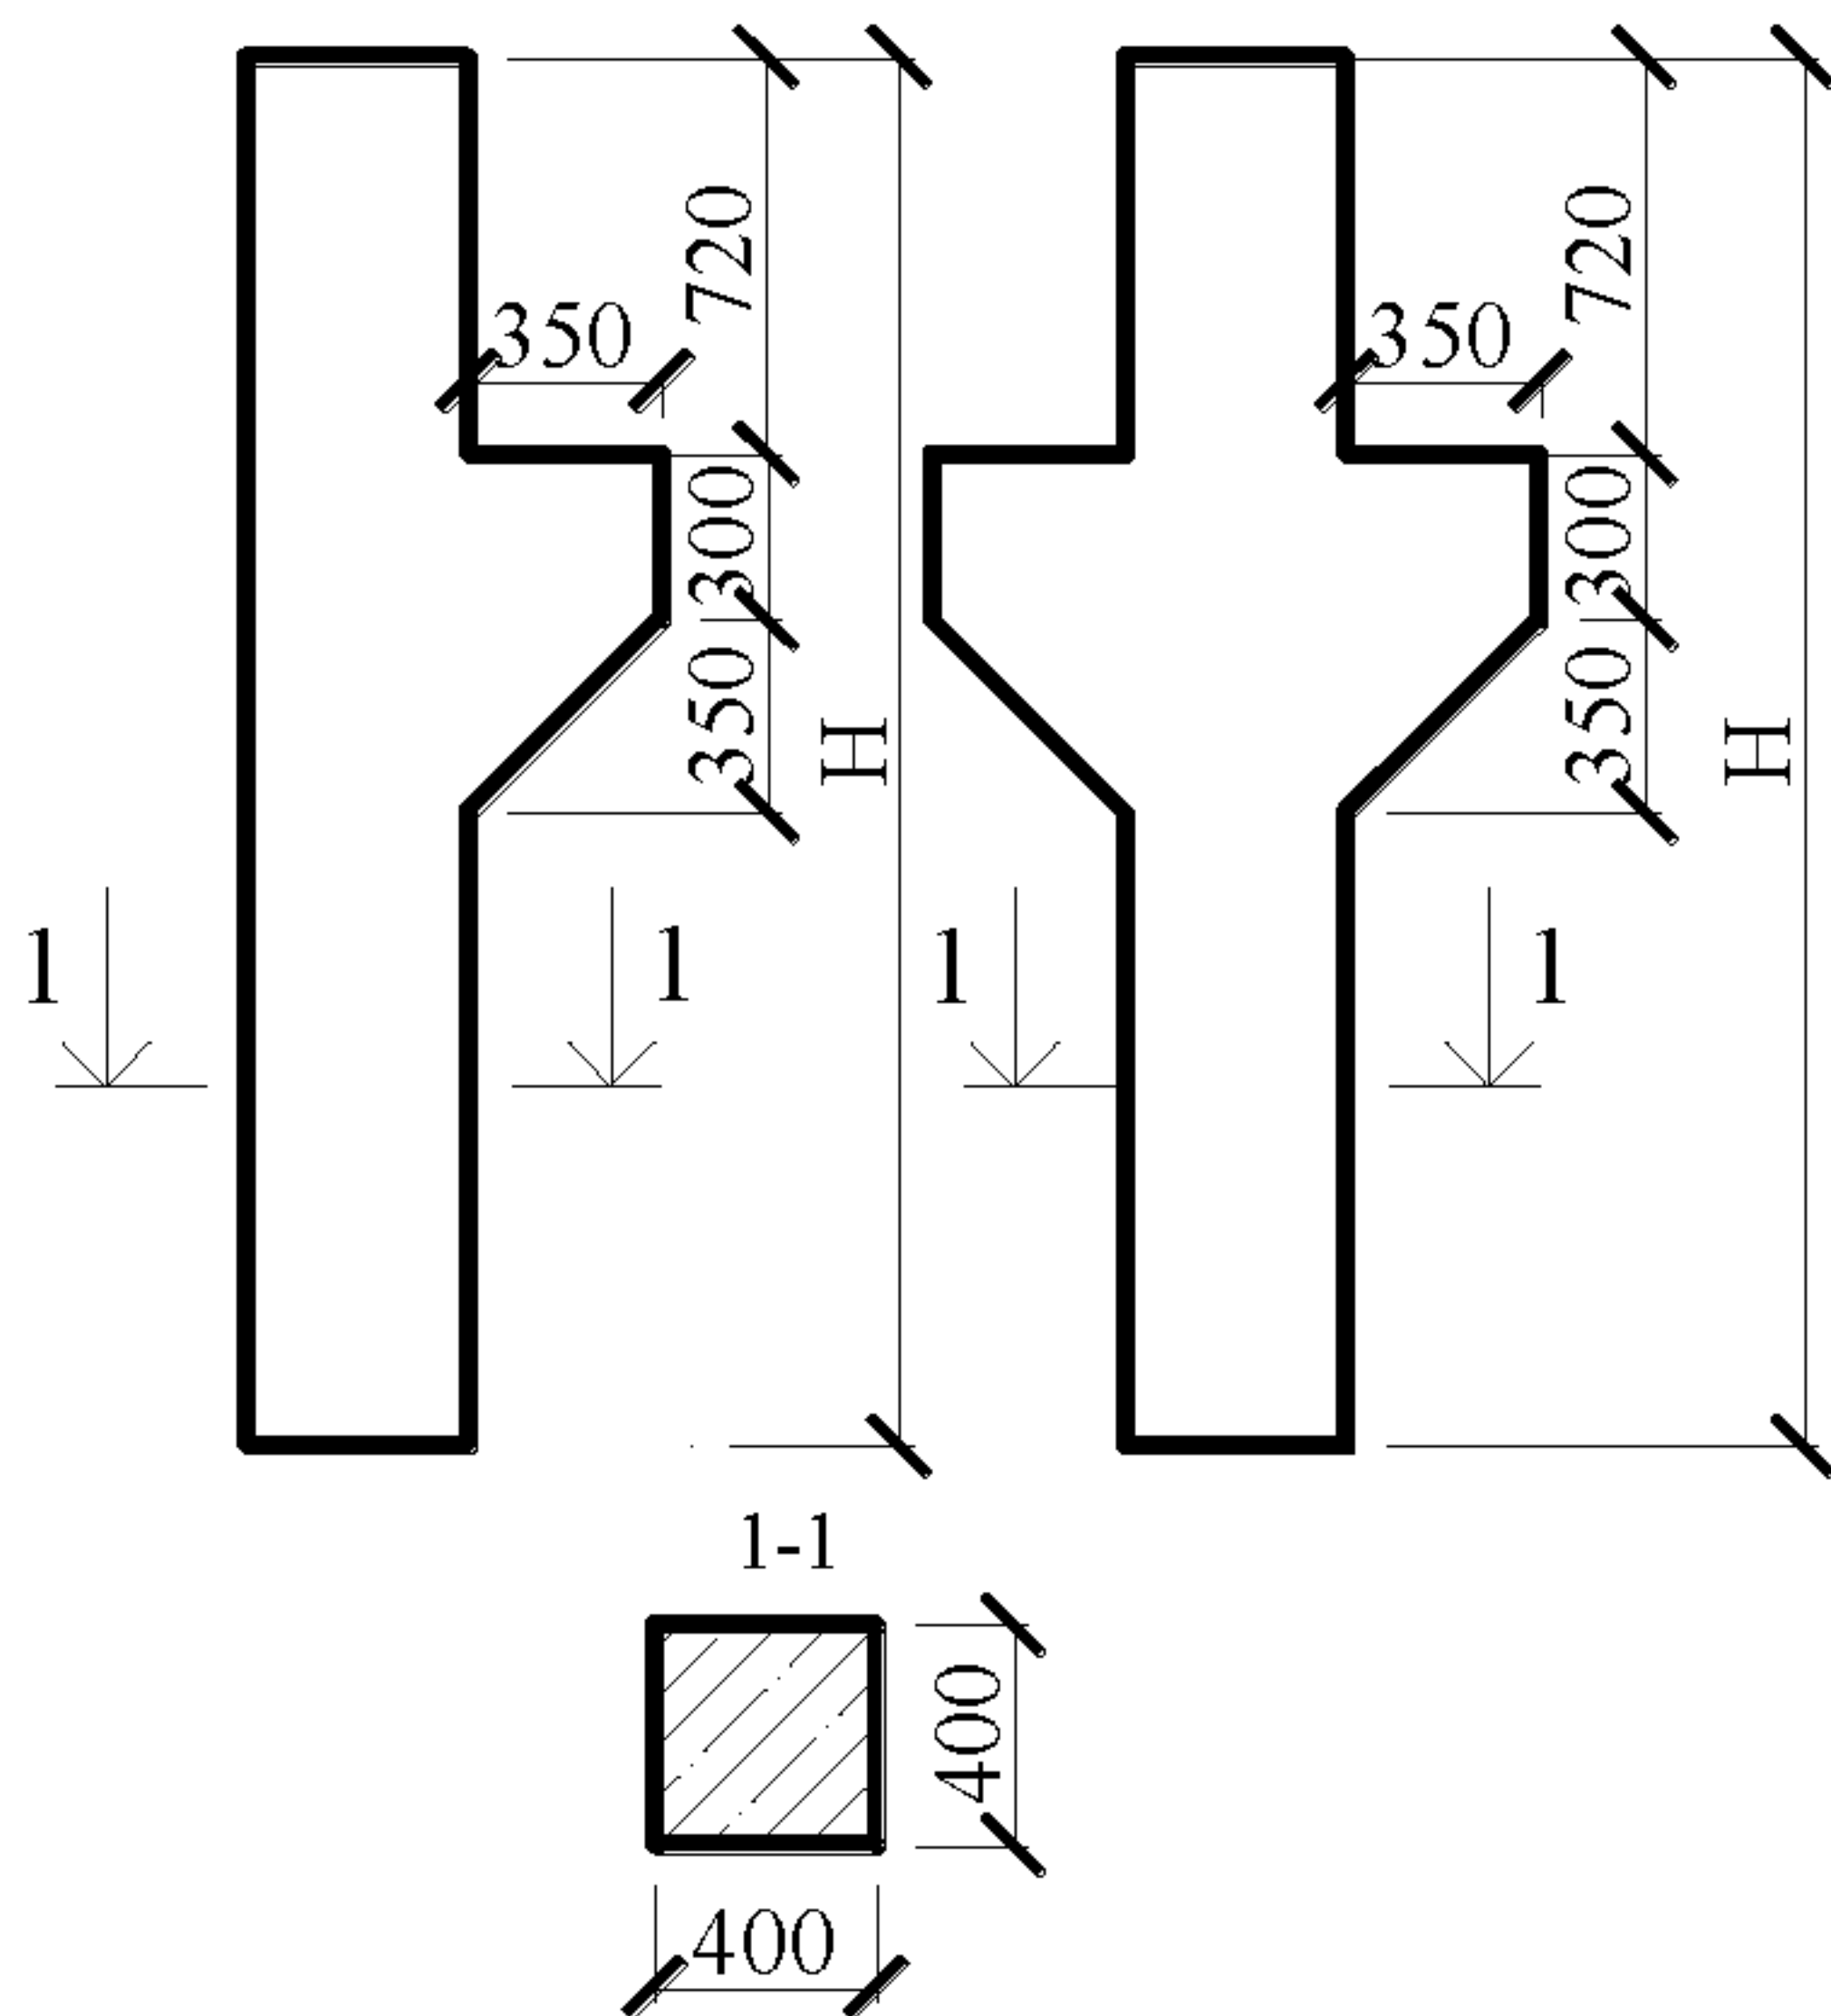
а – установка колонн, б – укладка ригелей нижнего этажа, в – укладка плит нижнего этажа.

1 – РШИ, 2 – траверса, 3 – колонна, 4 – оголовок нижестоящей колонны, 5 – ригель, 6 – плита, 7 – подкладочный брус

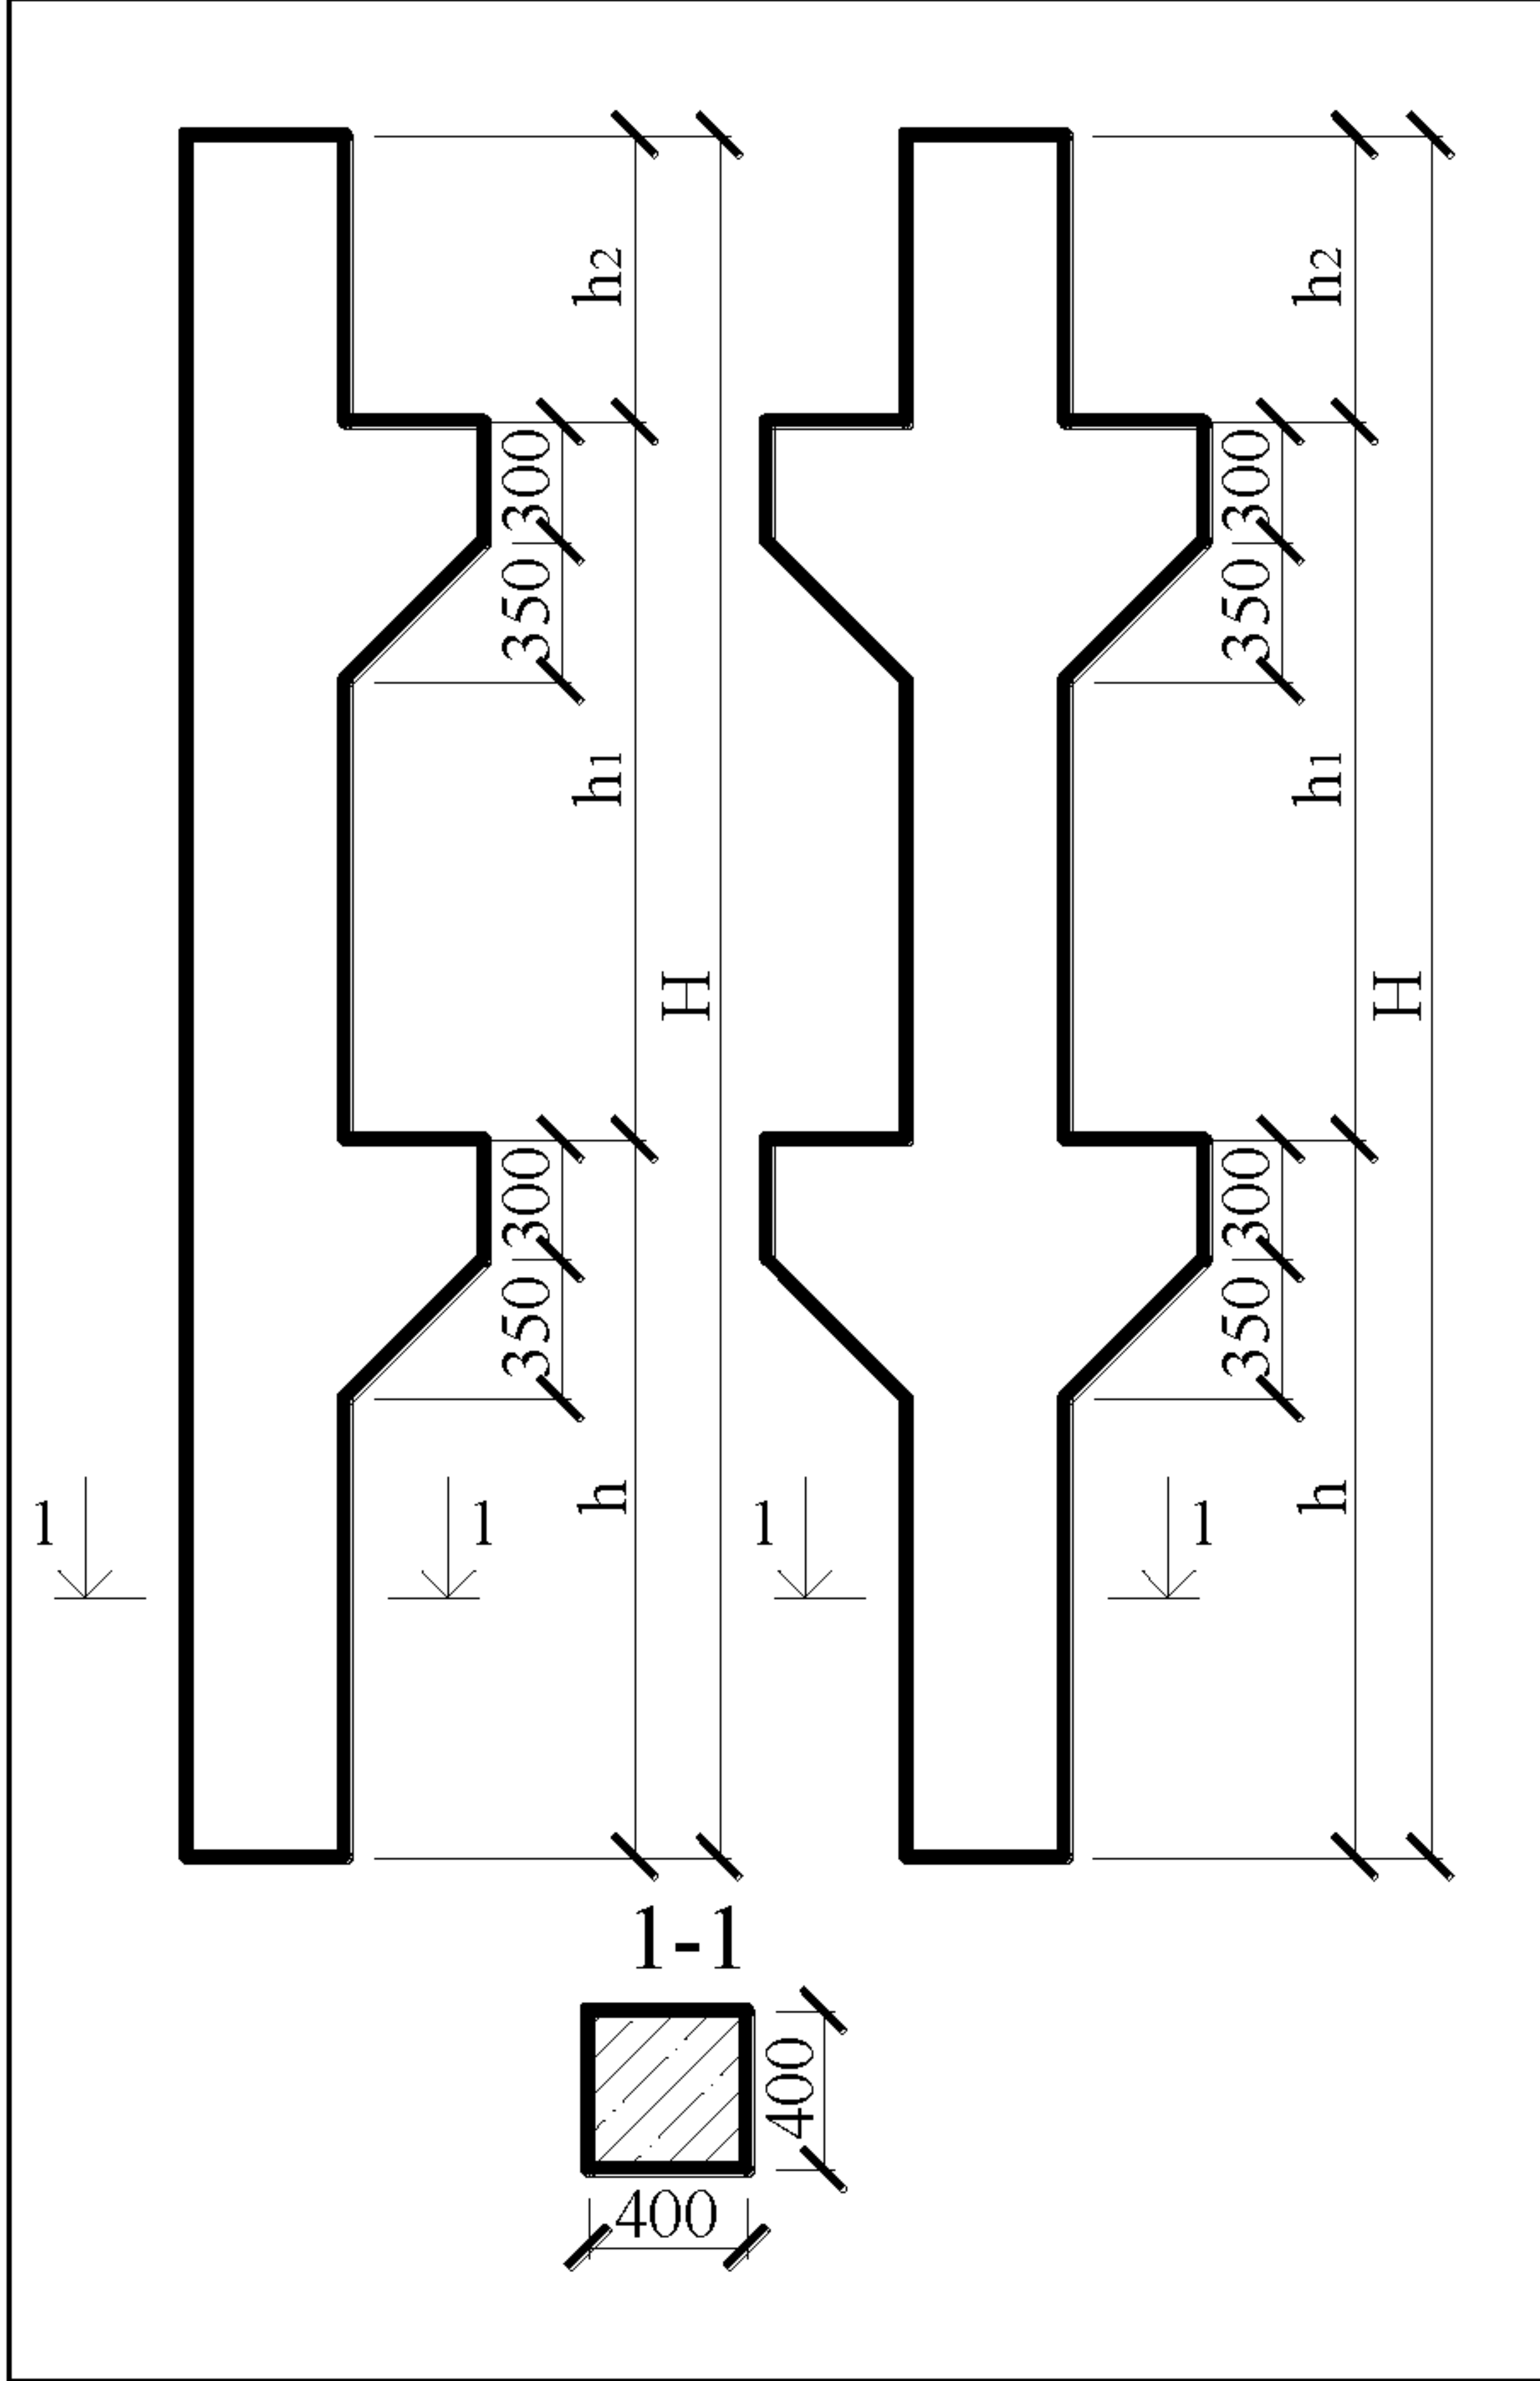
Рисунок Г.5 – Последовательность монтажа каркаса с применением РШИ

Приложение Д
(справочное)
Номенклатура колонн массового применения

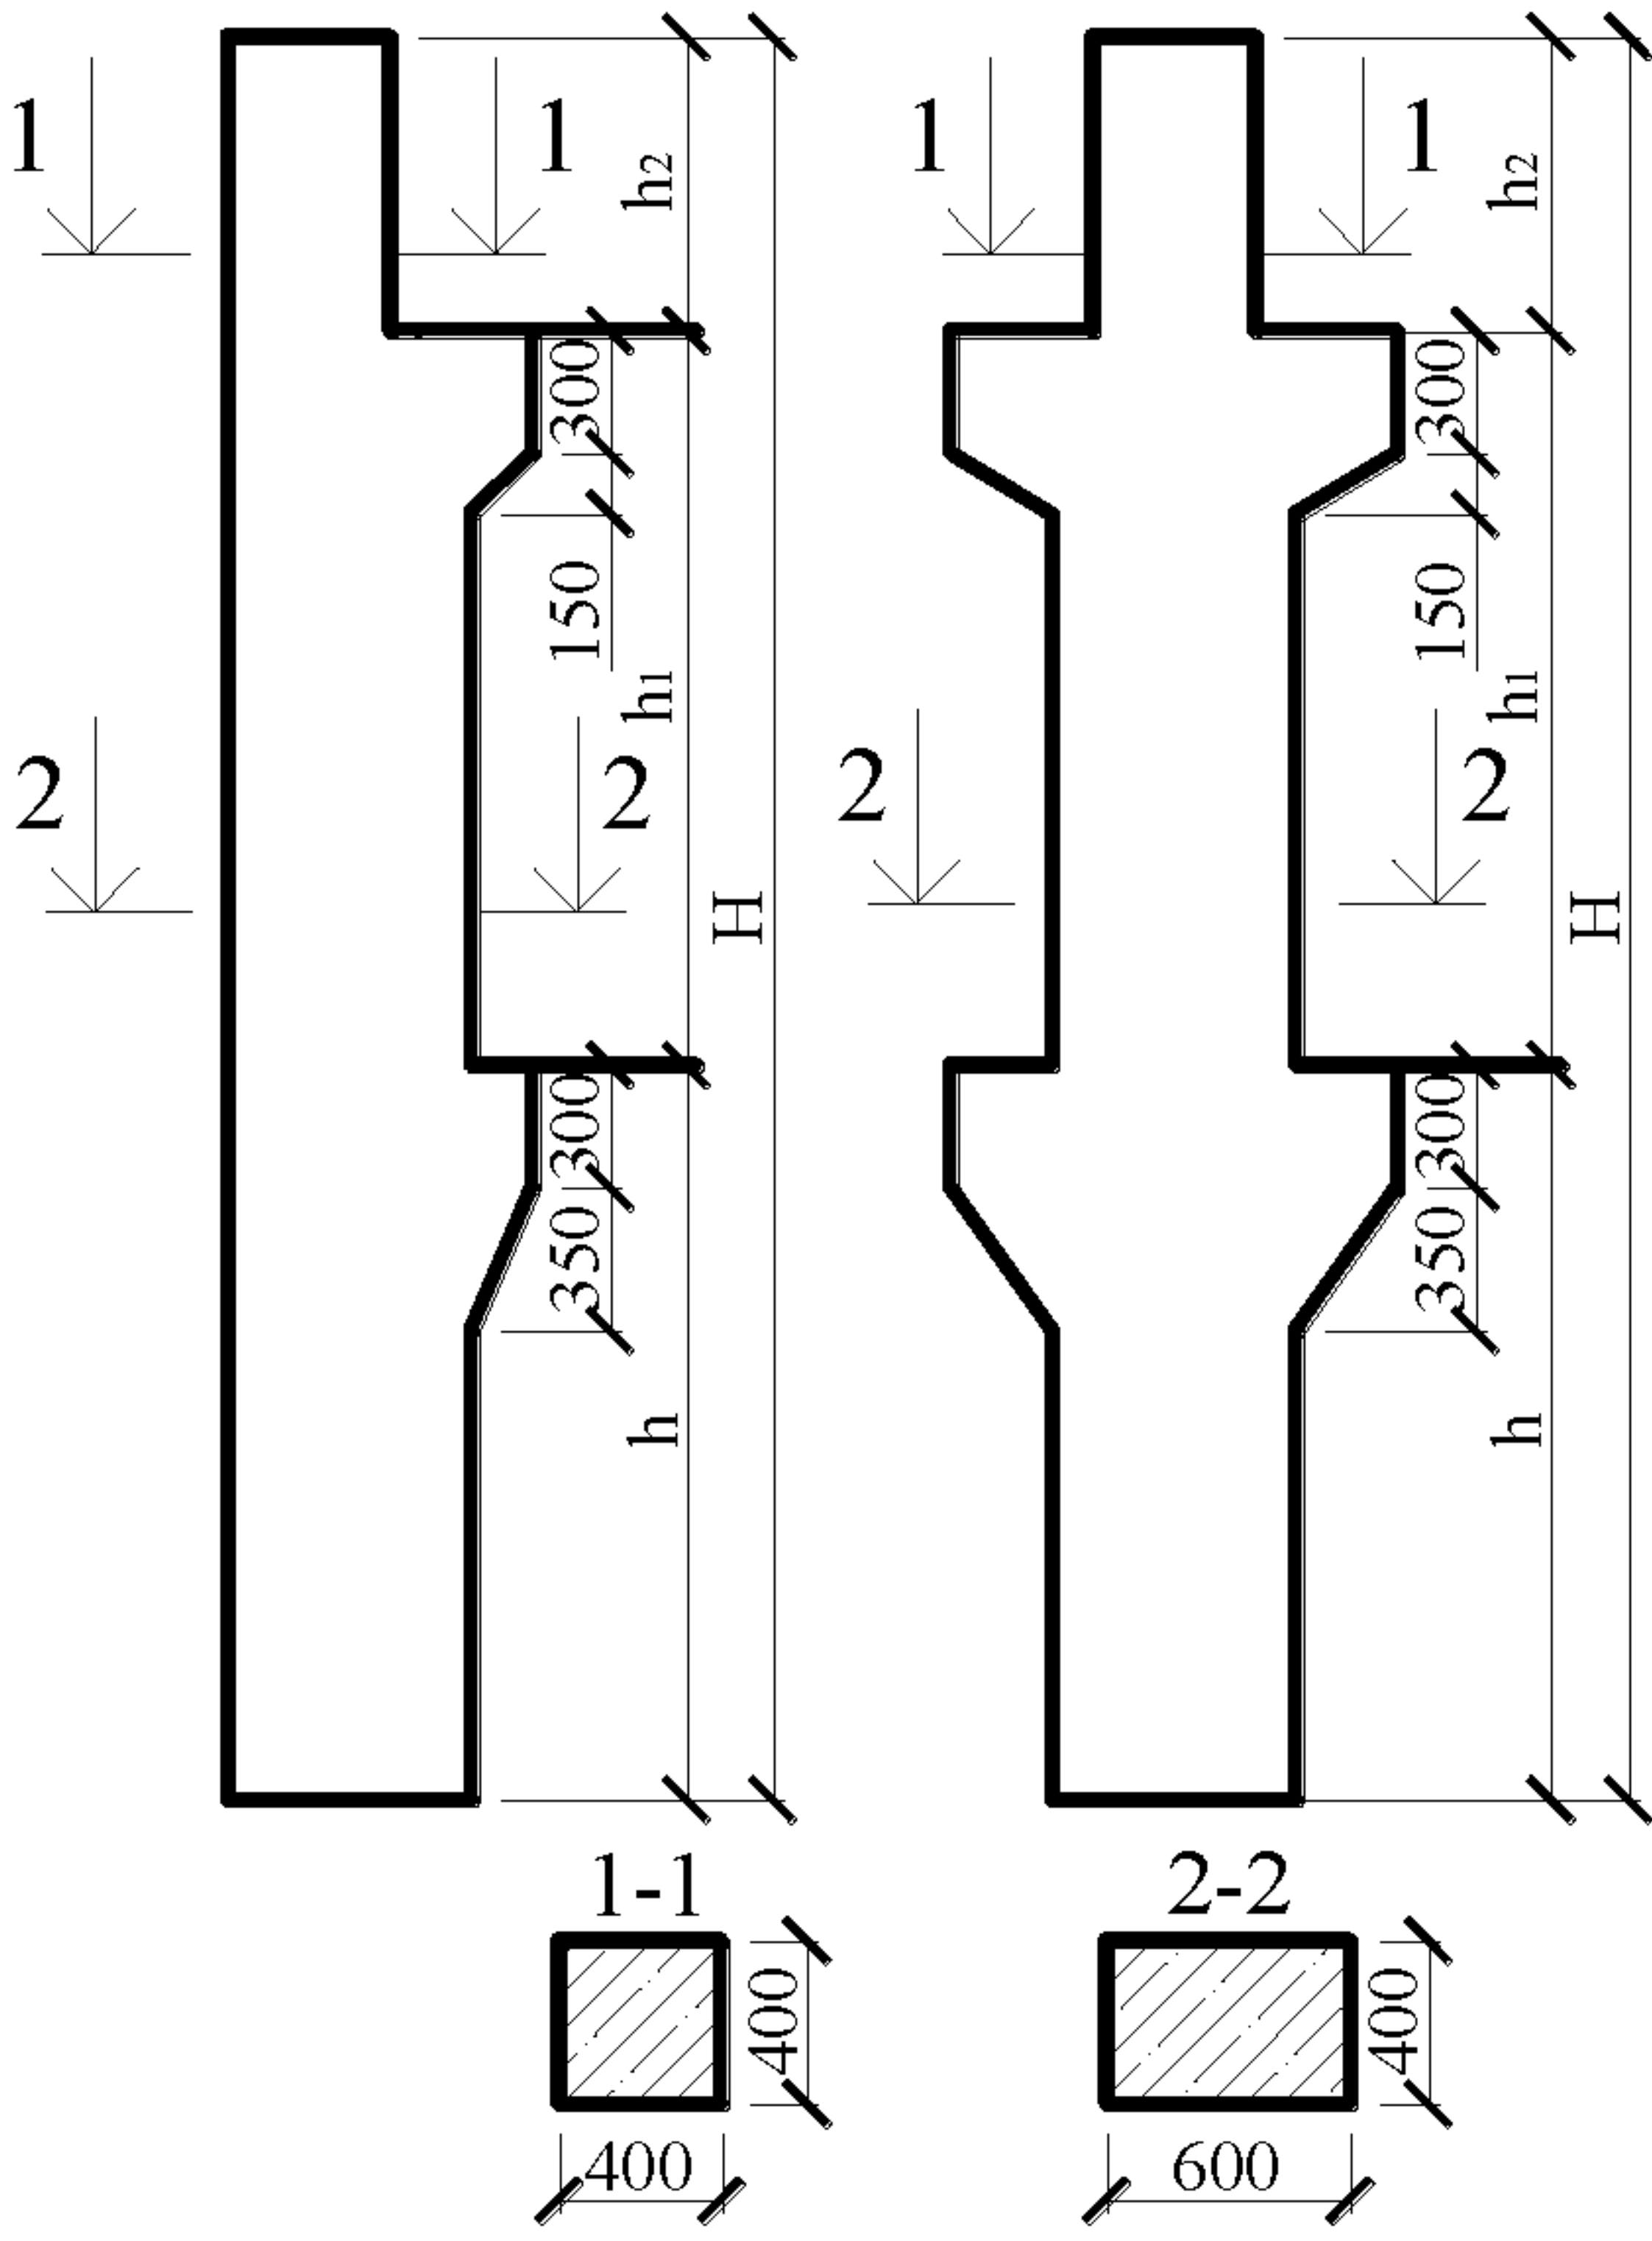
Д.1 В таблице Д.1 приведены характеристики универсальных колонн межвидового применения для оценки их габаритов и весовых показателей.
Таблица Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	
Колонны многоэтажных производственных зданий, серия 1.020-1/87 [5]						
	$\frac{KIa-1-2...KIa-4-2}{K2a-1...K2a-3-5}$	2520	-	-	-	$\frac{1,15}{1,30}$
	$\frac{KIIa-1-3...KIIa-2-6}{KI2a-1...KI2-4-2}$	3720	-	-	-	$\frac{1,60}{1,80}$

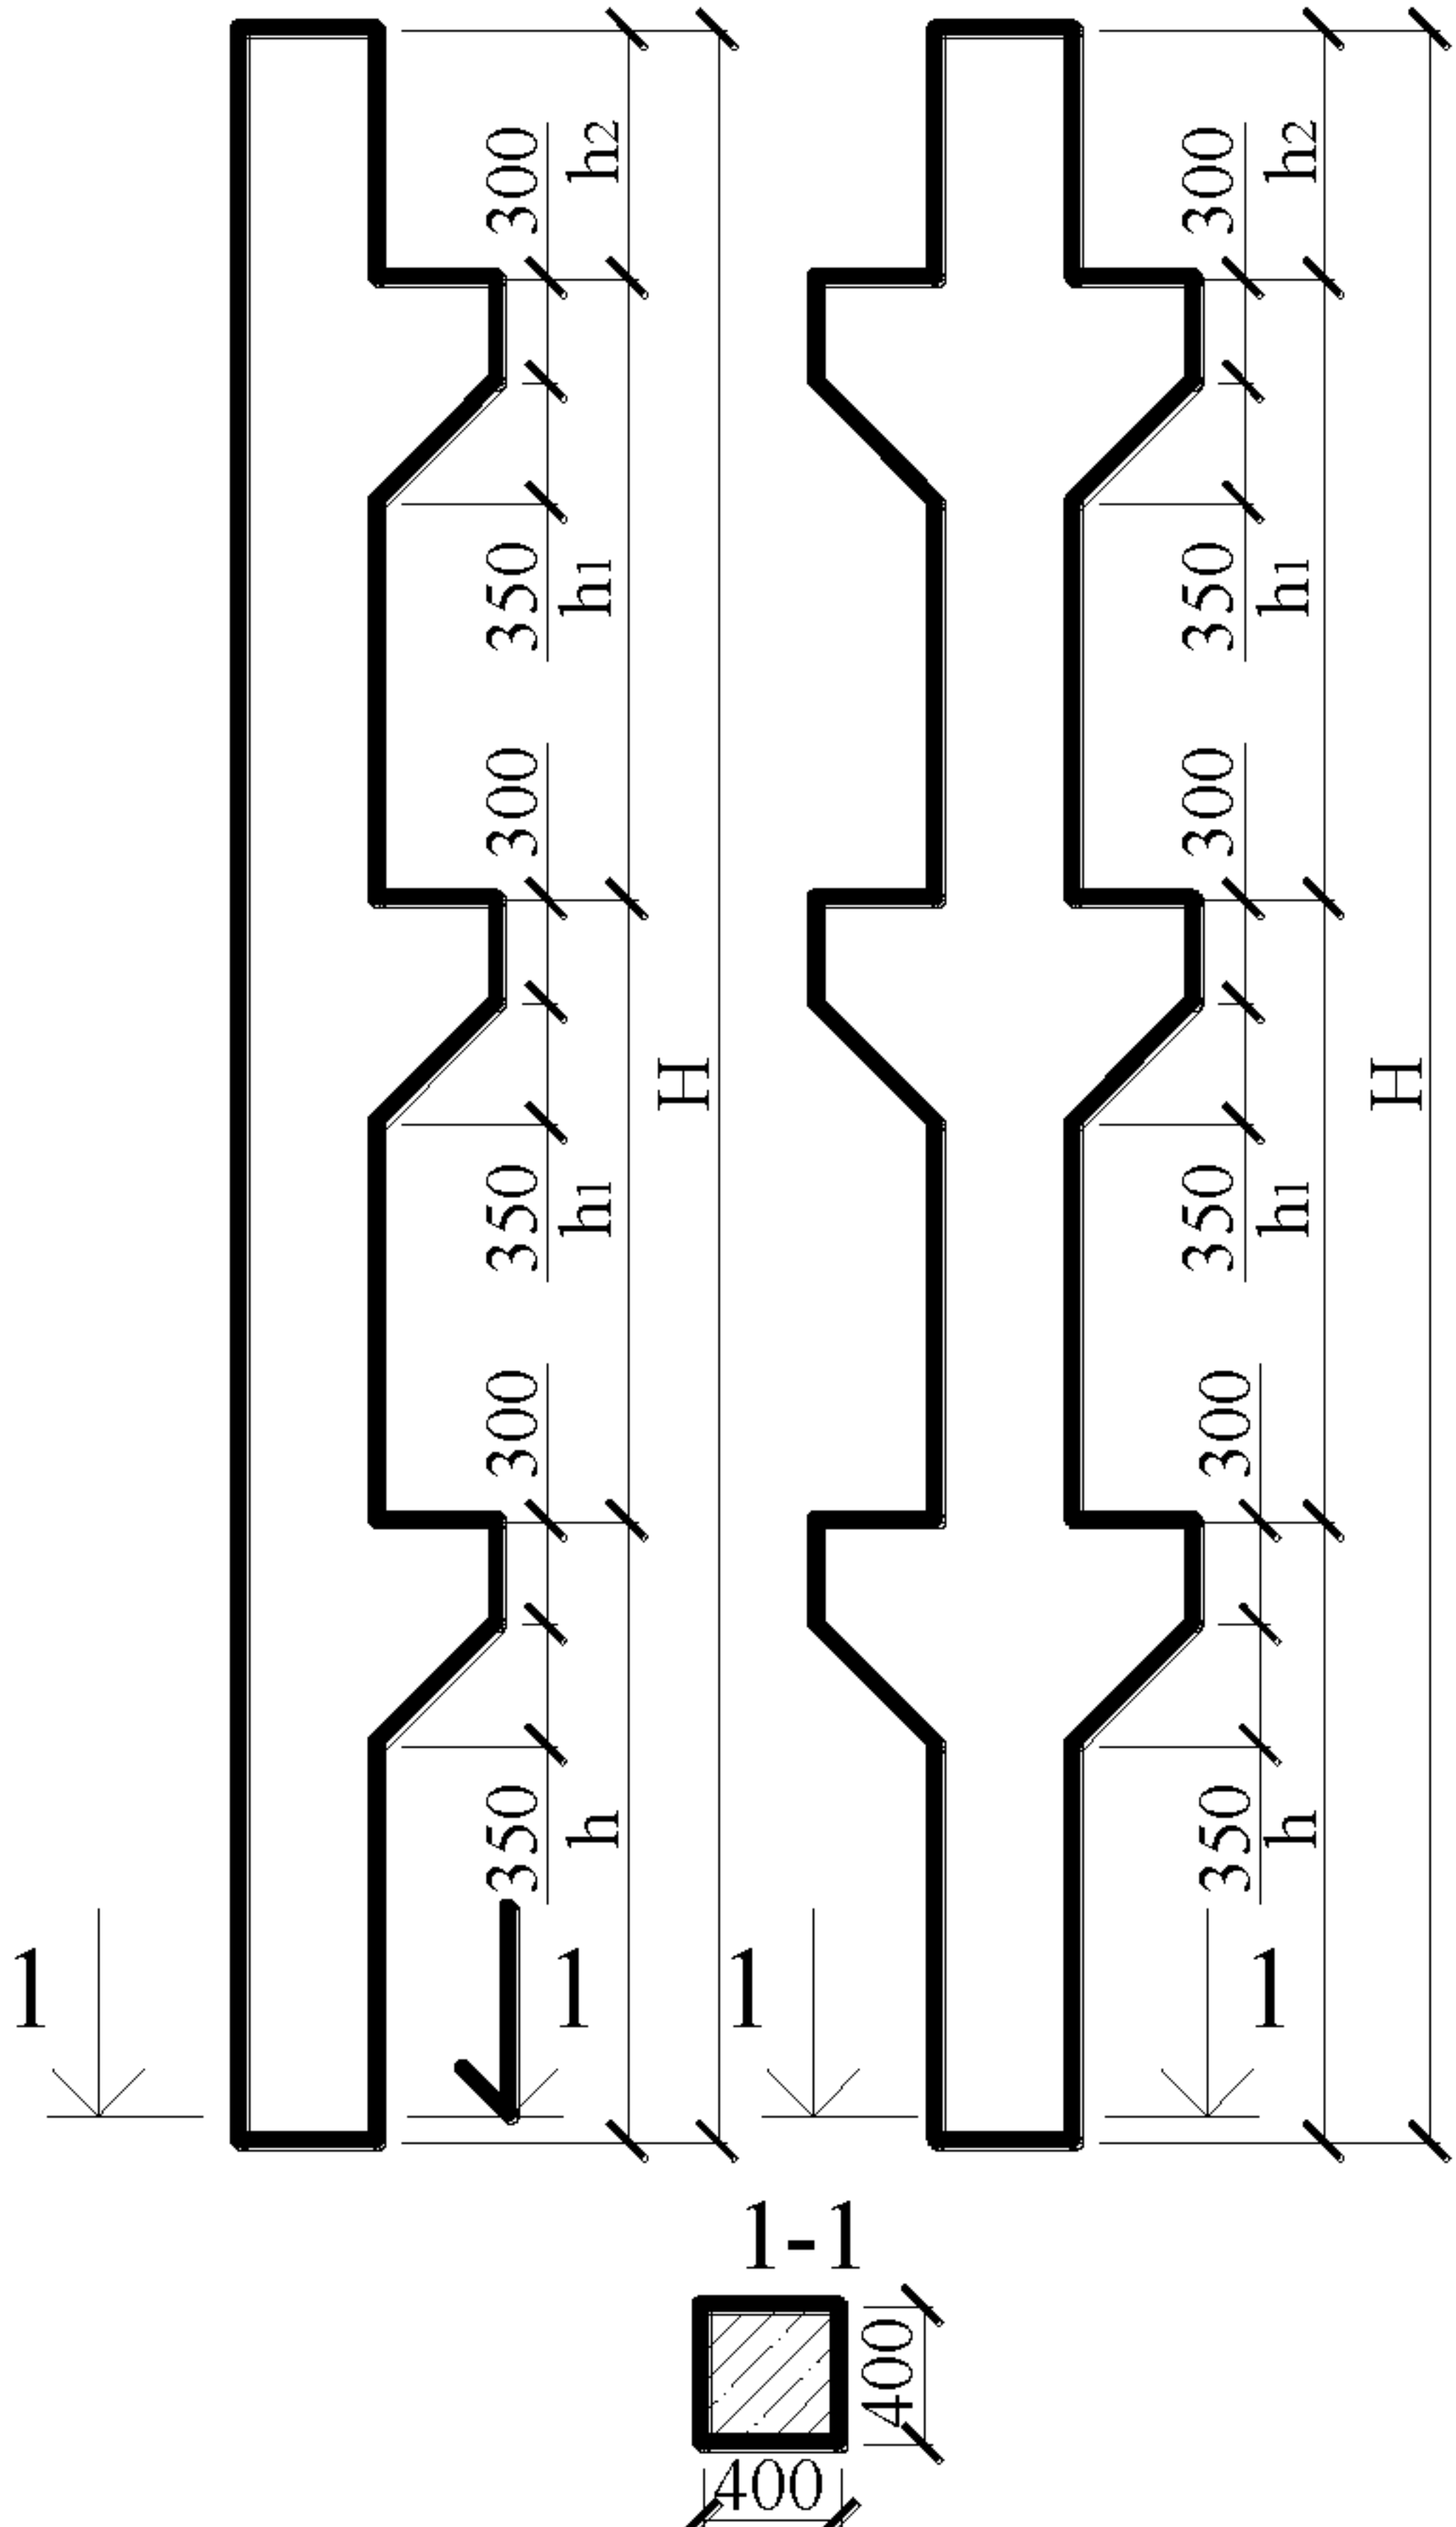
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	
	<u><i>K3a-1-2...K3a-4-2</i></u> <u><i>K4a-1...K4a-3-5</i></u>	8825	3450	3600	1775	<u>3,60</u> <u>3,80</u>
	<u><i>K5a-1-2...K5a-3-2</i></u> <u><i>K6a-1...K6a-3-5</i></u>	6120	1800		720	<u>2,78</u> <u>3,10</u>
	<u><i>K9a-1-2...K9a-2-2</i></u> <u><i>K10a-1...K10a-3-3</i></u>	7175			1775	<u>2,90</u> <u>3,10</u>
	<u><i>K13a-1-1...K13a-3-6</i></u> <u><i>K14a-1...K14a-5-6</i></u>	11225	4650	4800		720
	<u><i>K15a-1-1...K15a-2-6</i></u> <u><i>K16a-1...K16a-5-6</i></u>	8520	3000		<u>3,70</u> <u>4,00</u>	
	<u><i>K19a-1-1...K19a-4-6</i></u> <u><i>K20a-1...K20a-7-6</i></u>	9575			1775	<u>4,10</u> <u>4,50</u>
	<u><i>K21a-1-1...K21a-1-6</i></u> <u><i>K22a-1...K22a-5-6</i></u>	12425	5850	<u>5,10</u> <u>5,60</u>		
	<u><i>K27a-2-1...K27a-4-6</i></u> <u><i>K28a-1...K28a-14-6</i></u>	13640		6000		<u>5,80</u> <u>6,20</u>
	<u><i>K69a-1-1...K69a-1-6</i></u> <u><i>K70a-1...K70a-3-6</i></u>	10930	4200		720	<u>4,60</u> <u>5,00</u>

Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		H	h	h_1	h_2	
	$\frac{K7a-1-2...K7a-3-2}{K8a-1...K8a-4-3}$	8825	3450	3600	1775	$\frac{5,30}{6,00}$
	$\frac{K17a-1-1...K17b-5-6}{K18a-1...K18a-8-6}$	11225	4650	4800		$\frac{6,60}{6,80}$
	$\frac{K23a-1-1...K23a-4-6}{K24a-1...K24a-8-6}$	12425	5850			$\frac{7,30}{7,50}$
	$\frac{K29a-1-1...K29a-5-6}{K30a-1...K30a-3-6}$	13640	5850	6000		$\frac{8,10}{8,40}$
	$\frac{K33a-1-1...K33a-1-6}{K34a-1...K34a-3-6}$	14840	7050	6000		$\frac{8,80}{9,10}$

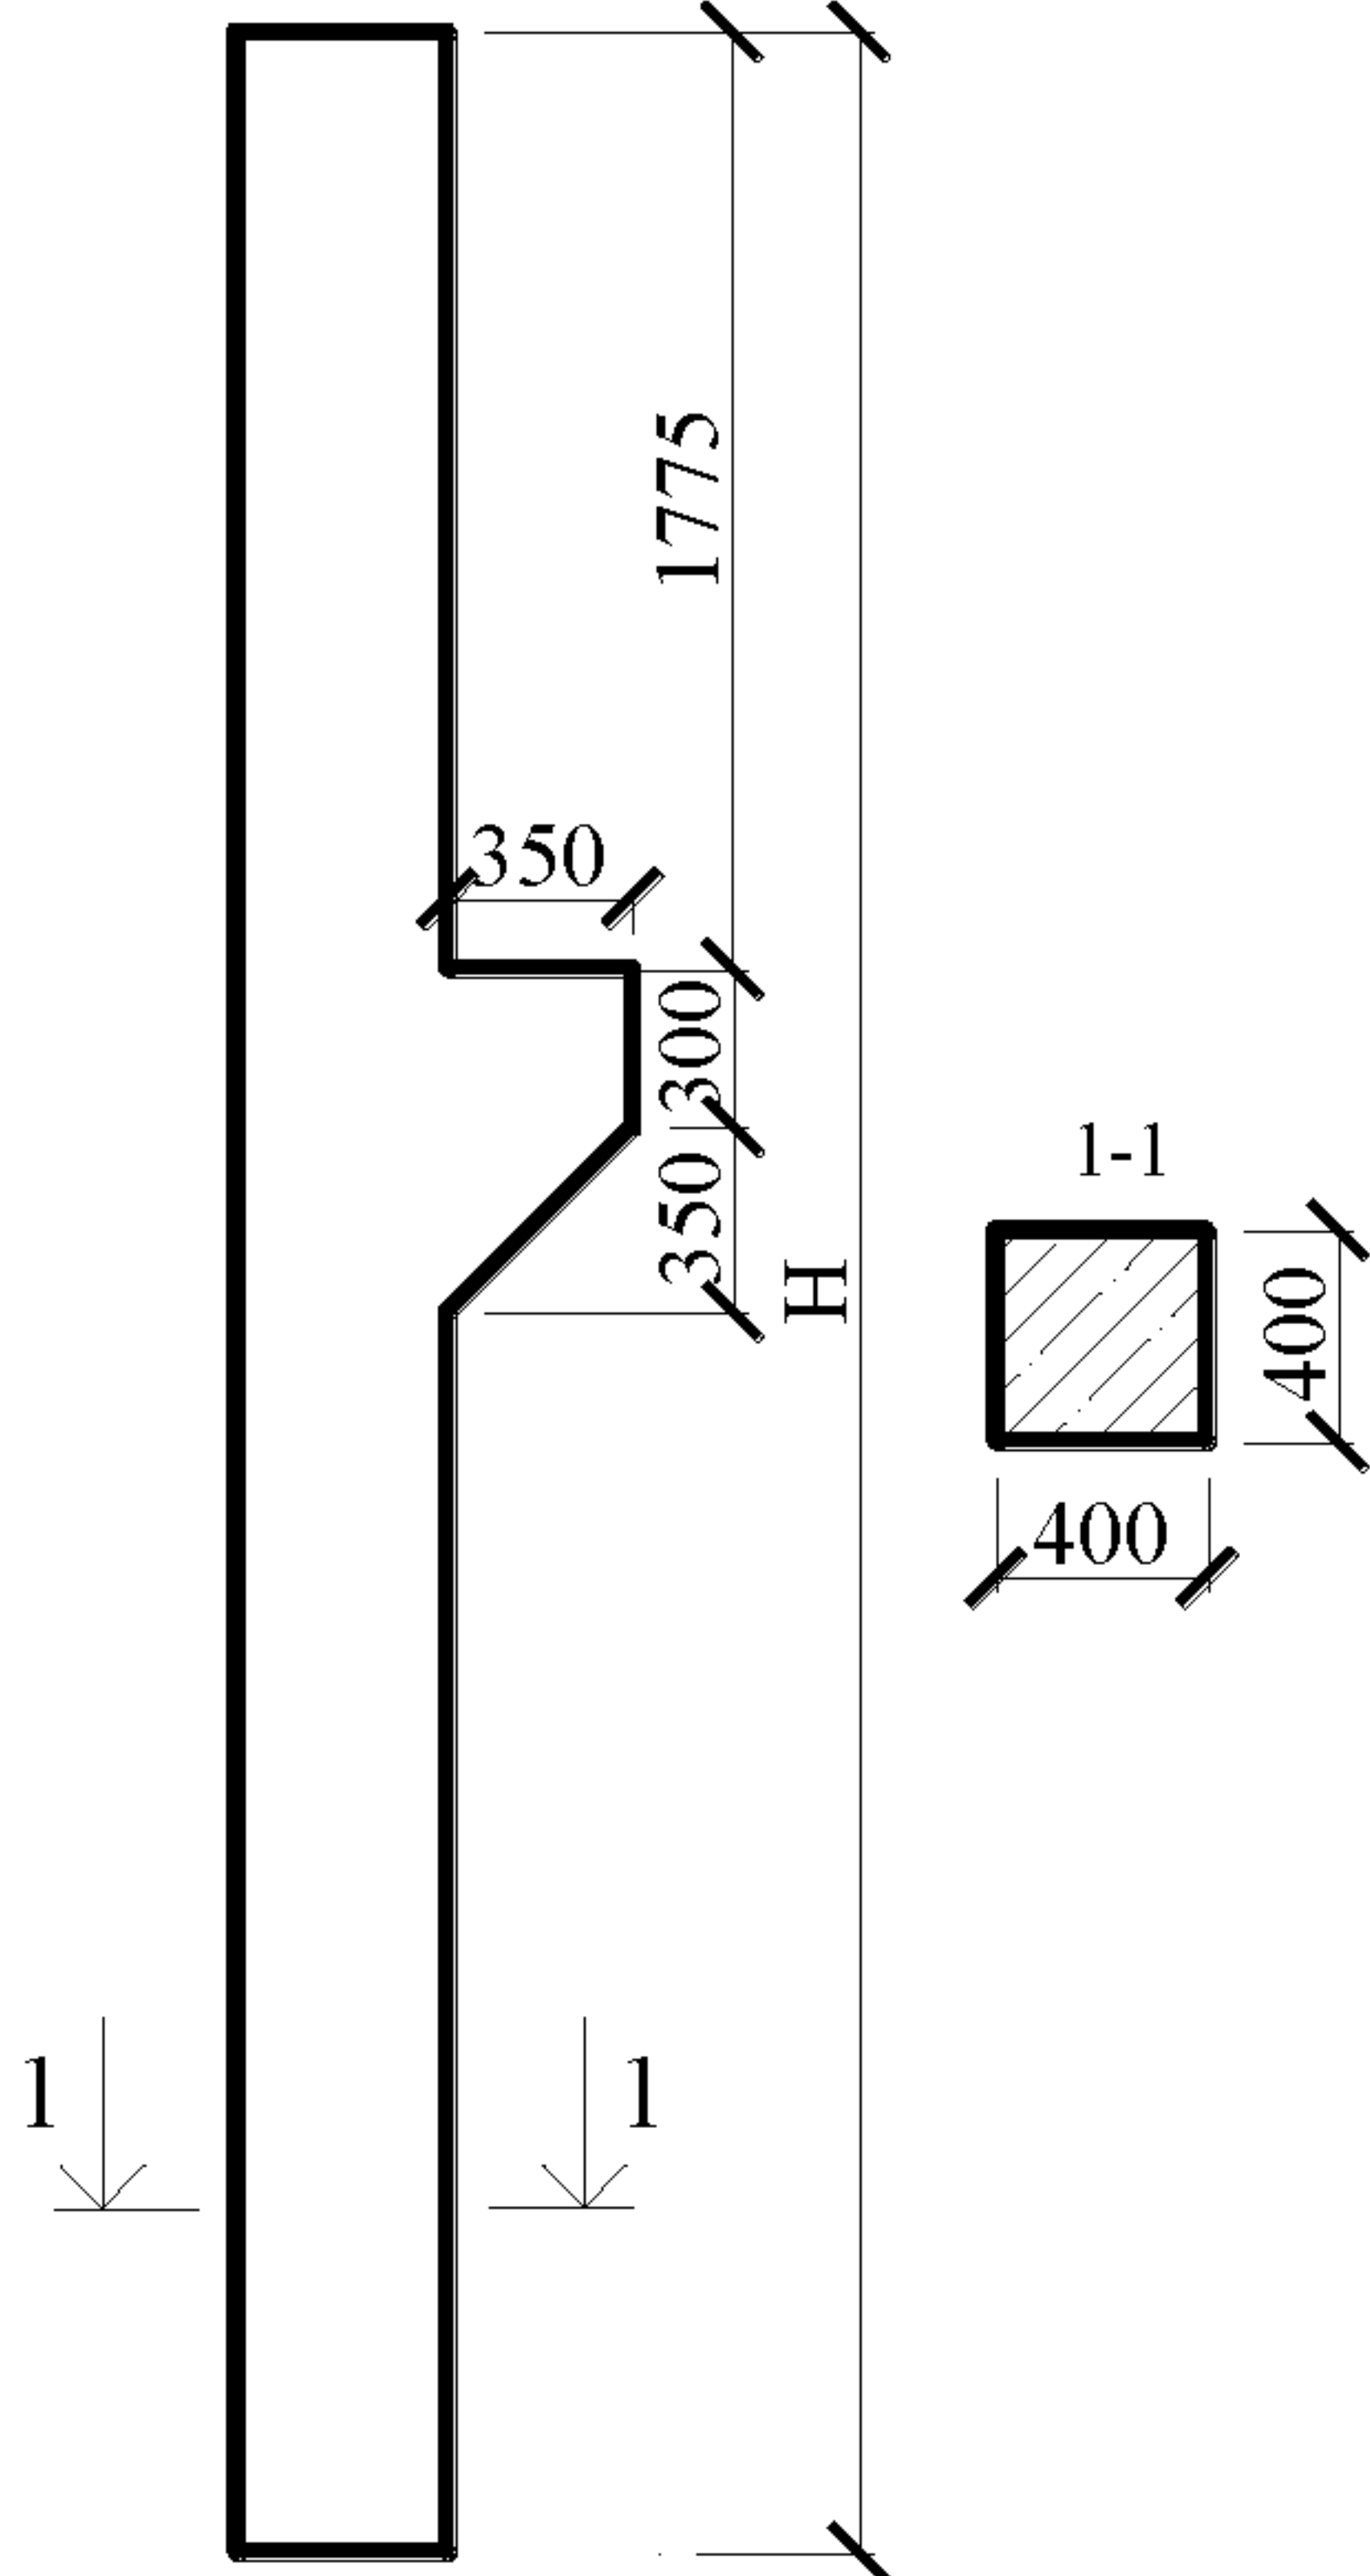
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		H	h	h_1	h_2	
	$K61a-1-2...K61a-4-5$ $K62a-1...K62a-5-5$	11370	3450	3600	720	$\frac{5,05}{5,30}$
	$K65a-1-2...K65a-4-5$ $K66a-1...K66a-4-5$	12425			1775	$\frac{5,47}{5,98}$

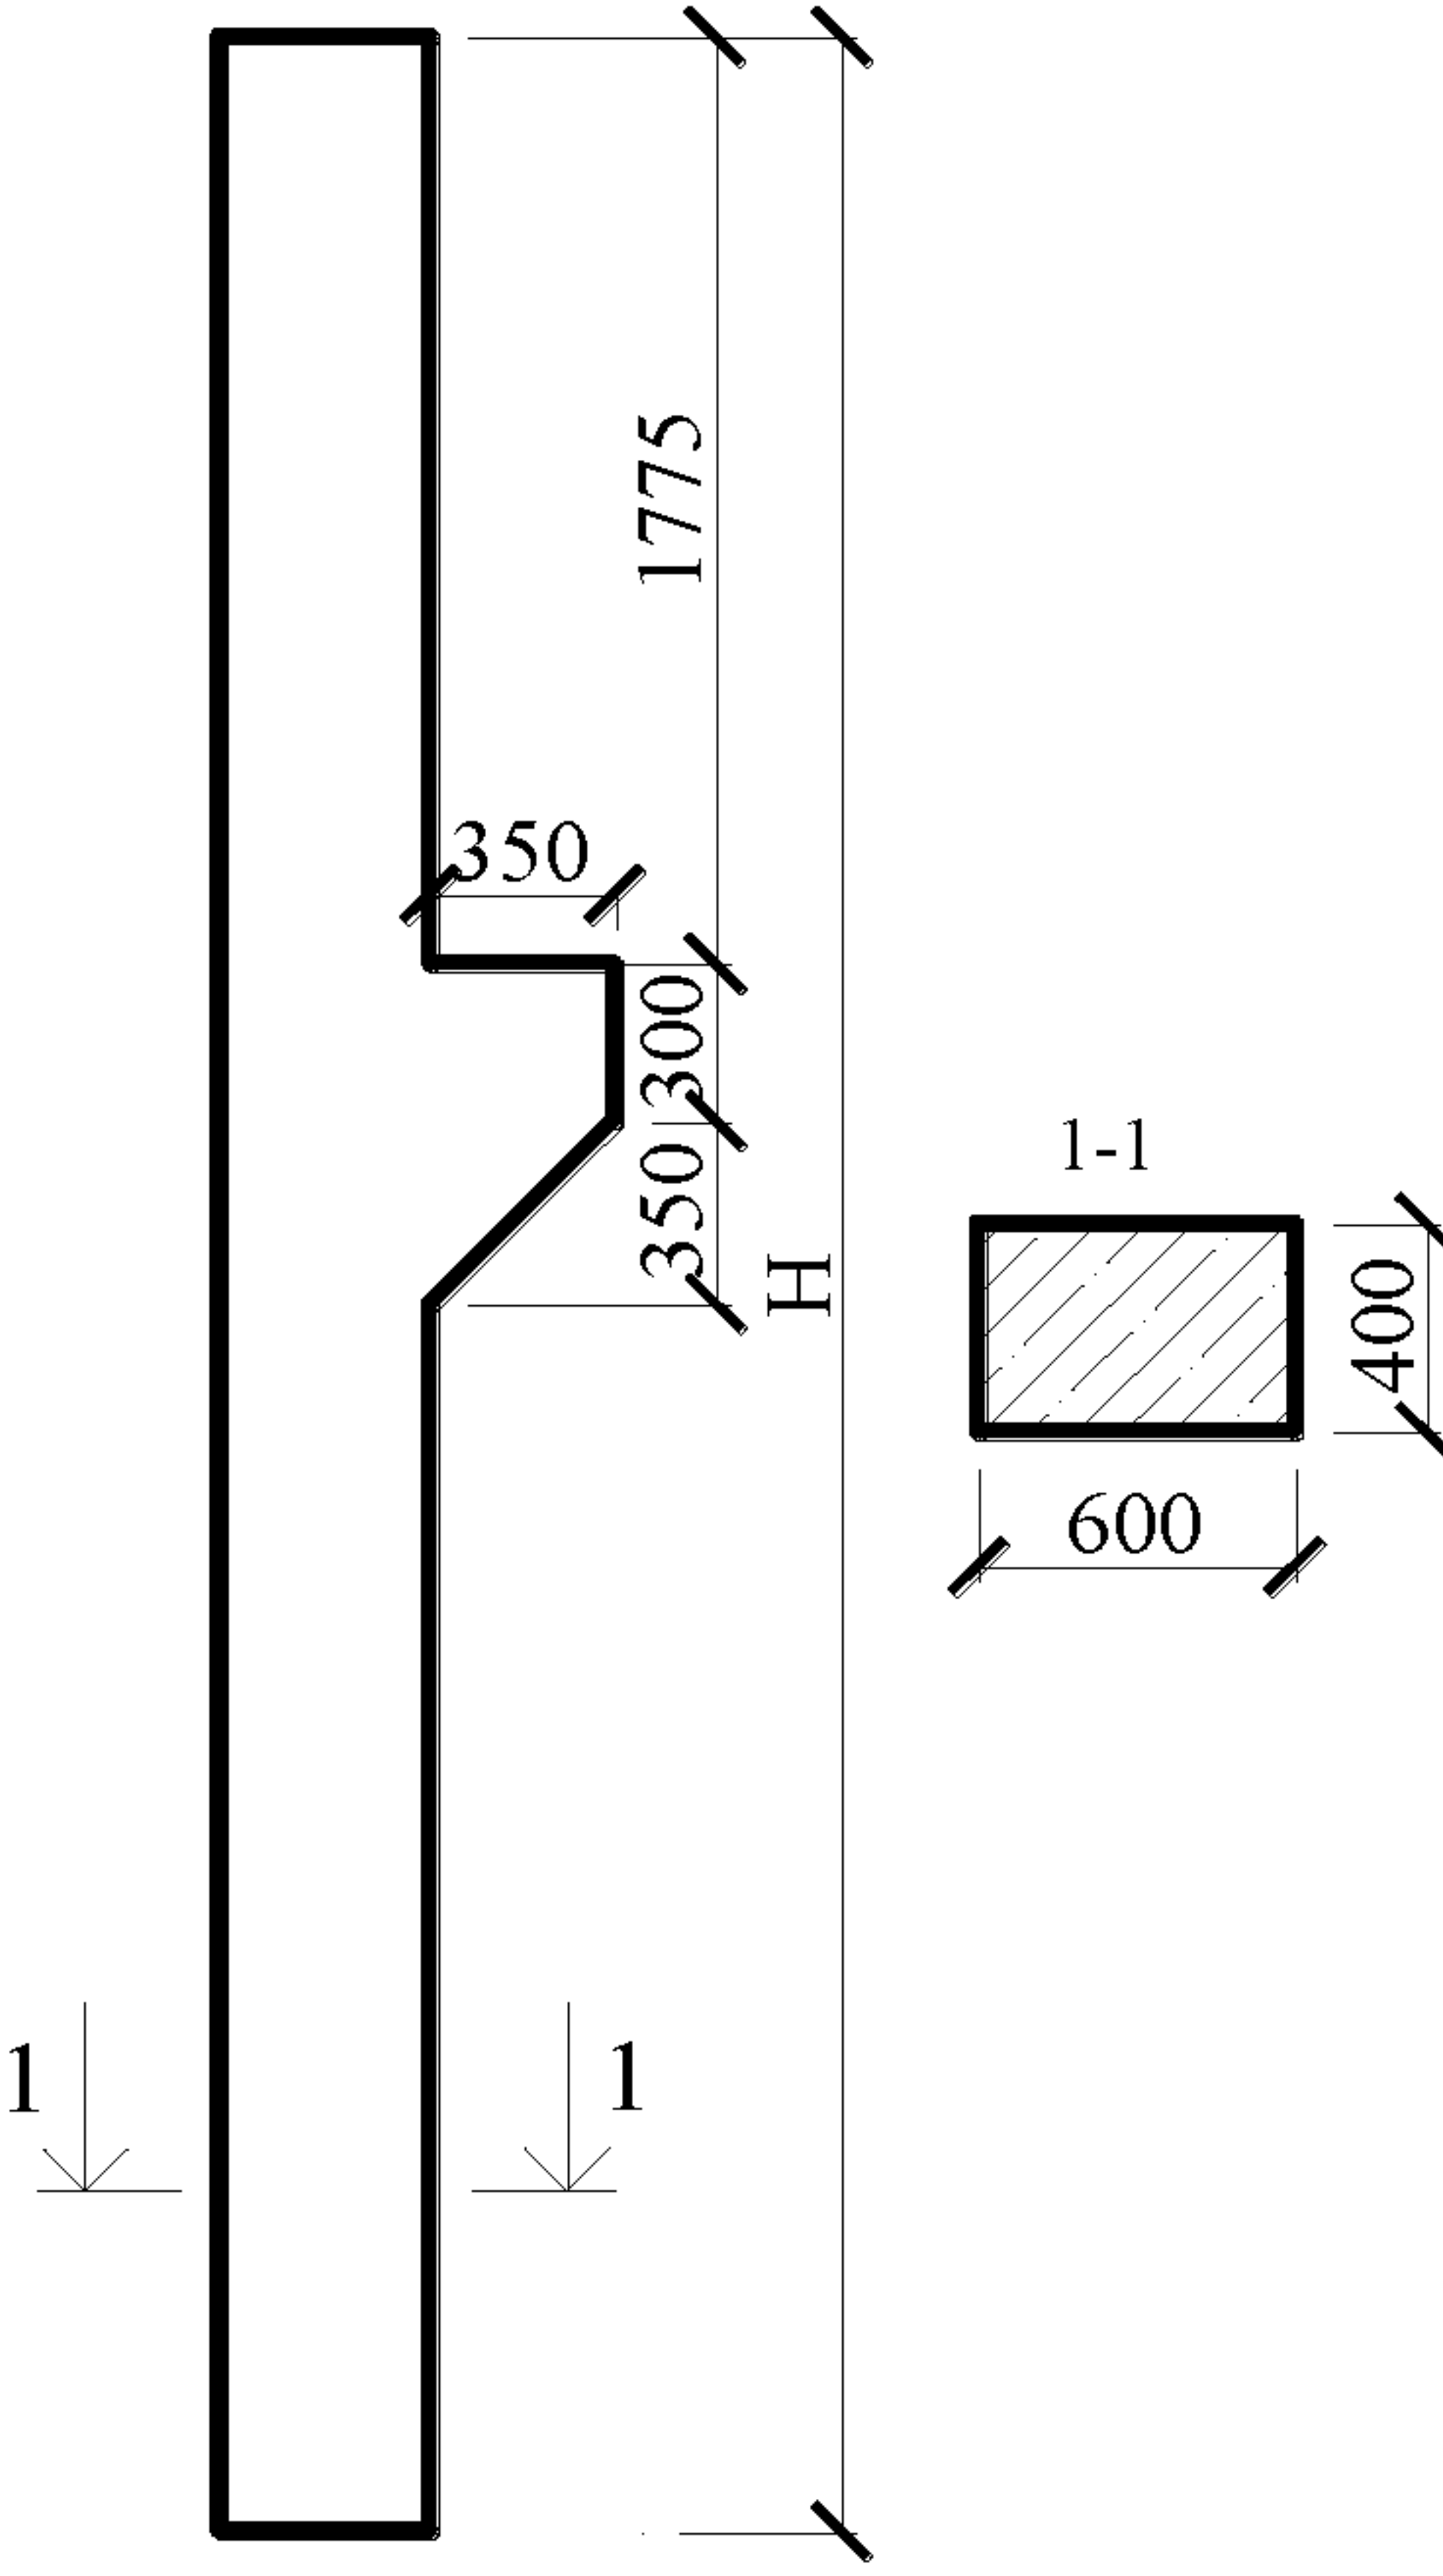
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		H	h	h_1	h_2	
	$K63a-1-2...K63a-1-5$ $K64a-1...K64a-1-5$	11370	3450	3600	720	$\frac{6,30}{6,80}$
	$K67a-1-2...K67a-4-2$ $K68a-1...K68a-6-3$	12425			1775	$\frac{6,75}{7,26}$

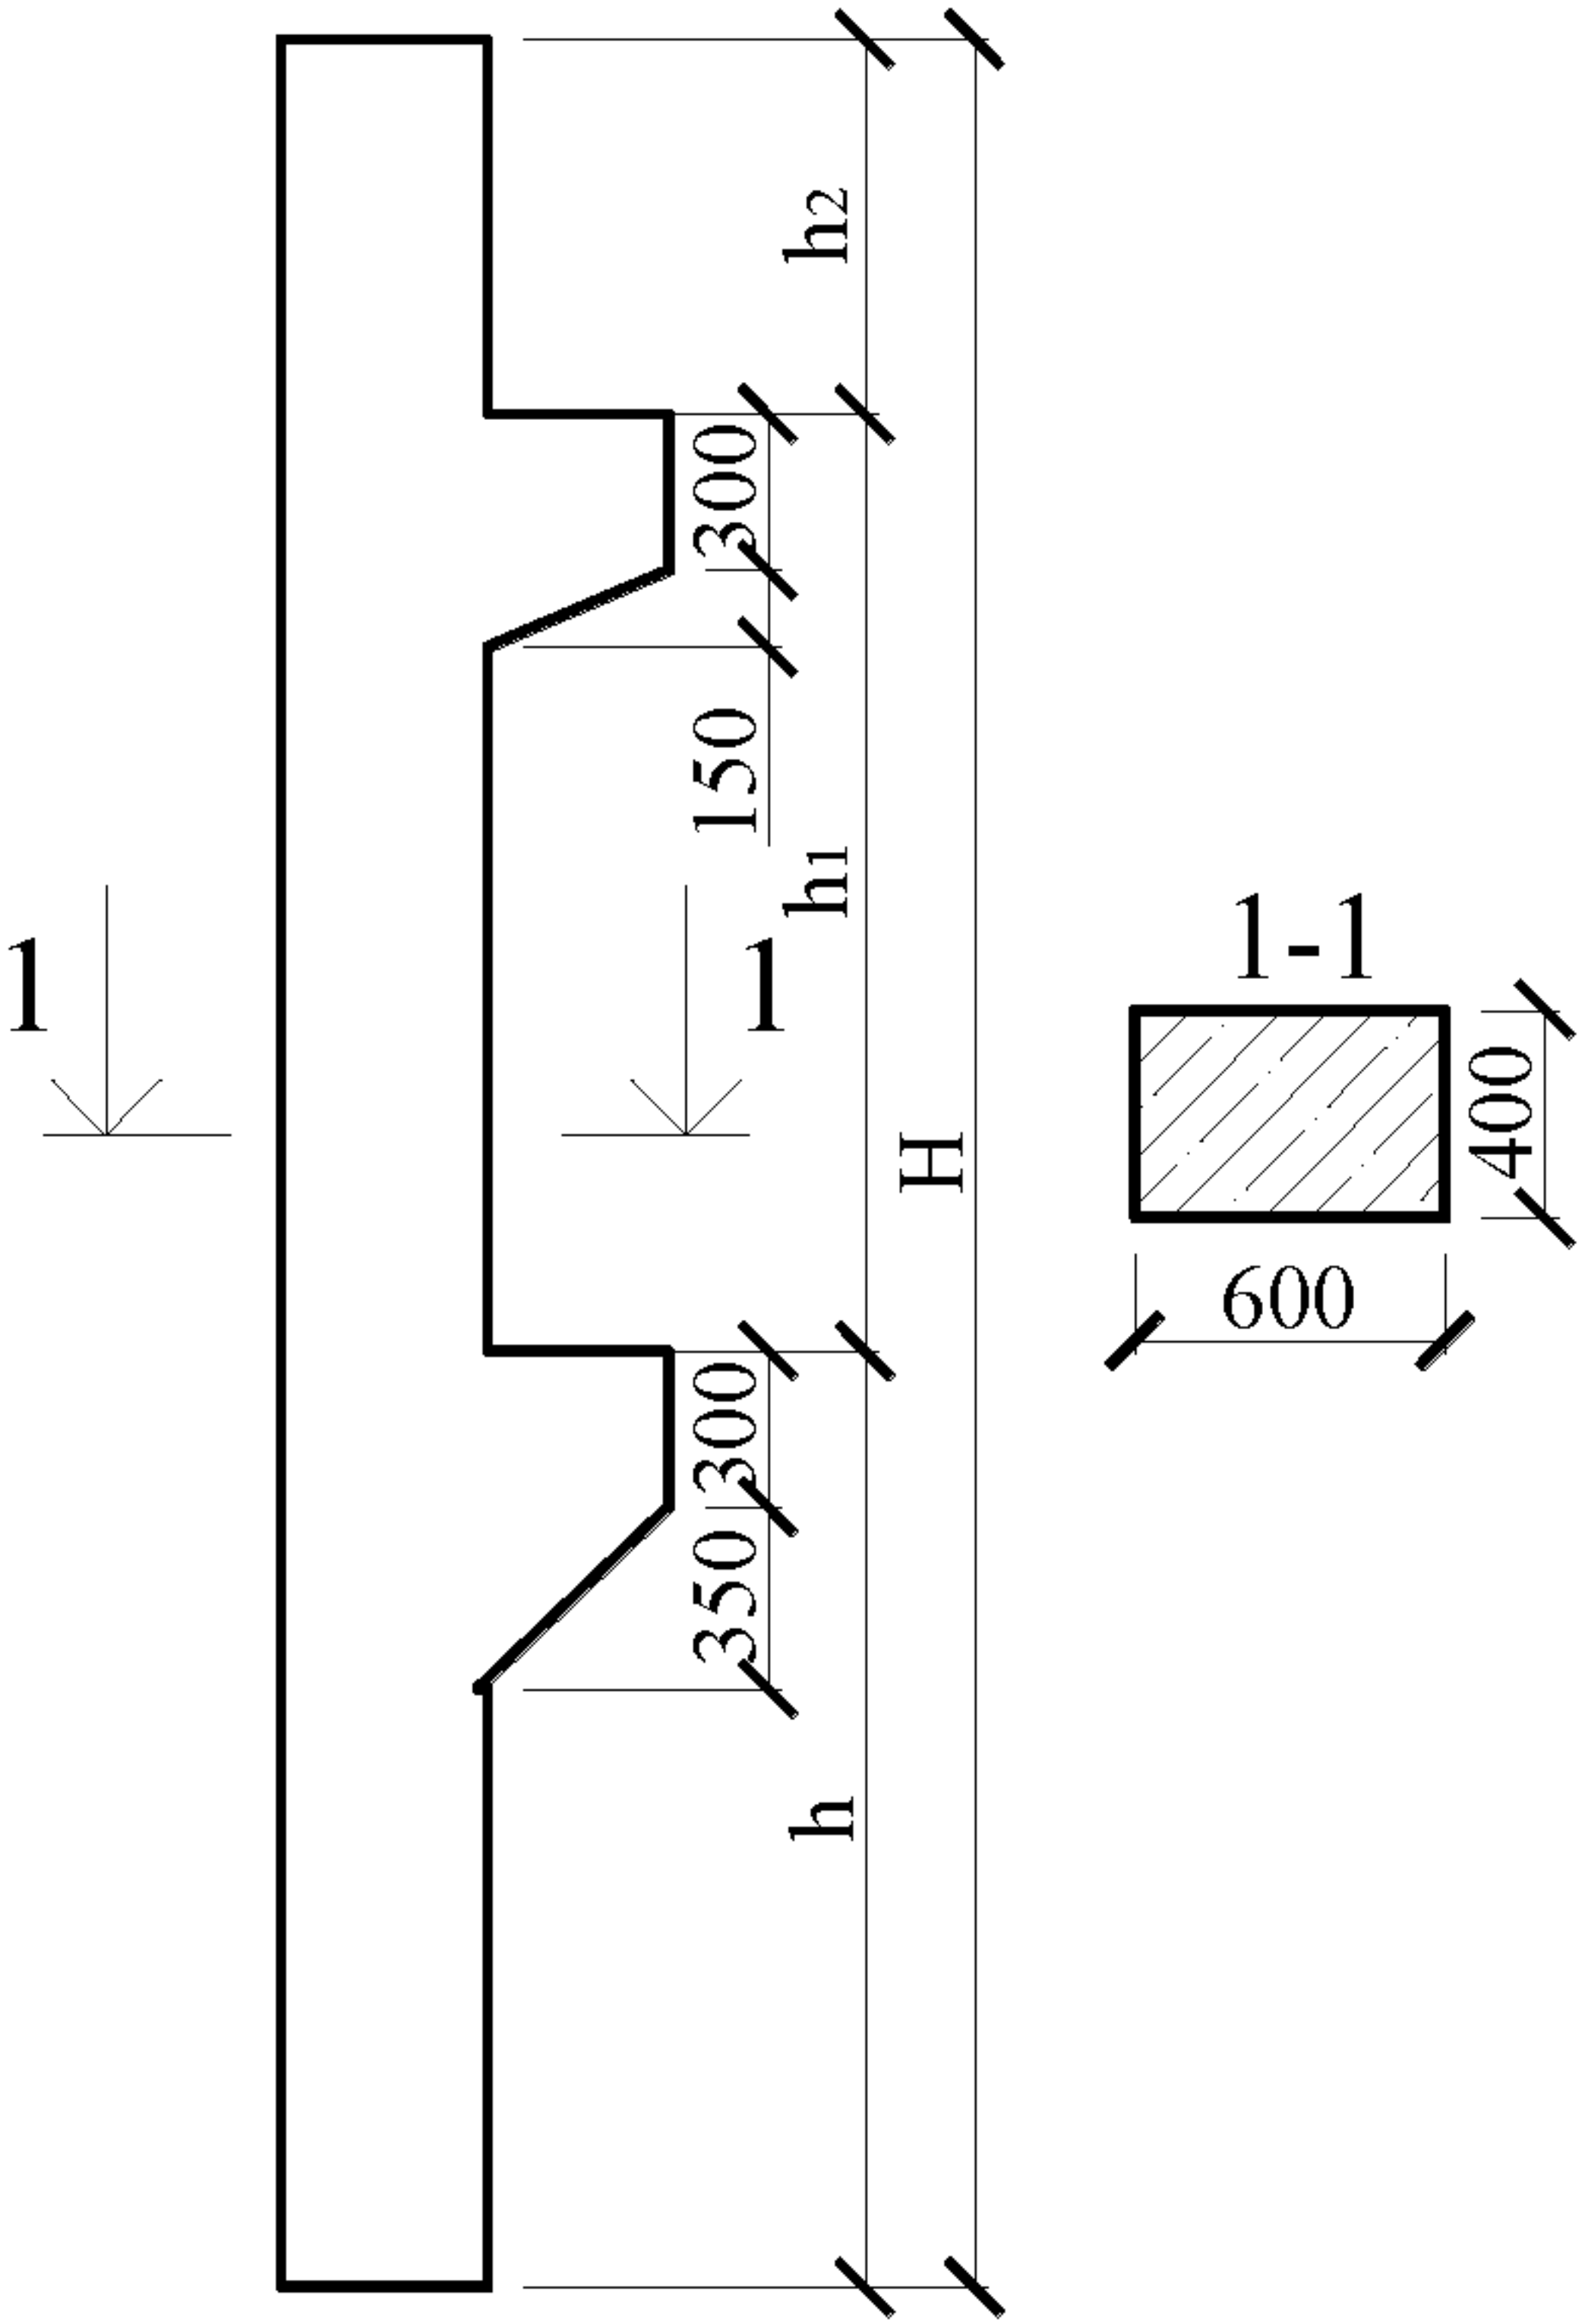
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: <u>в крайнем ряду</u> <u>в среднем ряду</u>	Размеры, мм				Масса, тс: <u>в крайнем ряду</u> <u>в среднем ряду</u>
		<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	
	<i>K35-1-1...K35a-1-6</i>	4775	-	-	-	2,00

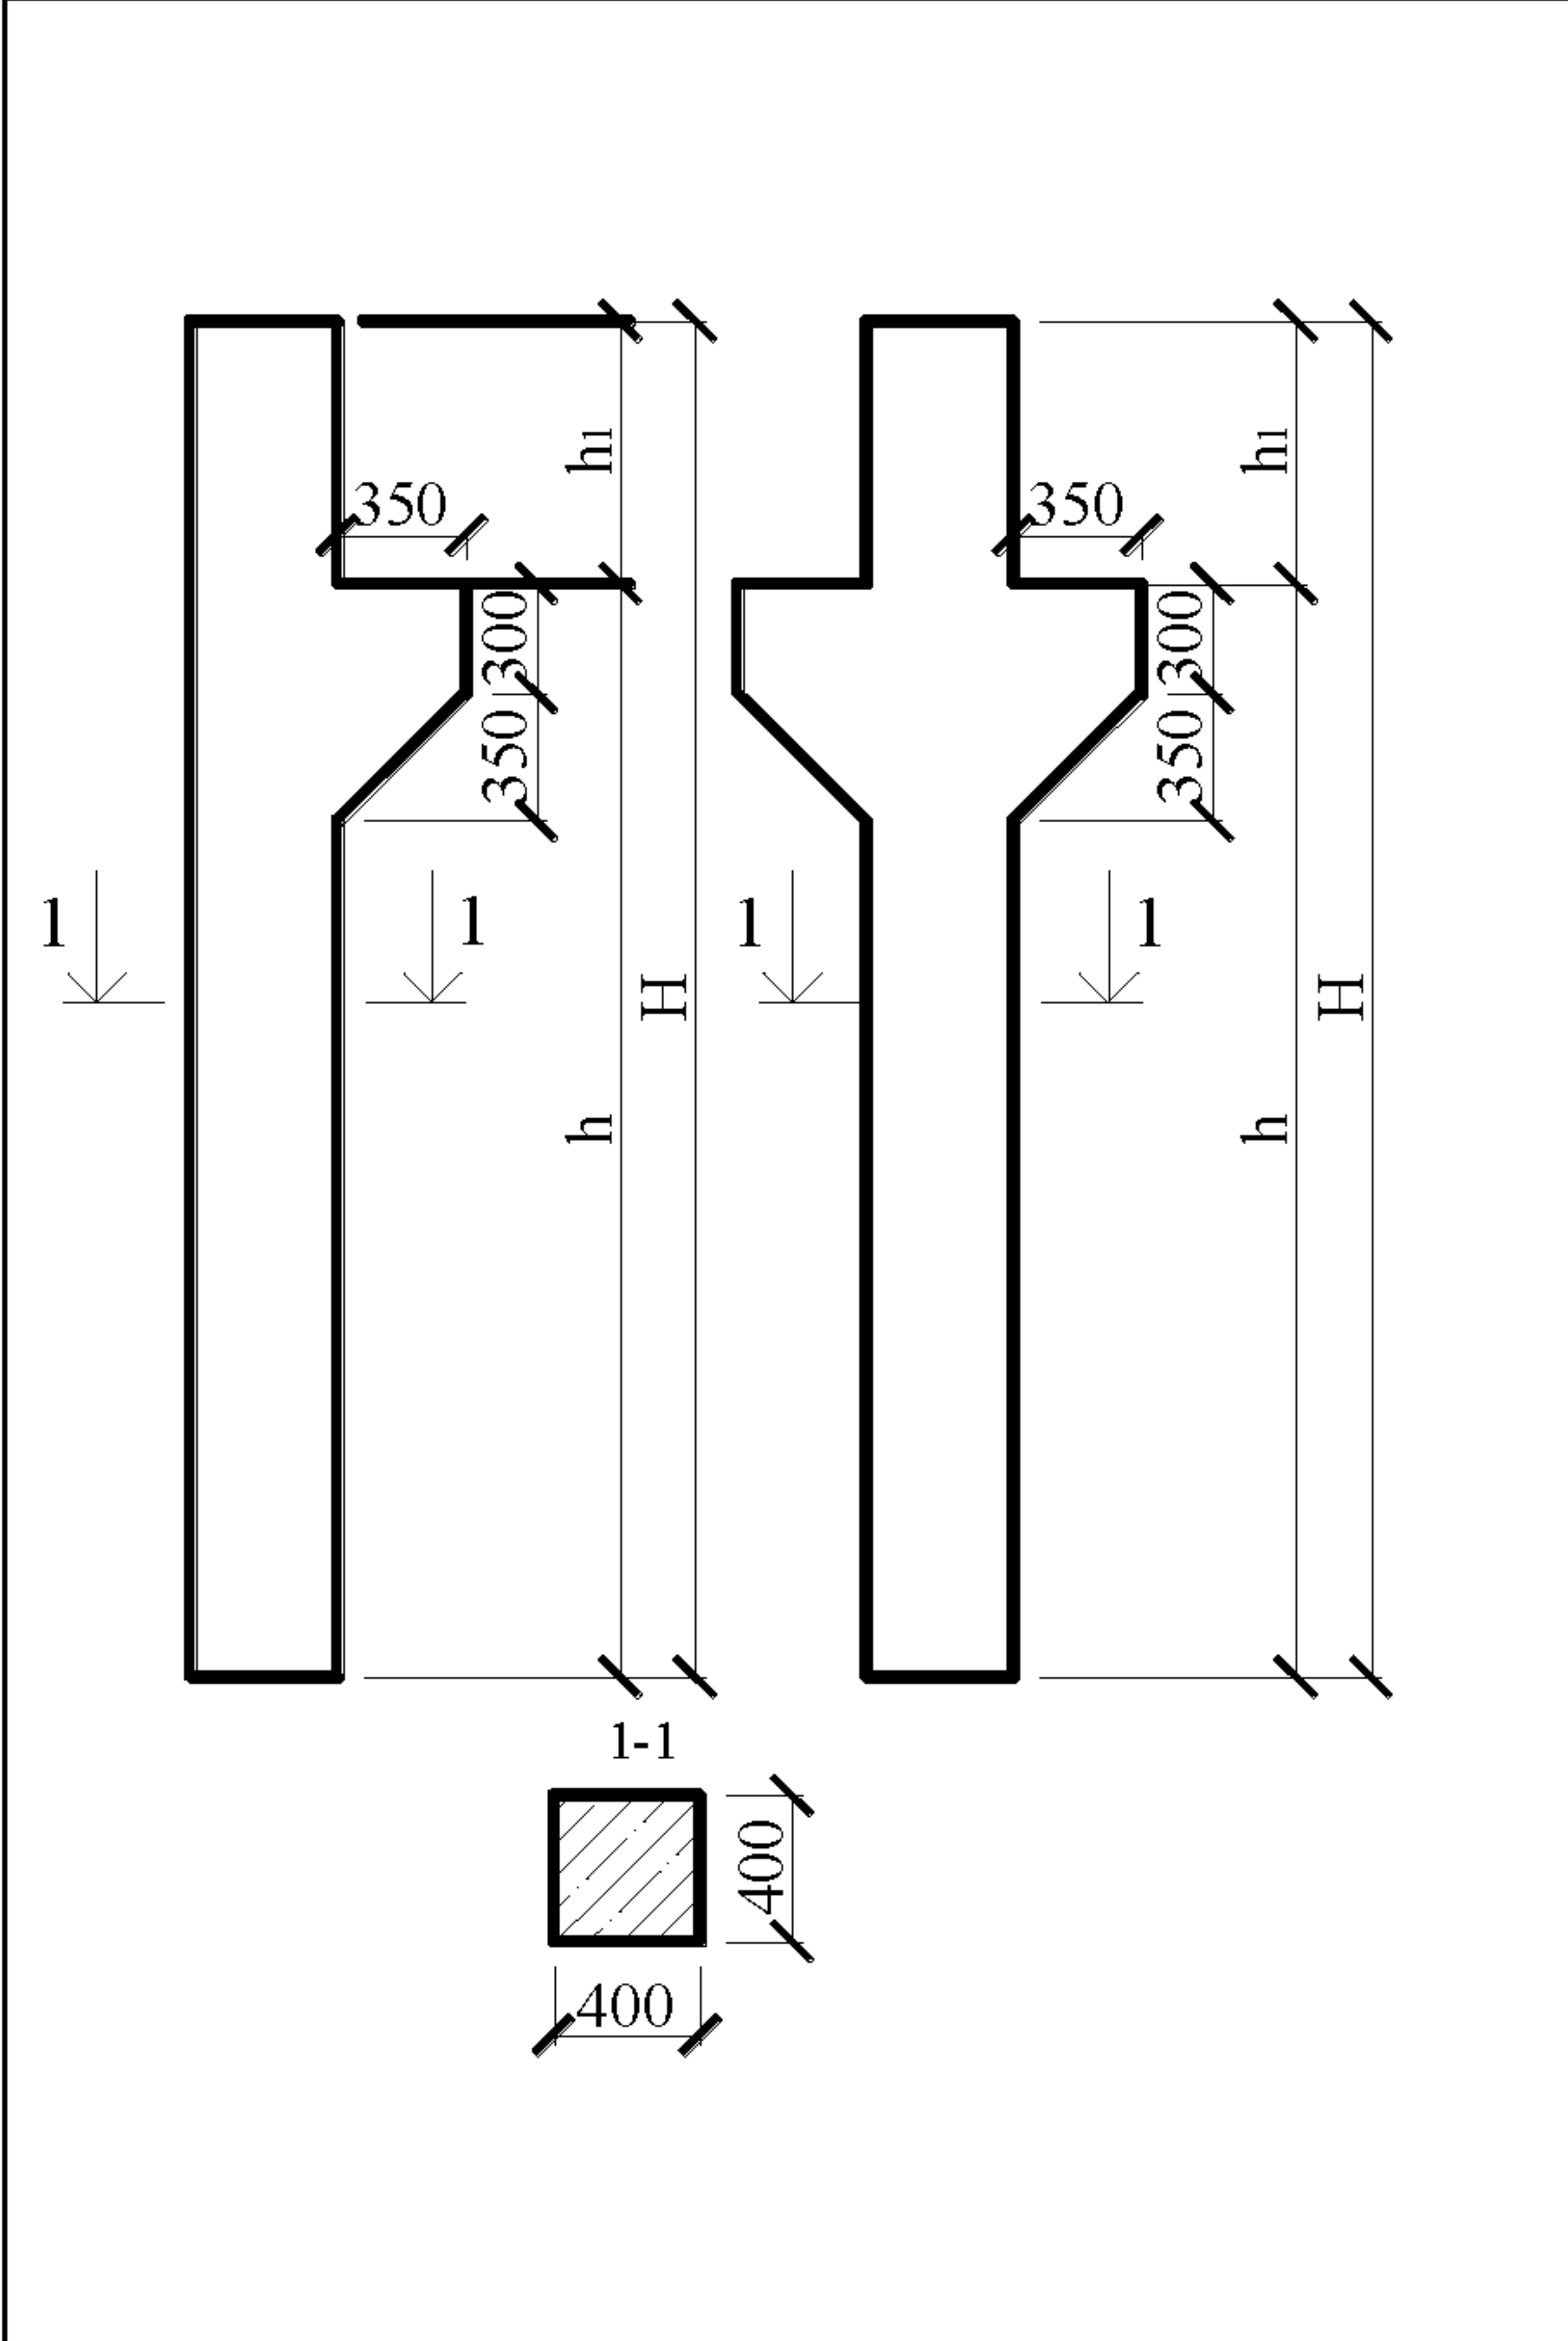
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: <u>в крайнем ряду</u> <u>в среднем ряду</u>	Размеры, мм				Масса, тс: <u>в крайнем ряду</u> <u>в среднем ряду</u>
		<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	
	<i>K39a-1-2...K39a-3-6</i>	4775	-	-	-	3,00

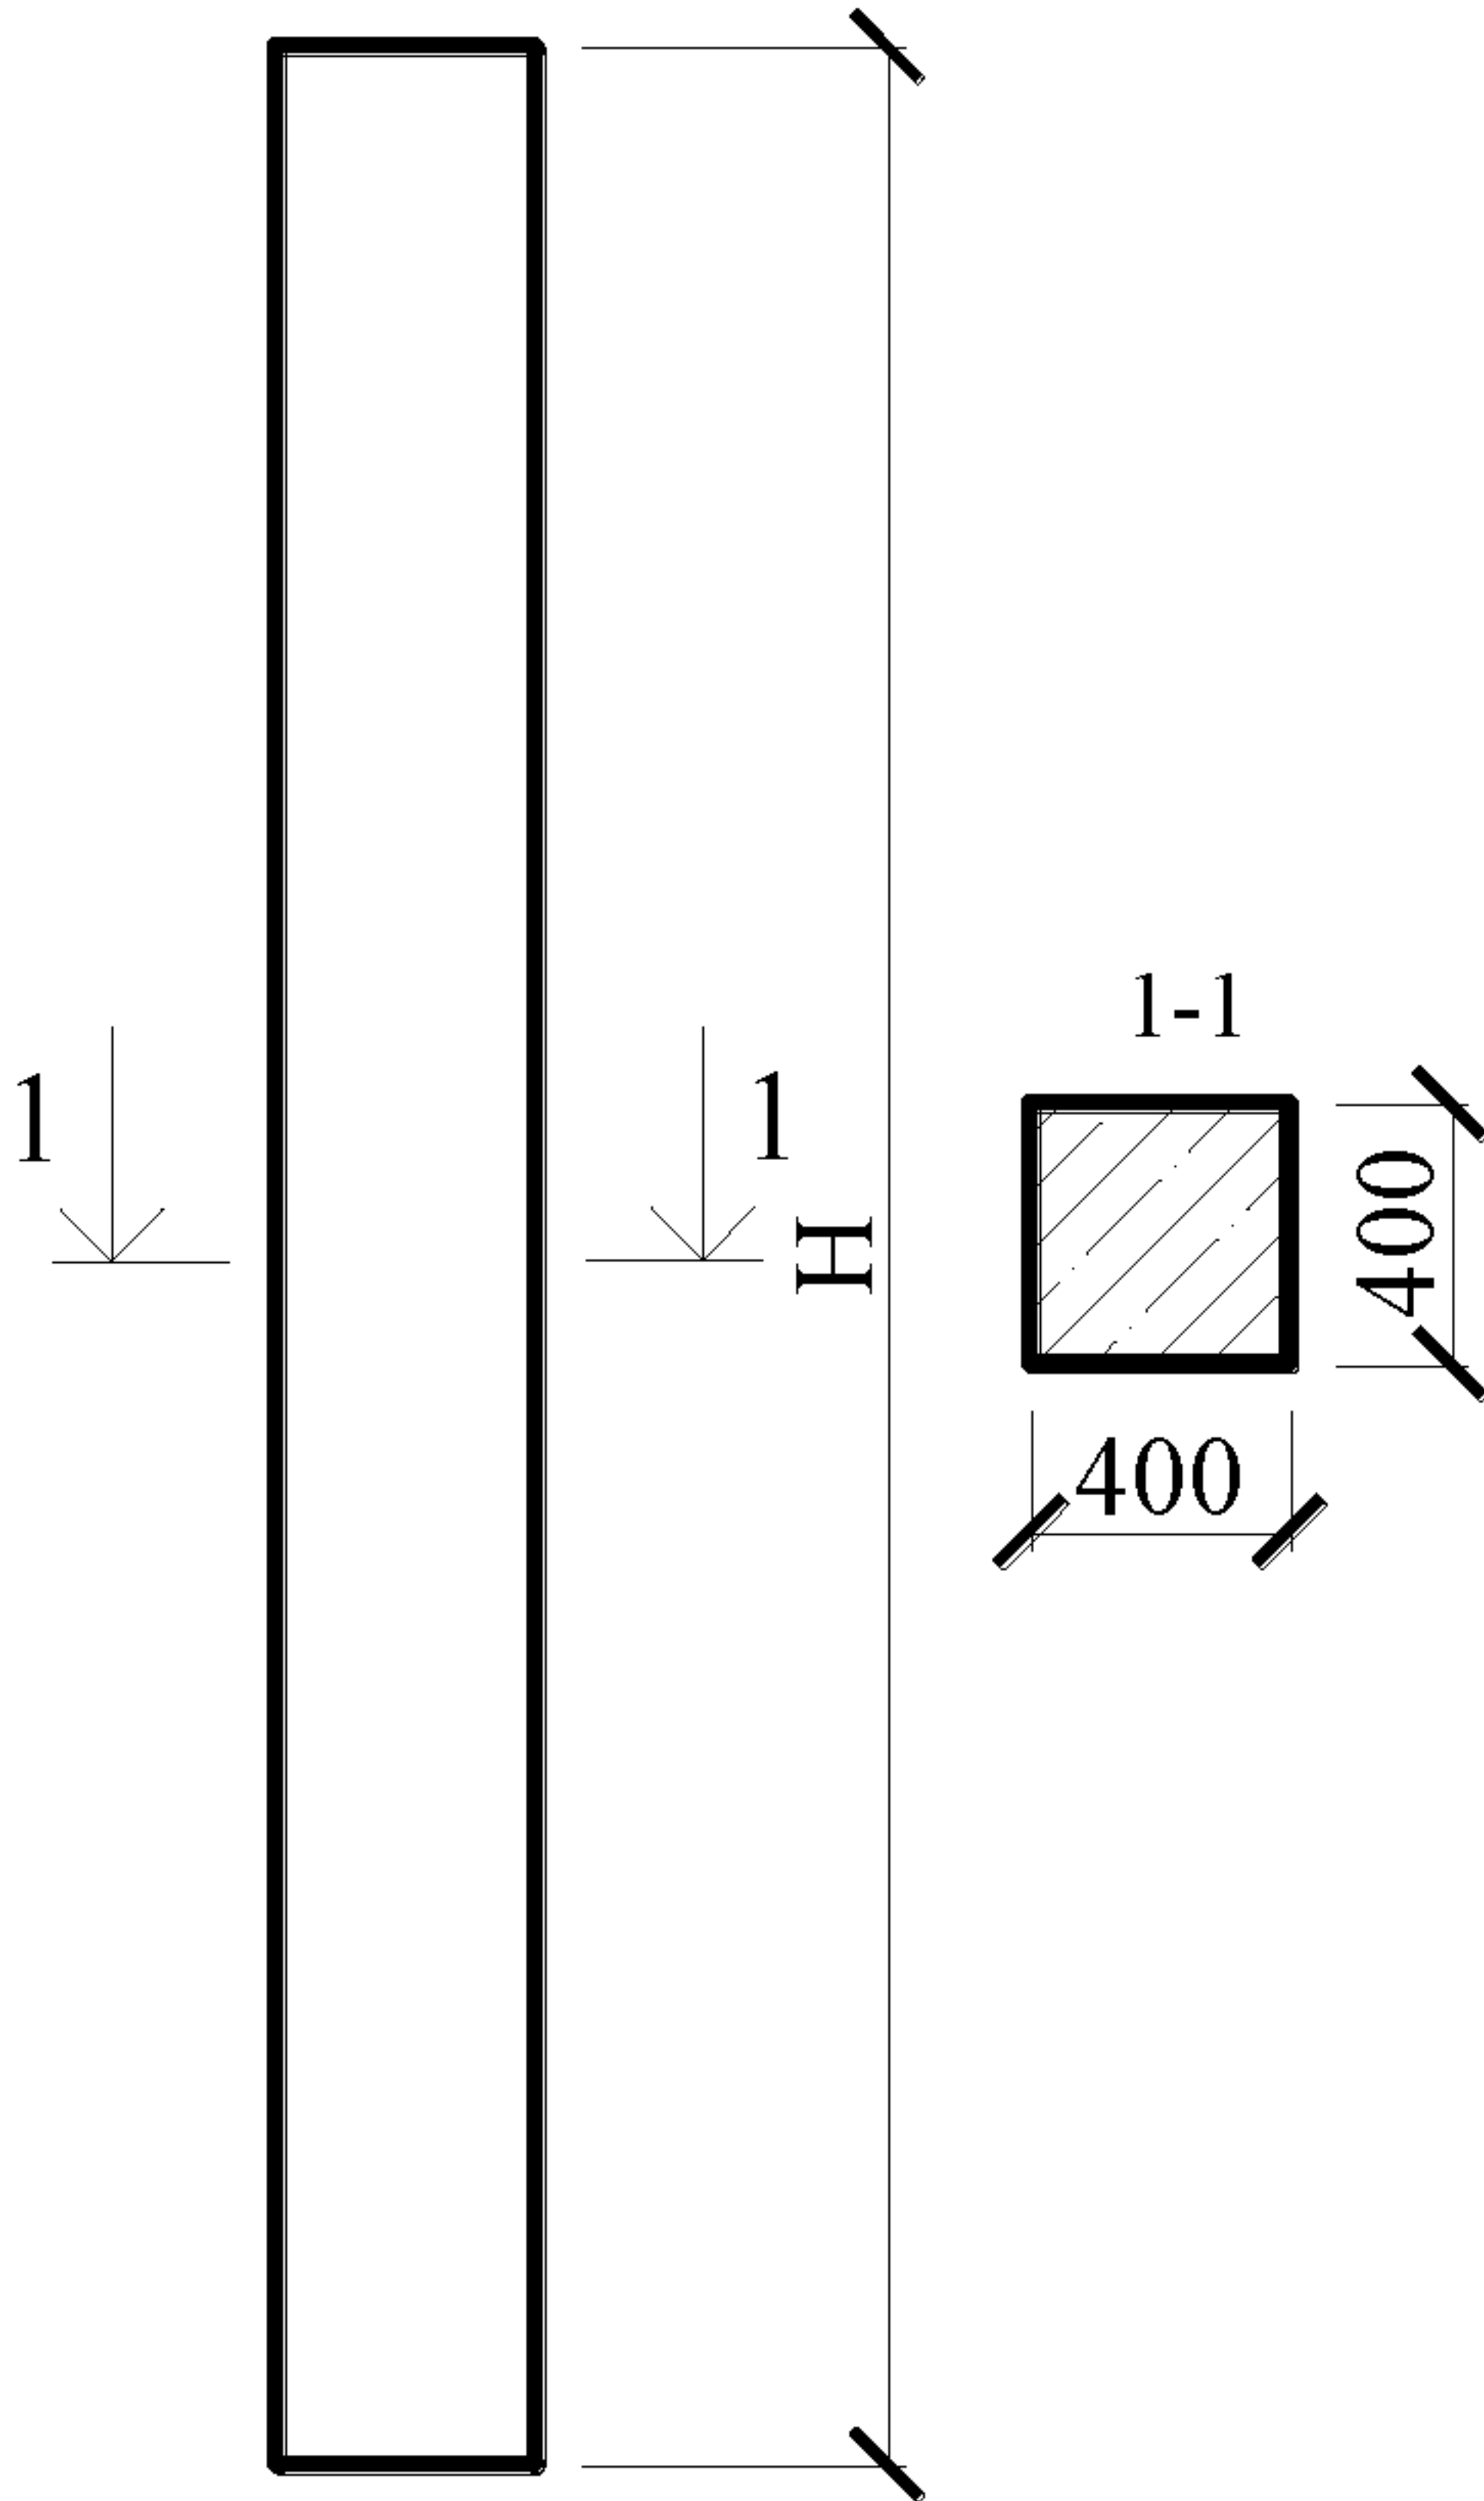
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		H	h	h_1	h_2	
	$K37a-1-4...K37a-4-6$	11225	4650	4800	1775	7,10
	$K41a-1-2...K41a-2-6$	9575	3000			6,10

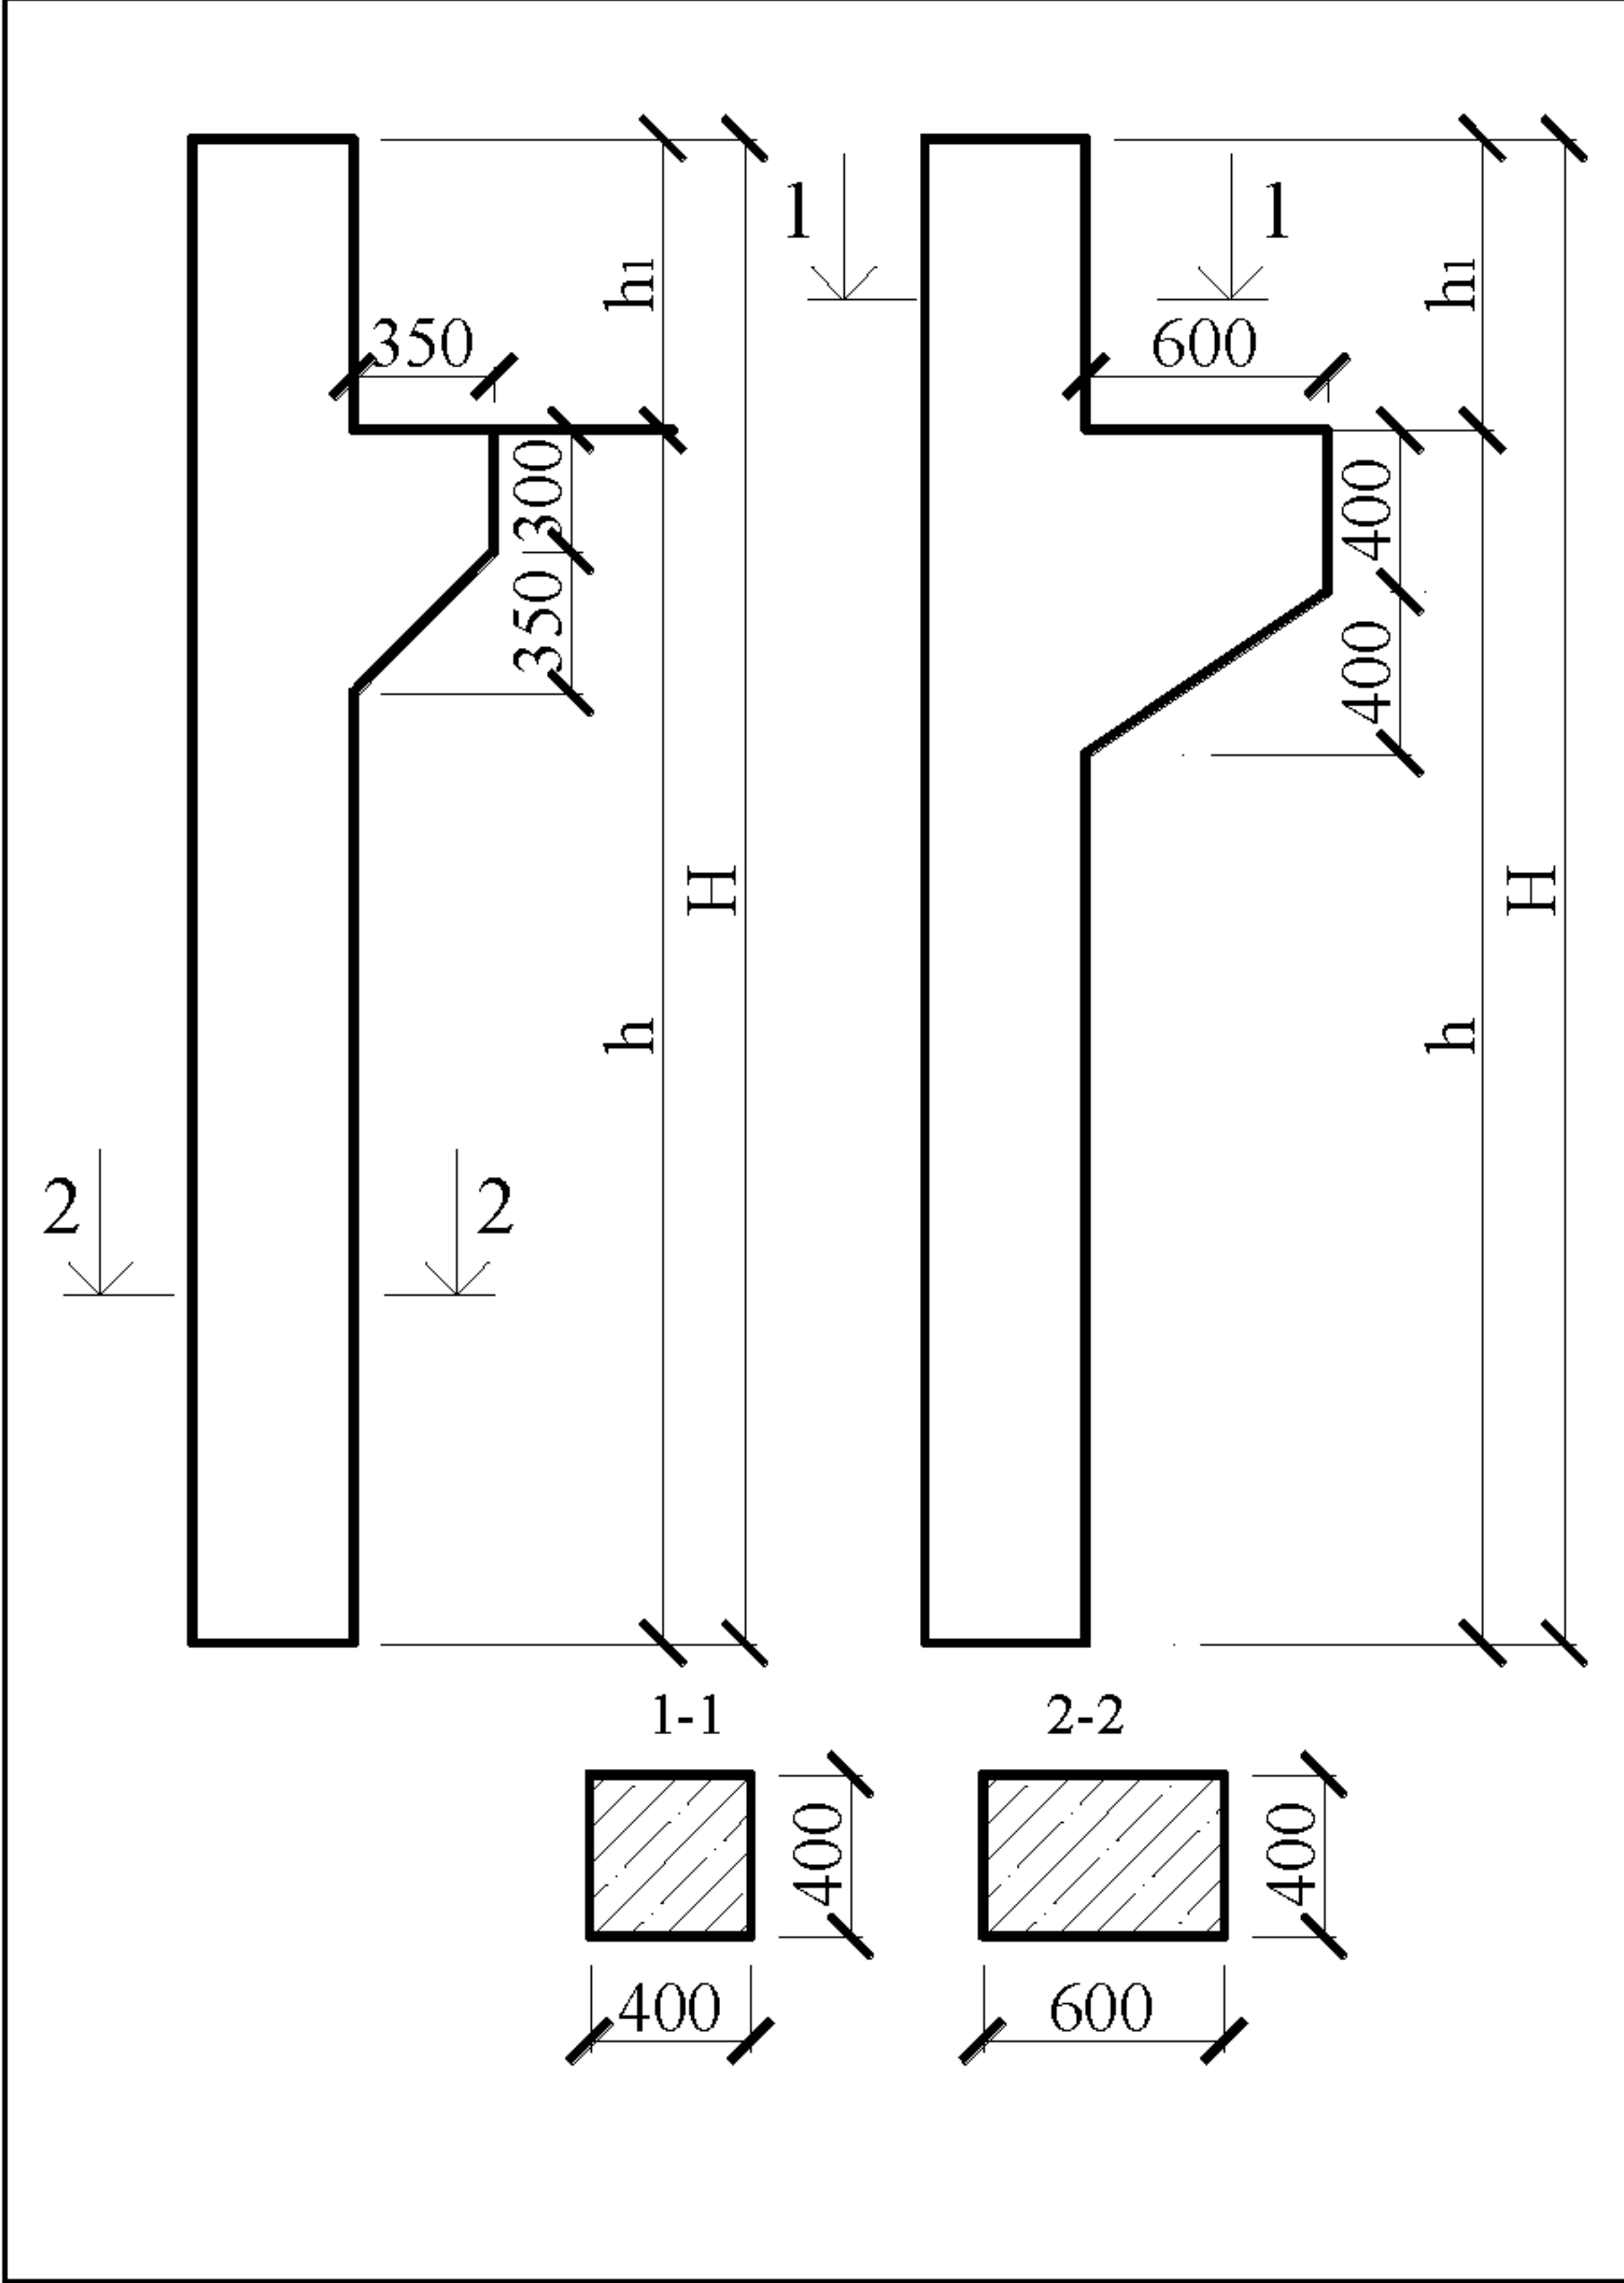
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		H	h	h_1	h_2	
	$K25a-1-3...K25a-1-6$ $K26a-1...K26a-2-6$	4920	4200	720	-	$\frac{2,10}{2,30}$
	$K31a-1-1...K31a-4-6$ $K32a-1...K32a-2-6$	6000		1775		$\frac{2,50}{2,70}$

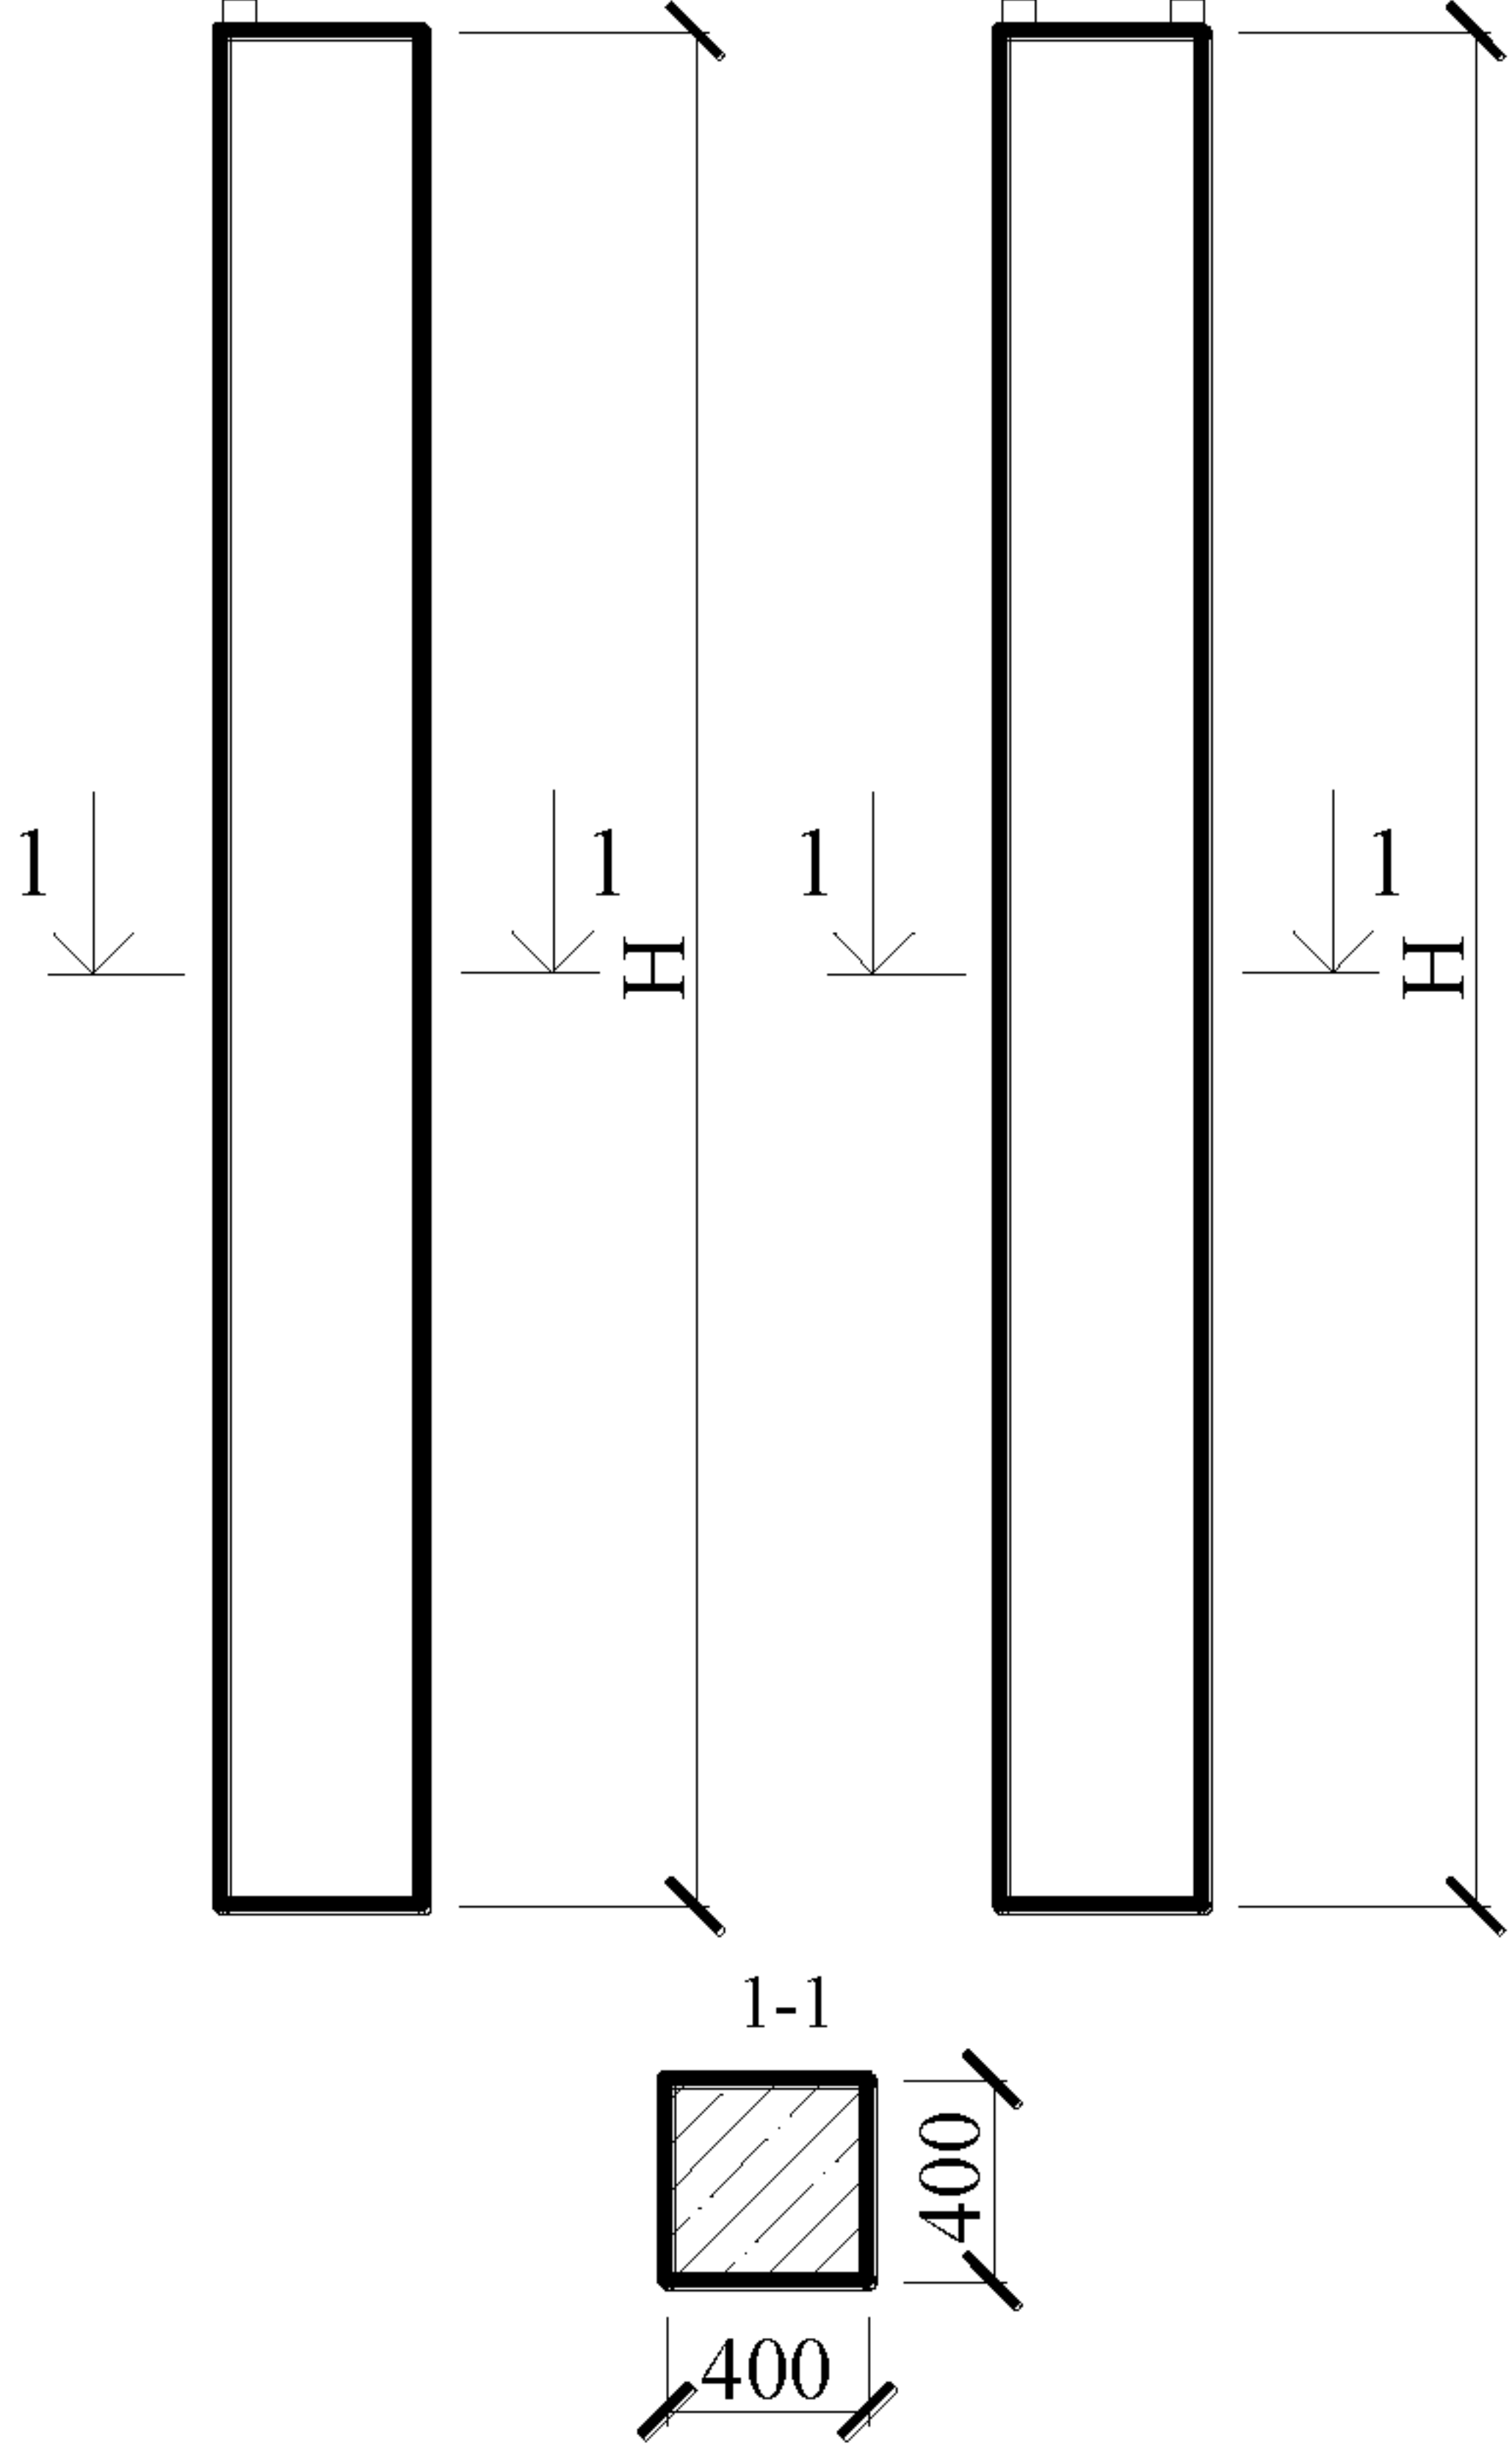
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: <u>в крайнем ряду</u> <u>в среднем ряду</u>	Размеры, мм				Масса, тс: <u>в крайнем ряду</u> <u>в среднем ряду</u>
		H	h	h_1	h_2	
	$K42a-1-1...K42a-2-5$	6310	-	-	-	2,50
	$K44a-1-2...K44a-2-6$	6710				2,67

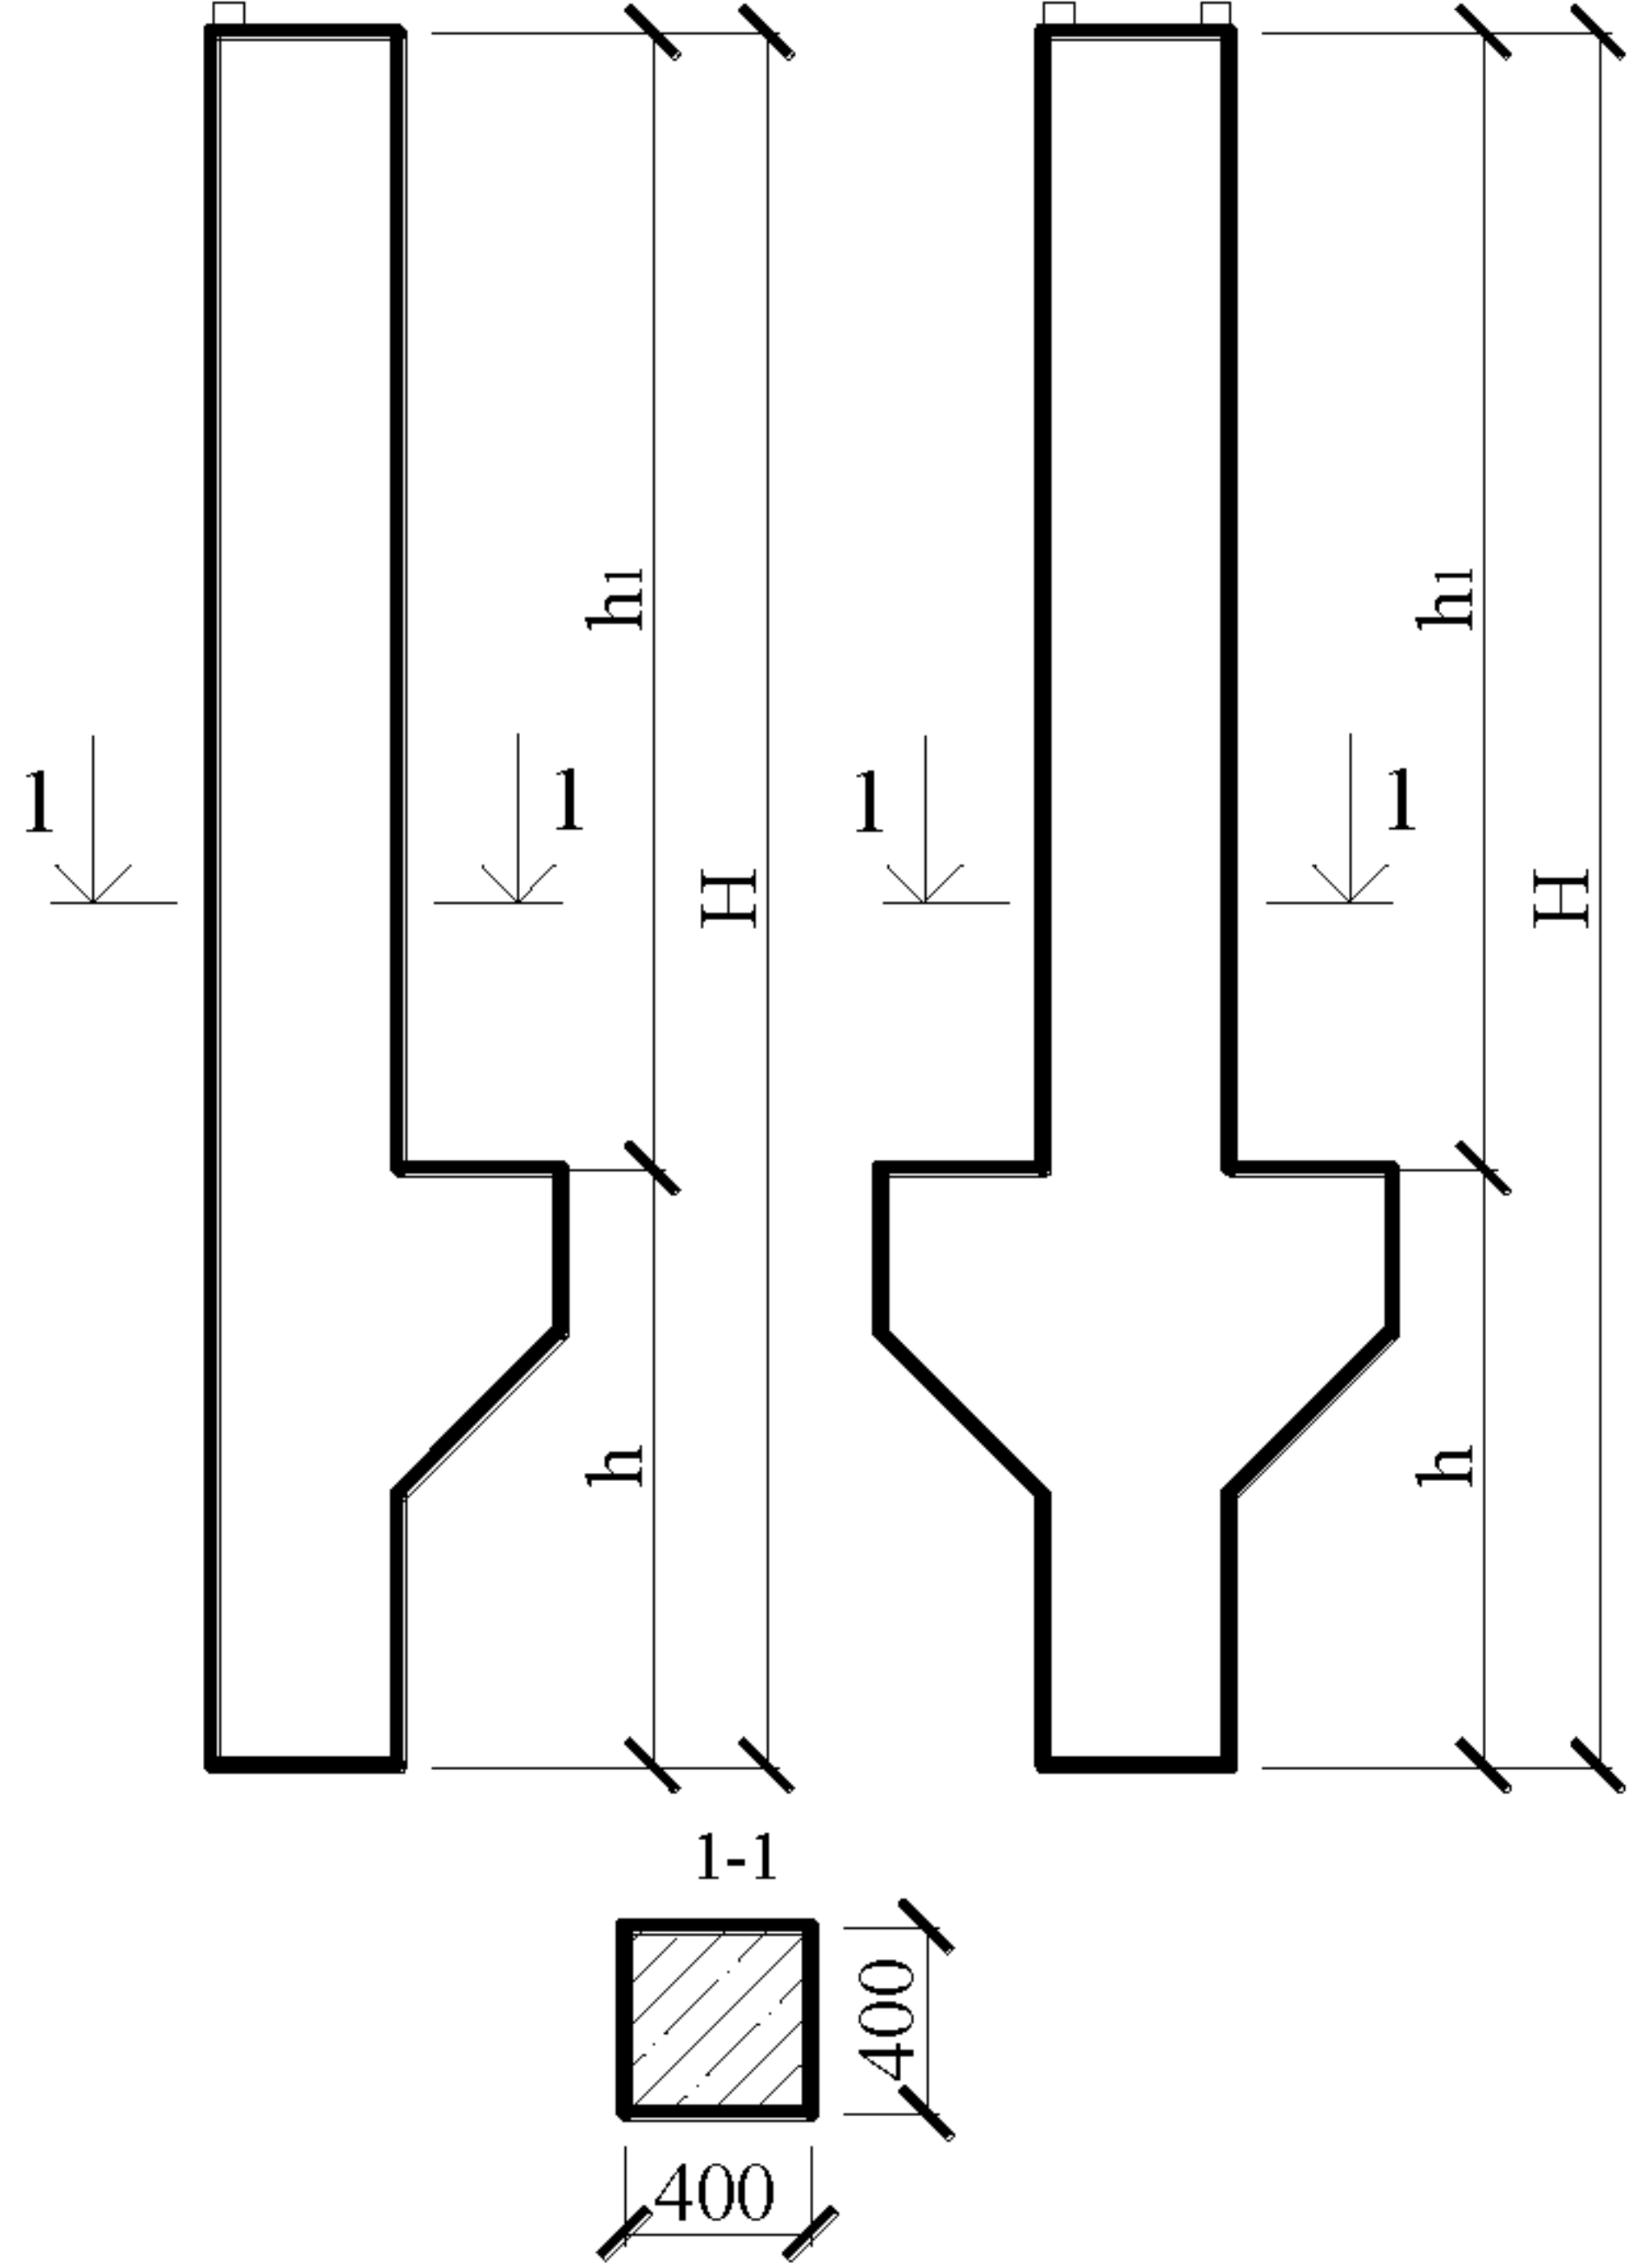
Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		H	h	h_1	h_2	
	$K45a-1-2...K45a-1-6$	6000	4200	1775	-	3,80
	$K46a-1-2...K46a-2-6$	10310	6800	3500	-	5,80

Продолжение таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: <u>в крайнем ряду</u> <u>в среднем ряду</u>	Размеры, мм				Масса, тс: <u>в крайнем ряду</u> <u>в среднем ряду</u>
		<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	
	$\frac{K75-1-2...K75-3-2}{K75-1...K75-2-5}$	1790				$\frac{0,70}{0,70}$
	$\frac{K78-1-3...K78-2-3}{K78-1...K78-2}$	2990	-	-	-	$\frac{1,20}{1,20}$
	$\frac{K81-1-3...K81-2-7}{K81-1...K81-1-5}$	4190				$\frac{1,70}{1,70}$

Окончание таблицы Д.1

Эскиз	Марка колонн: в крайнем ряду в среднем ряду	Размеры, мм				Масса, тс: в крайнем ряду в среднем ряду
		H	h	h_1	h_2	
	$\frac{K77-1-2...K77-3-5}{K76-1...K76-3-3}$	5390	1800	3590	-	$\frac{2,20}{2,50}$
	$\frac{K79-1-1...K79-3-5}{K80-1...K80-3-5}$	7790	3000	4790		$\frac{3,40}{3,60}$
	$\frac{K83-1-1...K83-3-3}{K82-1...K82-3-5}$	10190	4200	5990		$\frac{4,20}{4,40}$

Библиография

- | | | |
|-----|--|--|
| [1] | Руководящий документ
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору РД 11-
02-2006 | Требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации при
строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов
капитального строительства и
требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения |
| [2] | Руководящий документ
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору РД 11-
05-2007 | Порядок ведения общего и (или)
специального журнала учета
выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства |
| [3] | Типовая РД
серия 1.420-12 | Конструкции многоэтажных
производственных зданий с сетками
колонн 6х6 м и 9х6 м под нагрузки
соответственно до 2500 кгс/м ² и
1500 кгс/м ² |
| [4] | Типовая РД
серия 1.020-1/87 | Конструкции каркаса межвидового
применения для многоэтажных обществ.
зданий |
| [5] | Типовая РД
серия 1.420-6 | Конструкции многоэтажных
производственных зданий с сеткой
колонн 12х6 м |

- | | | |
|-----|---|---|
| [6] | Стандарт организации
СТО 02495307-005-2008 | Бетоны. Определение прочности
методом отрыва со скалыванием |
| [7] | Свод правил
СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве.
Отраслевые типовые инструкции по
охране труда |

Вид работ 7.2 по приказу Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624

ОКС 91.060.10

Ключевые слова: колонны сборные железобетонные, многоэтажные здания, технические требования к монтажу, контроль выполнения
